

Transformation Porche → Vestiaire

Dossier de conception, ingénierie, autorisations et achats

Maison individuelle · Orange (84100), Vaucluse, France

PÉRIMÈTRE


Fermeture de la travée couverte ($\approx 2.0 \times 4.0$ m), rehausse du plancher de +0.30 au niveau cible +1.25 (≈ 0.9 m) ; à l'intérieur, un SAS avec porte tampon vitrée K1 + une cloison légère + un VESTIAIRE entièrement aménagé

LIVRABLES

Plan projet · coupes · façade · choix des portes K1/V · phasage · autorisations françaises (DP) · plans de fabrication · coûts et logistique FR-TR

STATUT

Rév. B — circulation révisée : escalier → K1 → sas → V → vestiaire ; ancienne porte est supprimée (baie murée). Relevé sur site obligatoire avant toute fabrication ou commande.

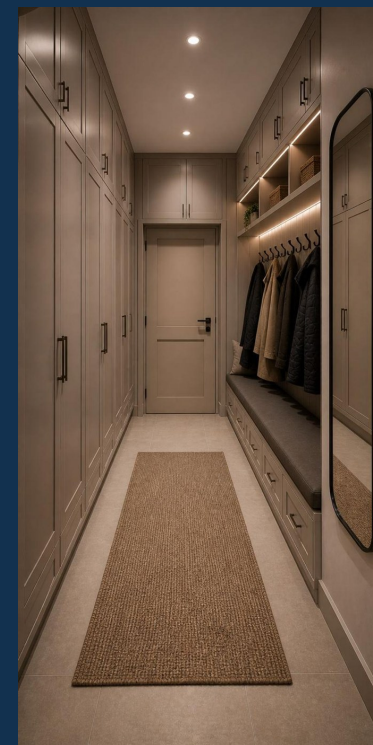

Porche et escalier existants · concept vestiaire visé · travée à transformer

LE PROJET EN UN PARAGRAPHE (RÉV. B)

La travée couverte, ouverte sur un côté, voisine de l’escalier d’entrée (aujourd’hui : les poubelles, plancher $\approx +0.30$ m) est fermée par un nouveau mur maçonné isolé et son plancher est rehaussé d’ ≈ 0.9 m (niveau cible +1.25). Le volume intérieur est divisé par une cloison légère : la nouvelle porte extérieure vitrée K1, en haut de l’escalier, ouvre d’abord sur un SAS de 2.0×1.4 m (à gauche, la porte existante de la maison, hors périmètre) ; la porte V, à droite, mène au VESTIAIRE de 2.0×2.5 m — en entrant, on voit le miroir (M1) juste en face. Aménagement : penderie 2 modules (W1) sur le mur ouest, banc B1 sur le mur est (2 tiroirs + 6 patères + 3 niches), tour à chaussures devant la cloison. L’ancienne baie de porte est (côté escalier) est SUPPRIMÉE — murée.

LES QUATRE DÉCISIONS QUE CE DOSSIER TRANCHE

1 · PORTE K1 EN HAUT DE L’ESCALIER L’escalier reste en place. La nouvelle porte vitrée K1, aluminium à rupture de pont thermique, est posée en haut de l’escalier et OUVRE SUR LE SAS — jamais au-dessus des marches ; paumelles côté nord, ferme-porte. La porte V, elle, ouvre vers l’intérieur du vestiaire. Détail : page 05.	2 · REHAUSSER LE PLANCHER D’≈ 0.9 m Recommandé : plancher poutrelles–hourdis sur murets d’appui avec vide sanitaire ventilé — la méthode standard en France. Alternative : remblai compacté + dalle isolée (plus simple ; risque de tassement si compactage médiocre). Détail : page 06.	3 · AUTORISATIONS À ORANGE Déclaration Préalable (Cerfa 13703) obligatoire : nouveau mur en façade + surface close créée + fenêtre murée. Orange compte des périmètres patrimoniaux protégés — si la parcelle est aux abords (ABF, Architecte des Bâtiments de France), comptez 1 mois de plus et suivez les prescriptions d’enduit/teinte. Détail : page 09.	4 · MOBILIER : FRANCE OU TURQUIE Agenceur français : $\approx$ €9–14k posé. Fabrication sur mesure en Turquie, en kit (démonté), expédiée sous A.TR (0 % de droits, TVA d’importation française 20 %) et montée par vos soins : $\approx$ €5.0–7.5k livré — typiquement 40–45 % moins cher, risques maîtrisables. Détail : pages 12–13.
---	---	---	---

CHIFFRES CLÉS (ORDRE DE GRANDEUR — À AFFINER PAR RELEVÉ ET DEVIS)

$\approx 8\text{ m}^2$ surface close créée : sas ≈ 2.8 + vestiaire $\approx 5.0\text{ m}^2$ (à vérifier)	$\approx +0.9\text{ m}$ rehausse du plancher : $+0.30 \rightarrow +1.25$ niveau fini cible	€8.4–13.7k gros œuvre par artisan · matériaux autoconstruction €3.3–4.9k (hors portes)	€5.0–7.5k mobilier via la Turquie, livré (agenceur FR €9–14k)	1-2 mois instruction de la Déclaration Préalable (2 mois en secteur ABF)	$\approx$ €360–540 taxe d’aménagement, une fois ($8\text{ m}^2 \times$ €892/m ² $\times$ taux locaux)
---	--	---	---	--	---

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL — À VÉRIFIER SUR SITE AVANT TOUTE COMMANDE

Les cotes intérieures 2.0×4.0 m et les niveaux $+0.30 / +1.25$ proviennent du plan du permis de 2006 et du brief du maître d’ouvrage. Deux valeurs sont explicitement des HYPOTHÈSES : la profondeur du sas 1400 mm (illisible sur le plan) et la bande vitrée 1000×450 en partie haute du mur est (allège +2000). La géométrie de la travée, la hauteur sous toiture (cible ≥ 2.30 m nets), la position de la fenêtre à murer et le palier de l’escalier seront re-mesurés au JOUR DU RELEVÉ. Les dessins de ce dossier sont des documents de conception, pas des cotes d’exécution — relevé sur site obligatoire avant toute fabrication.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI

L’escalier d’entrée monte d’≈ 1.20 m depuis l’allée jusqu’au porche. À côté, sous le même toit, une travée basse (≈ +0.30 m) ouverte sur un côté — c’est l’espace à transformer ; il abrite aujourd’hui les poubelles. Dans le mur du fond, une petite fenêtre à barreaux / grille à murer. La travée est ouverte côté allée ; le nouveau mur isolé fermera cette ouverture et constituera la principale modification de façade.



1 · Escalier d’entrée + travée ouverte (le mur neuf ferme cette face)




2 · Intérieur de la travée : plancher bas ≈ +0.30, grille à murer




3 · Objectif : vestiaire aménagé (référence du maître d’ouvrage)

Pointillé rouge : zone à transformer (approx.)

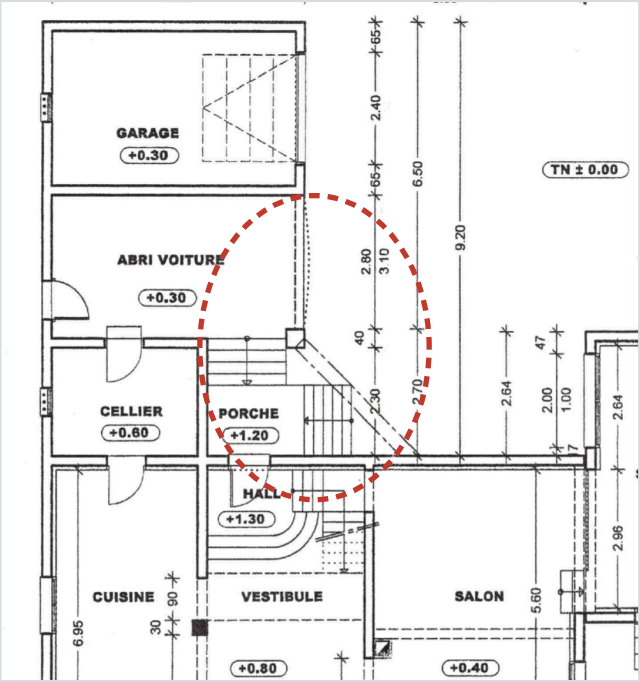

4 · Extrait du plan du permis (2006), RDC — zone du porche


LE PROBLÈME DE NIVEAUX — SIX NIVEAUX DE PLANCHER DANS UN MÊME ANGLE

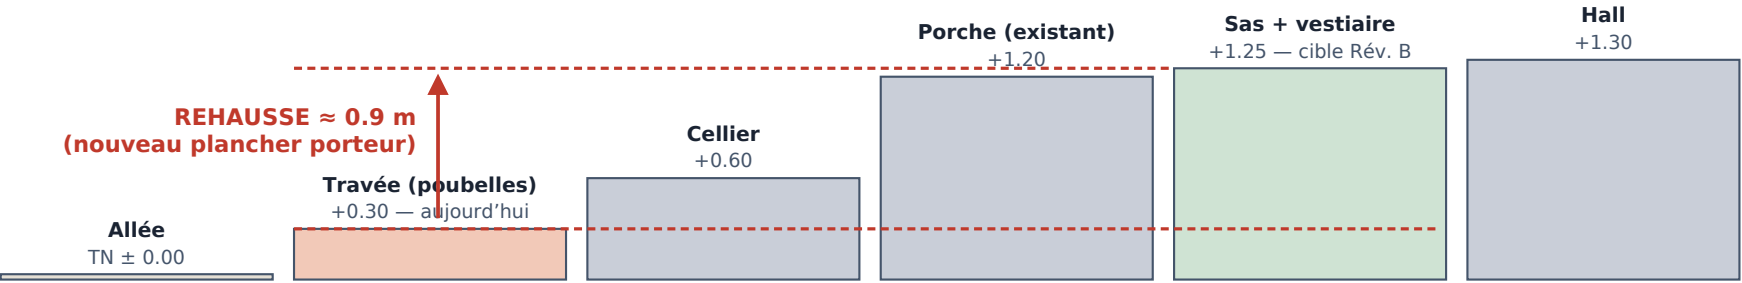

Mesures à faire avant de figer la conception : ① largeur × longueur nettes de la travée, ② niveau sous toiture/charpente au-dessus de +1.25 (≥ 2.30 m nets requis — les photos suggèrent ≈ 2.4-2.6 m, à vérifier), ③ profondeur du palier en haut de l’escalier (hypothèse Rév. B : 1400 mm), ④ position et dimensions de la fenêtre et de la grille à murer, ⑤ où s’évacuent les eaux pluviales du toit, ⑥ réseaux dans la travée (caméra CCTV et câbles à déplacer).

 NEUF — mur maçonné isolé (bloc 20 cm + doublage intérieur)
 EXISTANT — murs conservés
 CLOISON LÉGÈRE — ossature métallique + double BA13 (100 mm)
 Plancher rehaussé de +0.30 à +1.25 (structure neuve)
 Mobilier fixe (plans de fabrication, p.10-11)
 Miroir fixe

- N1 — K1 est la nouvelle porte extérieure vitrée en haut de l'escalier : elle OUVRE SUR LE SAS, paumelles côté nord ; le vantail ouvert se rabat contre la cloison. Justification : p.05.
- N2 — V est la porte du vestiaire (830×2100, rév. Faz 4.2) : elle OUVRE SUR LE VESTIAIRE, paumelles côté EST — débattement libre de 88-90°, le vantail se range côté est. En entrant, on voit le miroir (M1) juste en face.
- N3 — Les murs neufs est et nord portent sur de nouvelles semelles filantes (p.06). La porte est de l'ancienne esquisse est SUPPRIMÉE — mur plein ; côté intérieur, le mur est est réservé au banc B1.
- N4 — La cloison sas-vestiaire est légère (aucune charge de fondation) : ossature 50 mm + double BA13 + laine minérale 45 mm ; l'hubrisserie de V est vissée sur montants doublés.
- N5 — La fenêtre et la grille du mur du cellier sont murées. Déplacer la caméra CCTV et les câbles avant la maçonnerie ; prévoir 2 prises doubles + alimentation LED (p.11).
- N6 — Carrelage antidérapant R10 ; sas et vestiaire au MÊME niveau (+1.25) — aucun seuil au passage V, seuil unique à K1 (≤ 20 mm).
- *La profondeur du sas 1400 mm est une HYPOTHÈSE — à fixer au jour du relevé.

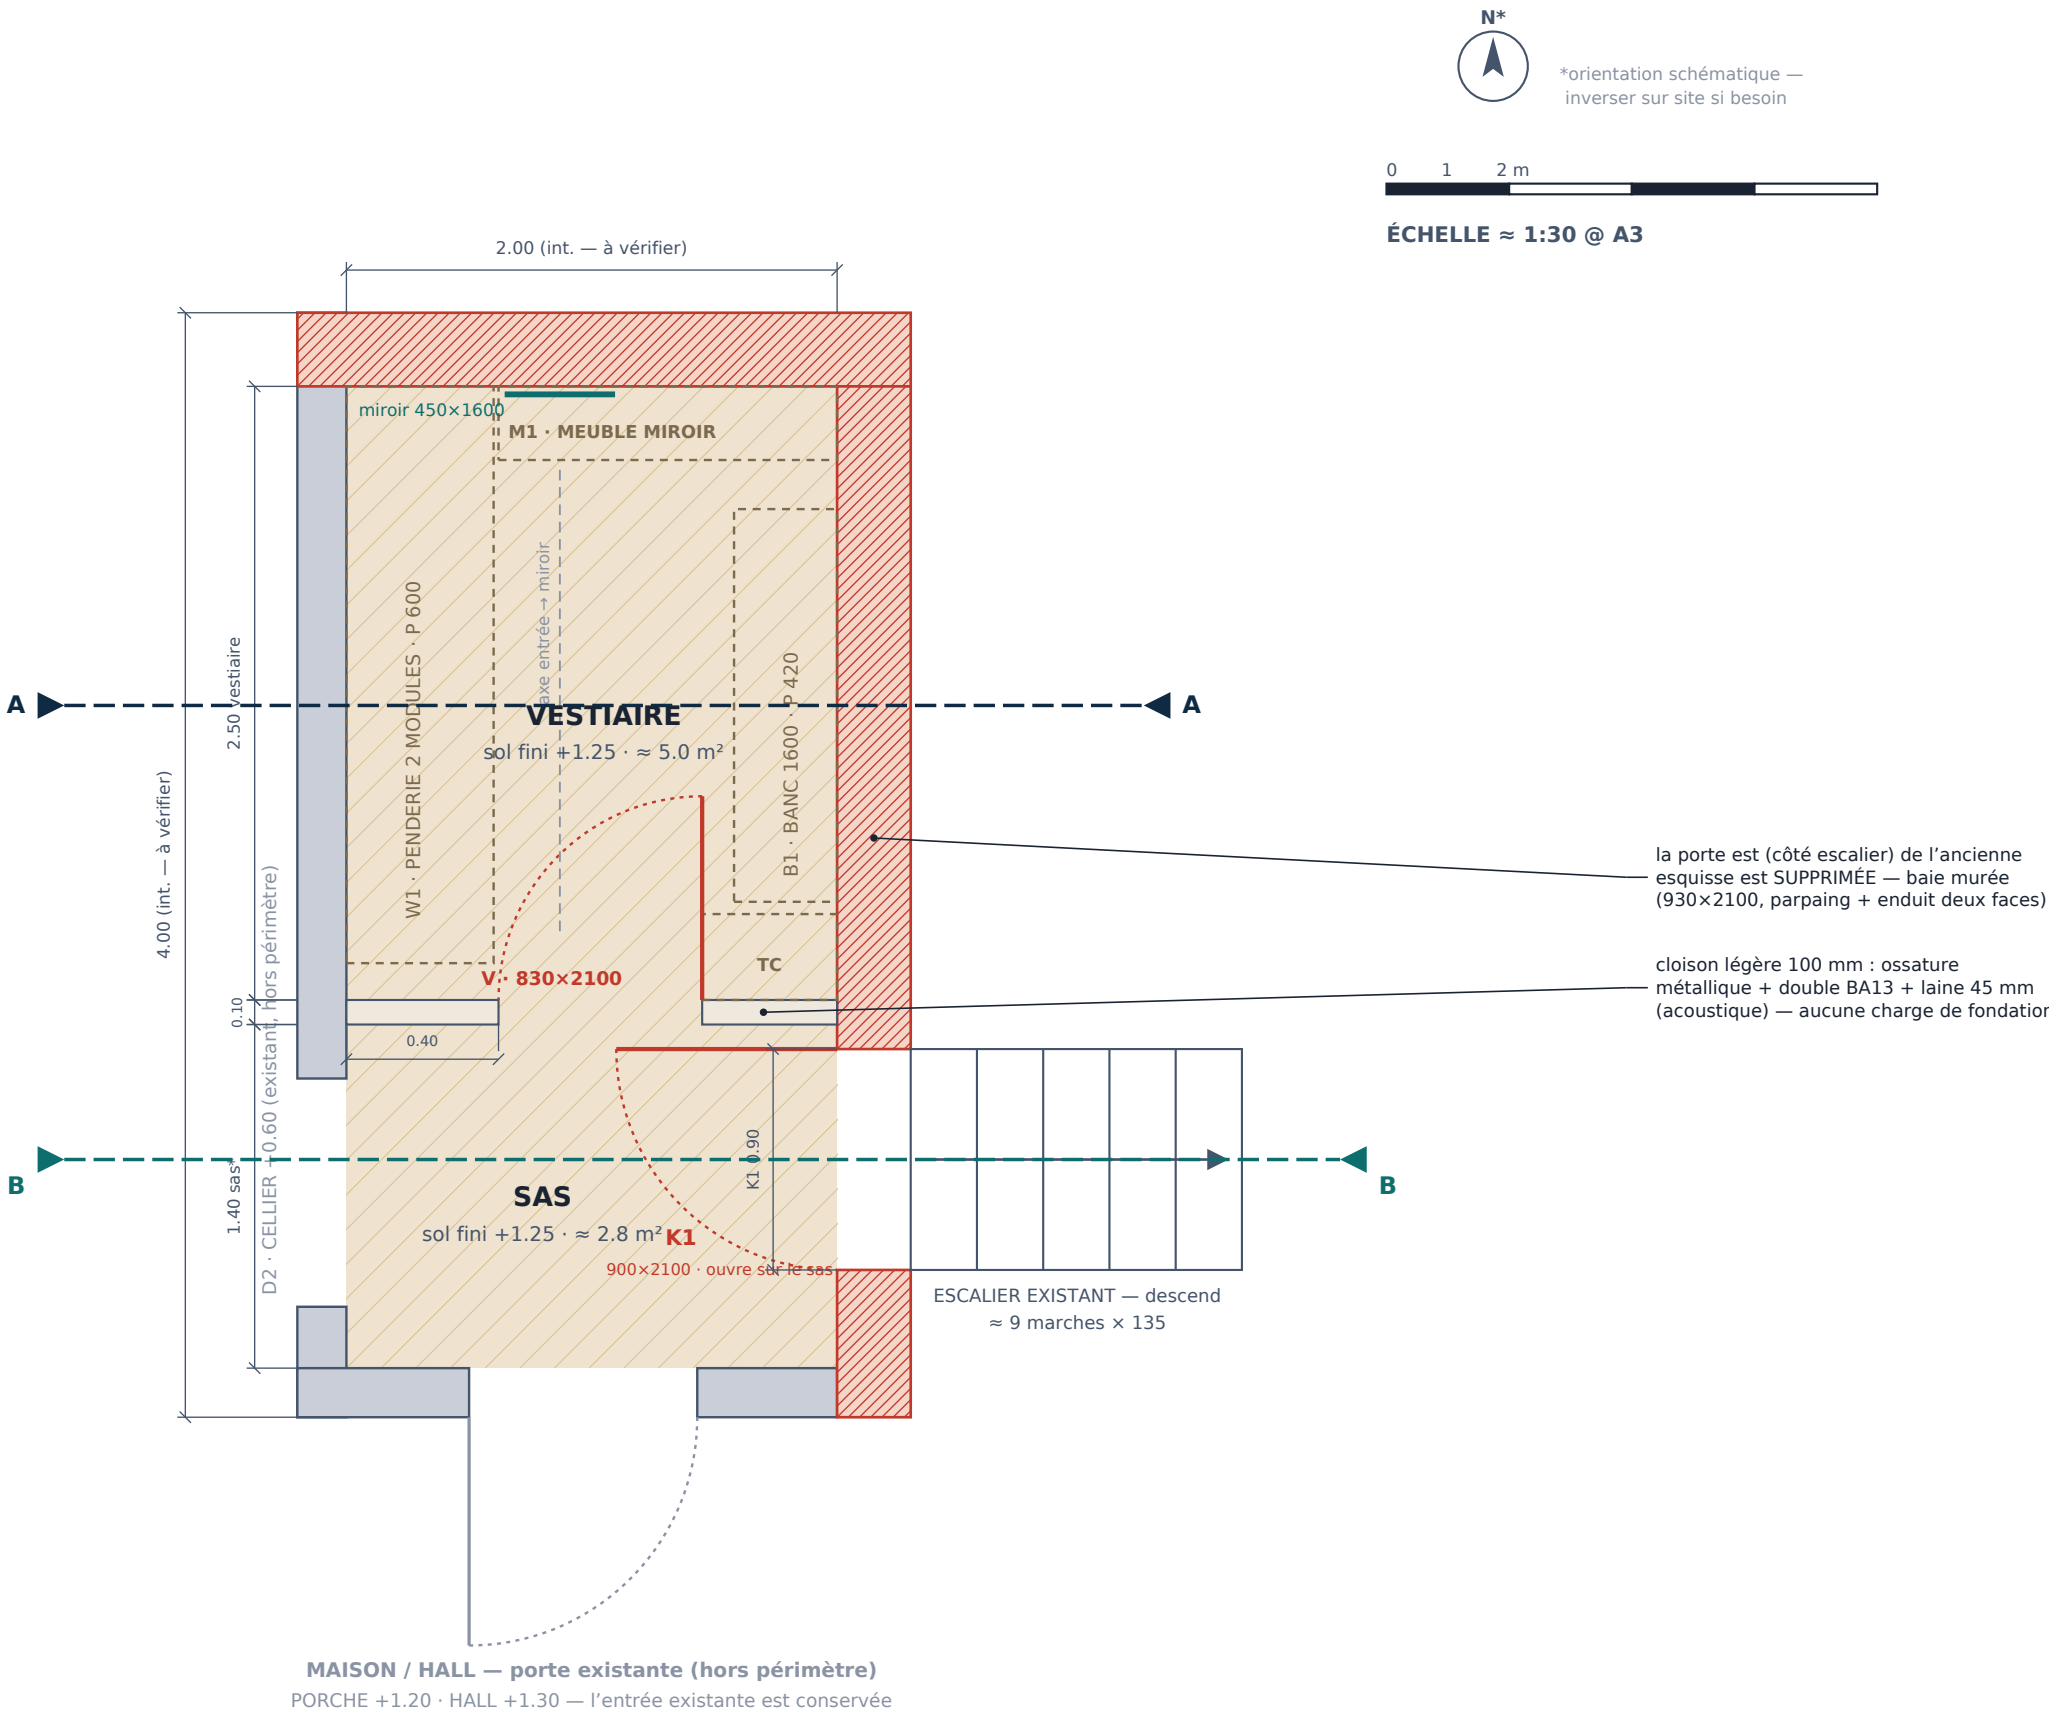

Coupe B-B et Choix des Portes — K1 · V

LES PORTES : RÉPONSE DÉFINITIVE

1 Laissez l'escalier où il est.

Le déplacer = démolir et recouler un massif en béton armé, pour un gain fonctionnel nul. Injustifié.

2 K1 OUVRE SUR LE SAS — jamais au-dessus de l'escalier.

Un vantail ouvrant vers l'extérieur pousse celui qui ouvre vers le vide et heurte celui qui monte — scénario de chute classique. L'ouverture intérieure garde tout le monde sur sol plat ; le ferme-porte évite les claquements au vent.

3 Paumelles de K1 côté NORD.

Le vantail ouvert se rabat contre le mur nord du sas (la cloison) ; il ne gêne ni la porte de la maison au sud ni le passage. V étant décalée à l'ouest, les vantaux ne se chevauchent pas.

4 V OUVRE SUR LE VESTIAIRE — paumelles côté OUEST.


Le sas est étroit (1400*) : V ne peut pas ouvrir sur le sas. Le vantail s'arrête à ~80° sur butée contre le flanc de W1 et laisse libre l'axe d'entrée (porte → miroir). Les deux vantaux restent dans des volumes différents — aucune collision possible.

5 Ajoutez les petits plus de sécurité, peu coûteux.


Main courante continue jusqu'à la porte, éclairage à détecteur dans le sas, nez de marche contrastés antidérapants ; le ferme-porte de K1 est déjà au cahier des charges.

CAHIER DES CHARGES PORTES — K1 · V

- K1 — 900 × 2100 mm, vantail unique aluminium vitré à rupture de pont thermique ; $U_w \leq 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$; serrure RC2 ; ferme-porte ; seuil $\leq 20 \text{ mm}$ avec goutte d'eau ; sol du sas en pente 1-1.5 % vers l'extérieur.
- V — 830 × 2100 mm (rév. Faz 4.2), porte intérieure bois dans la cloison, à 620 mm du mur ouest ; paumelles côté EST, ouverture complète à 90° vers le vestiaire ; $U_d \leq 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$; passage sans seuil (les deux côtés à +1.25). (Phase 4.1 : un vantail de 930 ne pouvait s'ouvrir sur aucun côté.)
- Anciens codes : D3 → K1 (nom officiel) ; l'ancienne porte est D1 → SUPPRIMÉE, baie murée.
- K1 modifie l'aspect de la façade — à joindre au dossier DP (p.09) ; teinte et style assortis aux menuiseries existantes.
- Relevé sur site obligatoire avant toute fabrication — aucune porte commandée sur cotes de plan. *Sas 1400 : HYPOTHÈSE.

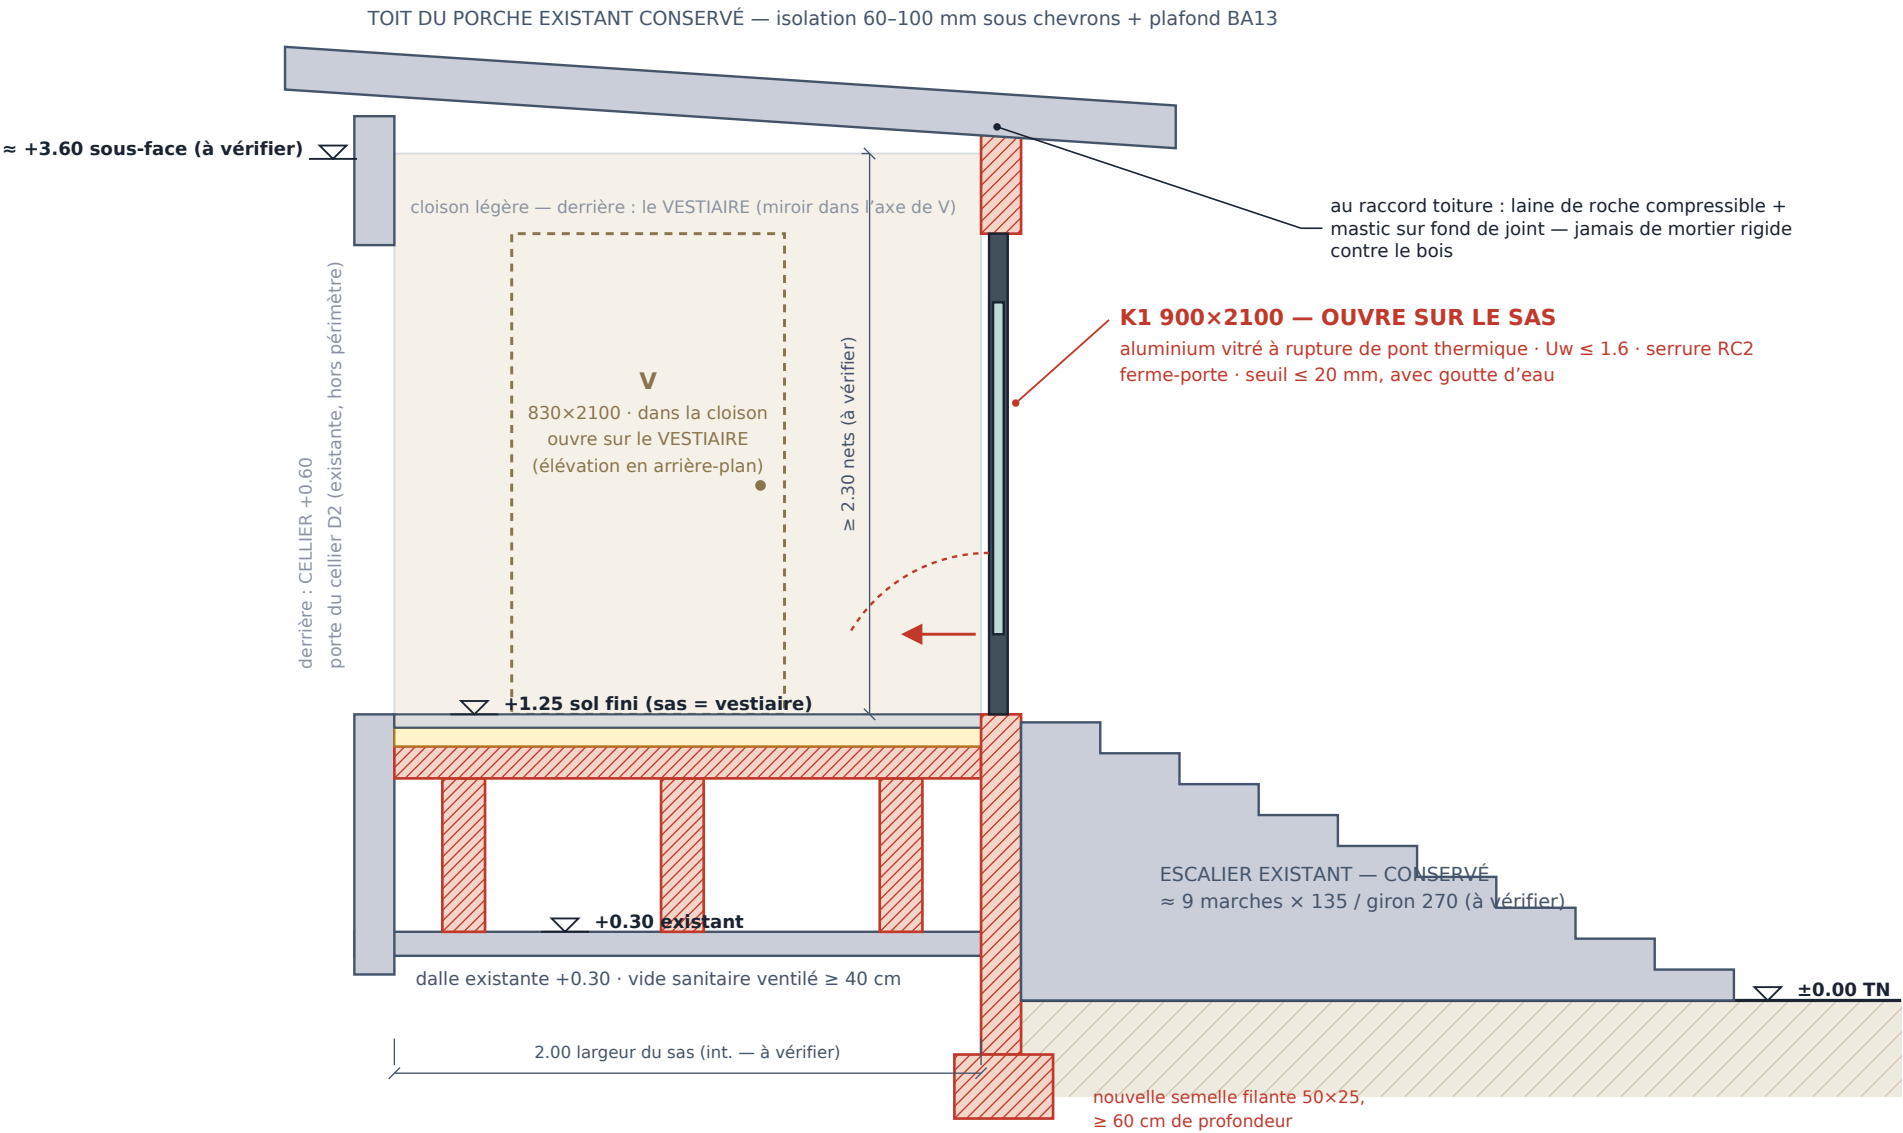

COUPE B-B · ÉCHELLE $\approx 1:26$ @ A3 · vue vers le nord le long du sas — K1 en coupe, V en élévation dans la cloison

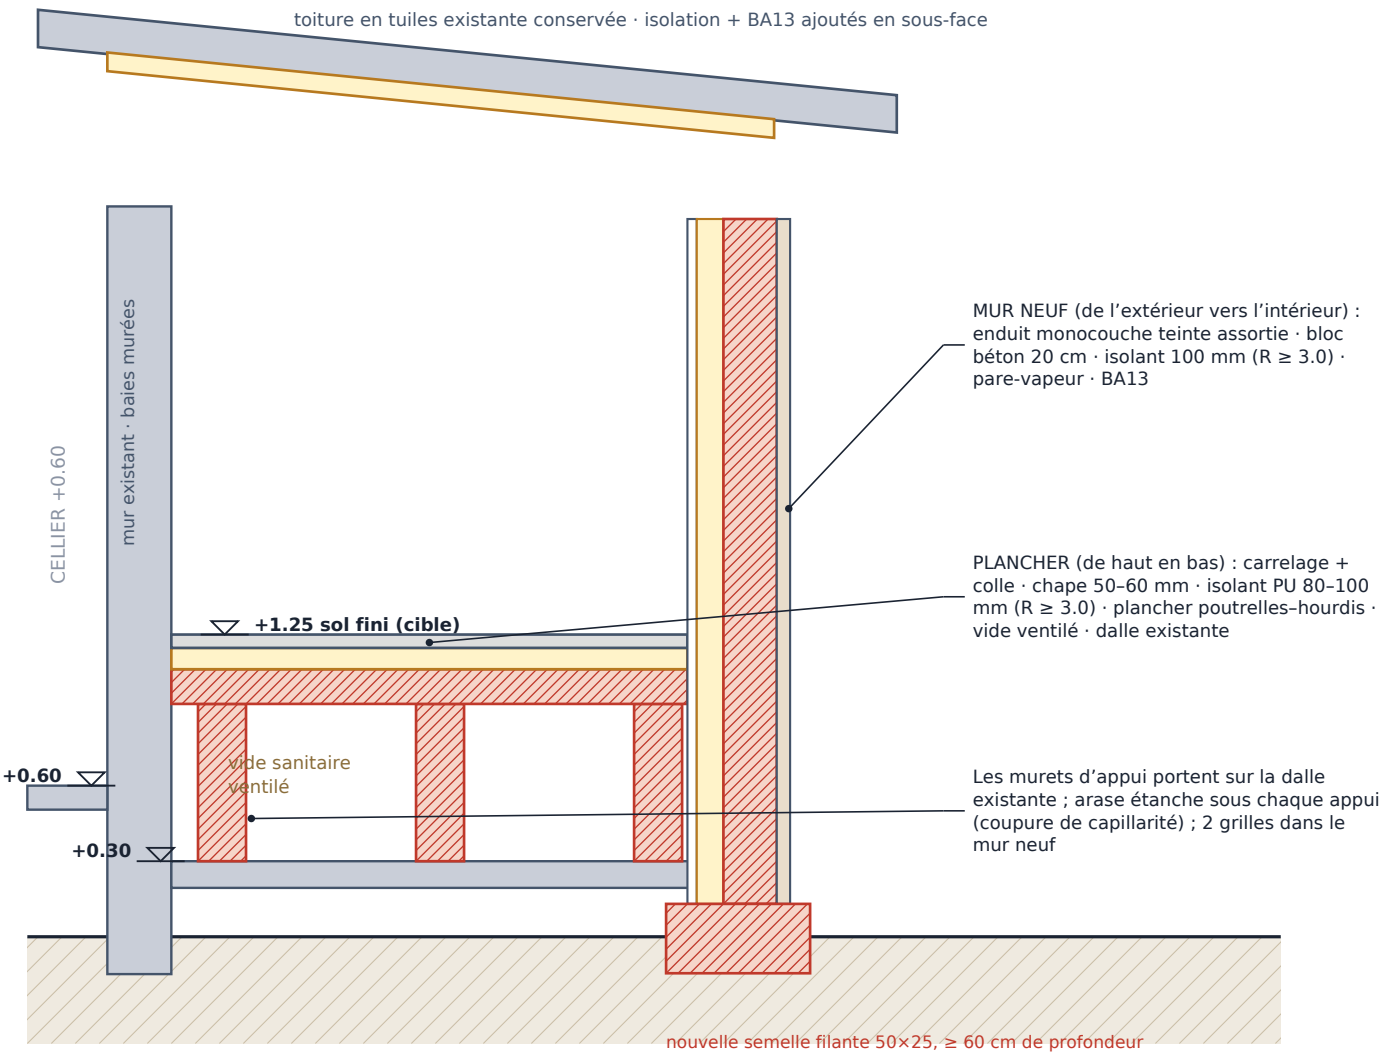

COUPE A-A · ≈ 1:25 @ A3 · vue vers le nord

REHAUSSE DU PLANCHER : DEUX SYSTÈMES VIABLES

OPTION A — Poutrelles-hourdis sur murets

RECOMMANDÉE · la méthode standard française

Comment

Monter 3 murets bas en blocs sur la dalle existante, poser les poutrelles + entrevous (hourdis), couler une table de compression mince, puis isolant + chape + carrelage. Un vide ventilé (≥ 40 cm) subsiste dessous.

Pourquoi elle gagne

Aucun risque de tassement, charge modérée sur la dalle, plancher sec (ventilé), réalisable à deux en autoconstruction ; matériaux dans tout GSB français (≈ €55-75/m²).

Vigilance

Faire couper les poutrelles à la portée (≈ 2.0 m — la plus petite section standard suffit) ; laisser 2 grilles de ventilation dans le mur neuf ; arase étanche sous chaque appui.

DÉCISION : Option A tant que la dalle existante est saine. Matériaux ≈ €450-700 pour 8 m².

OPTION B — Remblai compacté + dalle

ACCEPTABLE · seulement avec un compactage rigoureux

Comment

Remplir le vide en GNT 0/31.5 par couches de 20 cm compactées à la plaque vibrante, régler au sable, poser film PE + isolant PU 100 mm, couler une dalle armée de 10-12 cm, carrelage.

Pourquoi l'envisager

Conceptuellement plus simple, pas de préfabriqué à commander, matériaux un peu moins chers (≈ €45-60/m²), sensation massive.

Vigilance


≈ 5.5 m³ de remblai à brouetter et compacter ; compactage médiocre = plancher qui fissure et tasse en 1-2 ans ; ≈ 11 t de charge en plus — vérifier que la dalle les reprend, ou la démolir et remblayer depuis le fond.

DÉCISION : faisable pour un autoconstructeur méticuleux avec plaque vibrante de location ; A reste plus sûre.


Dans les deux options : remonter le film de sol sur l'arase étanche des murs, isoler la rive du plancher (pont thermique) et finir le carrelage du sas et du vestiaire au MÊME niveau cible +1.25 — aucun seuil au passage V, seuil unique à K1 (≤ 20 mm). La cloison sas-vestiaire sépare deux volumes chauffés : pas d'isolation thermique requise, 45 mm de laine minérale conseillés pour l'acoustique. Cibles : murs R ≥ 3.0, plancher R ≥ 3.0, plafond R ≥ 4.5 m²K/W — au-dessus des minima français « élément par élément » (vérifier les valeurs réglementaires en vigueur).

Élévation de la Façade — Avant / Après

La seule modification visible de l’extérieur : la travée ouverte devient un mur enduit avec porte neuve

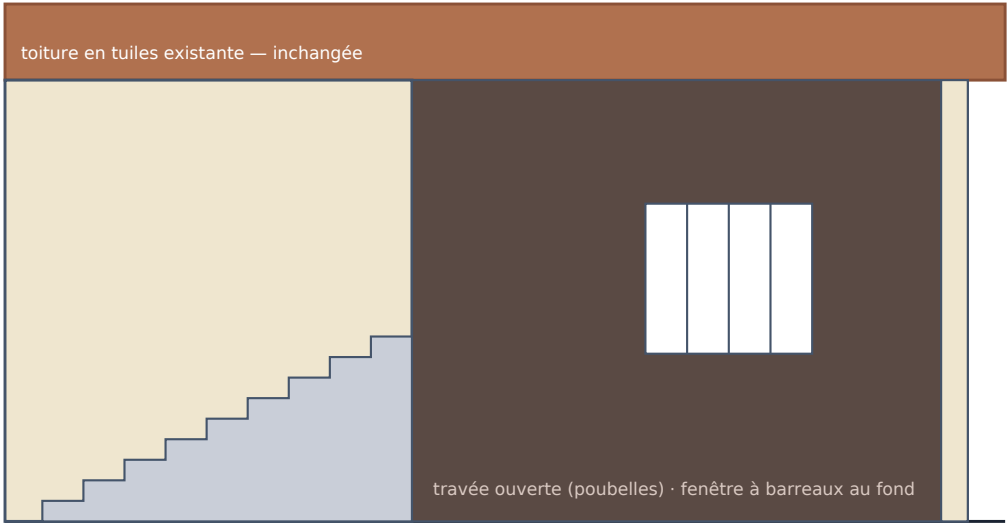

EXISTANT • façade d’entrée • ≈ 1:60

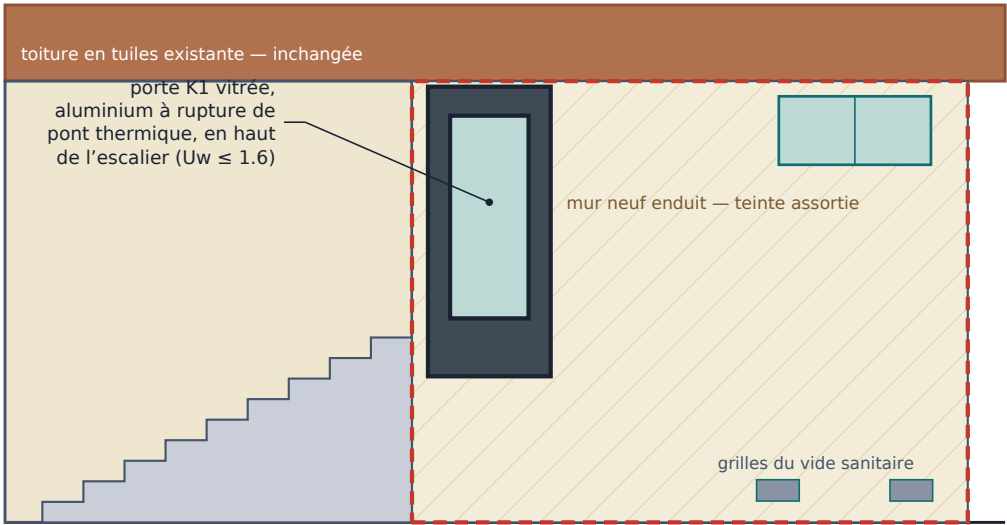

PROJET • façade d’entrée • ≈ 1:60

MATÉRIAUX EXTÉRIEURS ET DÉTAILS EAU / AIR

MUR NEUF

Bloc béton creux 20 cm (parpaing), mortier M10 ; attaches inox scellées à l’époxy dans le mur existant tous les 2 rangs ; chaînage armé 2×HA10 en tête.

ENDUIT

Enduit monocouche (ex. Weberpral M ou ParexLanko), teinte assortie à la façade crème existante — apporter un éclat témoin au négoce ; finition grattée fine. En secteur ABF, la teinte peut être imposée (p.09).

GESTION DE L’HUMIDITÉ

Arase étanche bitumineuse en tête de soubassement, à +0.15 au-dessus du sol extérieur (coupure de capillarité) ; l’enduit s’arrête sur profilé à 10 cm du sol ; bande de gravier en pied de mur ; vérifier que la gouttière rejette l’eau loin du mur neuf.

RACCORD À LA TOITURE

La tête du mur neuf rencontre la sous-face du toit existant : bourrer de laine de roche compressible, fermer les deux faces au mastic sur fond de joint — PAS de mortier rigide contre le bois (mouvements).

FENÊTRE MURÉE

Déposer le cadre et les barreaux, harper la maçonnerie de remplissage, isoler côté intérieur, enduire ton sur ton côté extérieur. Bien exécutée, elle devient invisible — elle reste néanmoins déclarée dans la DP.

LUMIÈRE DU JOUR (BANDE VITRÉE SUPPRIMÉE)

La bande vitrée des révisions antérieures est SUPPRIMÉE (décision du maître d’ouvrage, juill. 2026) — le mur est est monté plein : meilleure isolation, intimité et un mur de fixation complet pour le mobilier. La lumière du jour entre par le vitrage de la porte K1.

MODIFICATIONS DE FAÇADE DÉCLARÉES — BASE DU DESSIN DP4

- La travée ouverte est fermée par un mur maçonné enduit ton sur ton
- Nouvelle porte de sas K1 (aluminium vitré) en haut de l’escalier
- La fenêtr e à barreaux est déposée, la baie murée et enduite
- 2 grilles de ventilation basses pour le vide sanitaire

1 Relevé et implantation
Re-mesurer la travée, les niveaux (+0.30 / cible +1.25), la hauteur sous toiture, la profondeur du palier (hypothèse 1400) ; tracer les axes des murs et de la cloison ; photographier pour la DP.

2 L’autorisation d’abord
Déposer la Déclaration Préalable et ATTENDRE l’accord (p.09). Afficher le panneau de chantier. Aucun ouvrage structurel avant l’accord.

3 Libérer et protéger
Déplacer poubelles, remorque, tondeuse ; déposer la caméra CCTV et ses câbles ; protéger l’escalier par des panneaux ; installer une aire de stockage au sec.

4 Fondations
Creuser une tranchée de 40 cm de large, ≥ 60 cm de profondeur (hors gel) au droit du mur neuf ; couler une semelle filante 50×25 en C25/30 armée 4×HA10 ; cure 5–7 jours.

5 Soubassement + arase étanche
Monter la maçonnerie jusqu’au niveau d’appui du plancher ; poser l’arase étanche bitumineuse sur tous les murs neufs à +0.15 au-dessus du sol extérieur et sur les murets d’appui.

6 Murets d’appui
Sur la dalle existante à +0.30, monter 3 murets bas espacés ≤ 1.0 m (Option A) ; arases de niveau sous les poutrelles ; ménager 2 passages d’air vers les grilles.

7 Plancher
Poser poutrelles + hourdis, treillis + table de compression 4–5 cm ; ou réaliser l’Option B remblai-dalle (p.06). Cure avant chargement.

8 Murs périphériques
Monter les murs extérieurs neufs jusqu’à la sous-face du toit ; couler le chaînage ; réserver les fixations de K1 (bande vitrée SUPPRIMÉE — aucune baie haute). La baie de porte est de l’ancienne esquisse n’est PAS ouverte — mur plein.

9 Murer la fenêtre
Déposer cadre et barreaux ; harper le remplissage en maçonnerie ; isoler côté intérieur ; laisser la face extérieure prête à enduire.

10 Raccord toiture et électricité
Bourrer et mastiquer le joint mur/toit ; électricité : 2 prises doubles, plafonnier à détecteur, alimentation LED 24 V du mobilier, déplacer la caméra (NF C 15-100 : circuits protégés par différentiel).

11 Isoler, doubler, monter la cloison
Murs : isolant 100 mm + pare-vapeur + BA13. Plafond : 60–100 mm entre/sous chevrons + plaques. Plancher : PU 80–100 mm + chape. Cloison sas-vestiaire : ossature 50 mm + double BA13 + laine 45 mm.

12 Enduit extérieur
Enduit monocouche teinte assortie sur mur neuf + remplissage de fenêtre, finition grattée fine ; profilé de départ à 10 cm du sol.

13 Portes, carrelage, peinture
Poser K1 (ouvre sur le sas, ferme-porte) ; poser la porte intérieure V dans la cloison (ouvre sur le vestiaire, paumelles ouest) ; carrelage R10 au MÊME niveau +1.25 dans les deux volumes ; sous-couche + peinture.

14 Mobilier et réception
Monter W1 (2 modules), banc B1 + meuble miroir M1 + tour à chaussures (p.10–11) ; raccorder les LED ; joints silicone ; déposer la DAACT en mairie.

SÉCURITÉ DE CHANTIER — NON NÉGOCIABLE EN AUTOCONSTRUCTION

En creusant, ne déchaussez jamais les fondations de l’escalier et du porche existants — restez à ≥ 40 cm ou reprenez en sous-œuvre par passes courtes. Ne prenez aucun appui sur la charpente. Deux personnes minimum pour porter les poutrelles. Masque + lunettes à la découpe des blocs ; gants pour le mortier (brûlures au ciment). Louez au lieu d’improviser : plaque vibrante, scie de maçon, niveau laser. Si une fissure apparaît dans les murs existants en cours de chantier — arrêtez et consultez un artisan ou un ingénieur.

POURQUOI CE PROJET RELÈVE DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Trois motifs indépendants, chacun suffisant à lui seul : (1) la fermeture de la travée crée de la surface de plancher — entre 5 et 20 m² (jusqu'à 40 m² en zone urbaine du PLU), c'est la DP qui s'applique, pas le permis de construire ; (2) toute modification de façade — mur neuf, porte neuve et fenêtre murée comptent ; (3) les travaux aux abords des Monuments Historiques sont soumis à autorisation quelle que soit la surface. Un seul dossier de DP couvre le tout. La DP reste valable même si la maison dépasse 150 m² au total (le seuil des 150 m² et l'architecte obligatoire concernent les permis de construire).

LA DÉMARCHE, DE BOUT EN BOUT

- 1

Identifier la zone (gratuit ; 1 visite / e-mail)

Demander au service urbanisme de la mairie d'Orange : la zone PLU de la parcelle, et si elle se trouve aux abords des Monuments Historiques / en site patrimonial (le théâtre antique et l'arc de triomphe génèrent de larges périmètres). Cela détermine les règles de teinte d'enduit et le délai d'avis de l'ABF (Architecte des Bâtiments de France).
- 2

Constituer le dossier de DP (Cerfa n°13703)

DP1 plan de situation · DP2 plan de masse · DP3 plan en coupe · DP4 façades avant/après · DP5 plan des toitures (si modifiées) · DP6/DP7/DP8 insertion paysagère + photos proche et lointaine. Les dessins de ce dossier (p.04-07) ont été préparés pour être adaptés directement en DP3/DP4/DP6.
- 3

Déposer et afficher

Dépôt via le guichet numérique de la commune ou en 2-4 exemplaires papier. Délai d'instruction : 1 mois standard, 2 mois aux abords ABF (silence de l'ABF = accord). Afficher le panneau jaune réglementaire ; les tiers disposent de 2 mois de recours à compter du premier jour d'affichage — le plus sûr est d'attendre la fin de ce délai avant d'ouvrir le chantier.
- 4

Construire, puis déclarer l'achèvement

Les travaux doivent être conformes au dossier accordé. À l'achèvement, déposer la DAACT en mairie. La surface taxable du bien est mise à jour (les données de la DP l'alimentent automatiquement).

ARGENT ET RÈGLES LIÉS À LA DP

- Taxe d'aménagement (une seule fois)**

Valeur forfaitaire 2026 hors Île-de-France €892/m² × ≈ 8 m² × (part communale 1-5 % + part départementale ≤ 2.5 %) ≈ €360-540 ; avis ≈ 12 mois après l'accord.
- Taxe foncière**

Les 8 m² habitables supplémentaires augmentent légèrement la taxe foncière — automatique, modeste.
- Règles thermiques (RT existant, par élément)**

Les éléments rénovés/ajoutés doivent atteindre des R minimaux ; le projet vise murs & plancher R ≥ 3.0, plafond R ≥ 4.5, porte Ud ≤ 1.4 — au-dessus des minima. Conserver les factures d'isolant comme justificatifs.
- Assurance**

Informez l'assureur habitation : surface accrue + travaux. La dommages-ouvrage n'est pas exigée en autoconstruction ; déclarer les travaux malgré tout.
- Limites et voisins**

Pas de nouvelle vue directe à moins de 1.90 m du voisin ; la K1 vitrée donne sur votre propre allée — conforme. Vérifier que le mur neuf reste sur votre parcelle.

⚠ ORANGE = VILLE À FORT PATRIMOINE

Le théâtre antique (UNESCO) et l'arc de triomphe génèrent de larges périmètres de protection. Si la parcelle en fait partie, la DP passe par l'ABF (~1 mois de plus) ; il peut imposer teinte d'enduit, couleur de porte et détails. C'est la routine — le projet emploie déjà un enduit assorti et une porte sobre pour passer du premier coup.

CALENDRIER RÉALISTE (DÉPÔT EN SEPTEMBRE → USAGE AU PRINTEMPS)




LE DOSSIER DP — PIÈCE PAR PIÈCE (CERFA N°13703)

- DP1 — plan de situation (extrait cadastral / IGN)
 - DP2 — plan de masse, mur neuf coté
 - DP3 — plan en coupe : niveaux existants et projetés (adapté de p.05-06)
- DP4 — façades avant / après (adaptées de p.07)
 - DP6-DP8 — insertion paysagère + photos proches et lointaines (photos du dossier)
 - Silence à l'issue du délai d'instruction = non-opposition tacite — conserver le récépissé de dépôt

Plan de Fabrication 1 — Agencement et Mur Penderie W1


Implantation du mobilier Rév. B (sas + vestiaire) et élévation de W1 : deux modules penderie à double porte

PLAN D'AGENCEMENT — IMPLANTATION DU MOBILIER (RÉV. B)

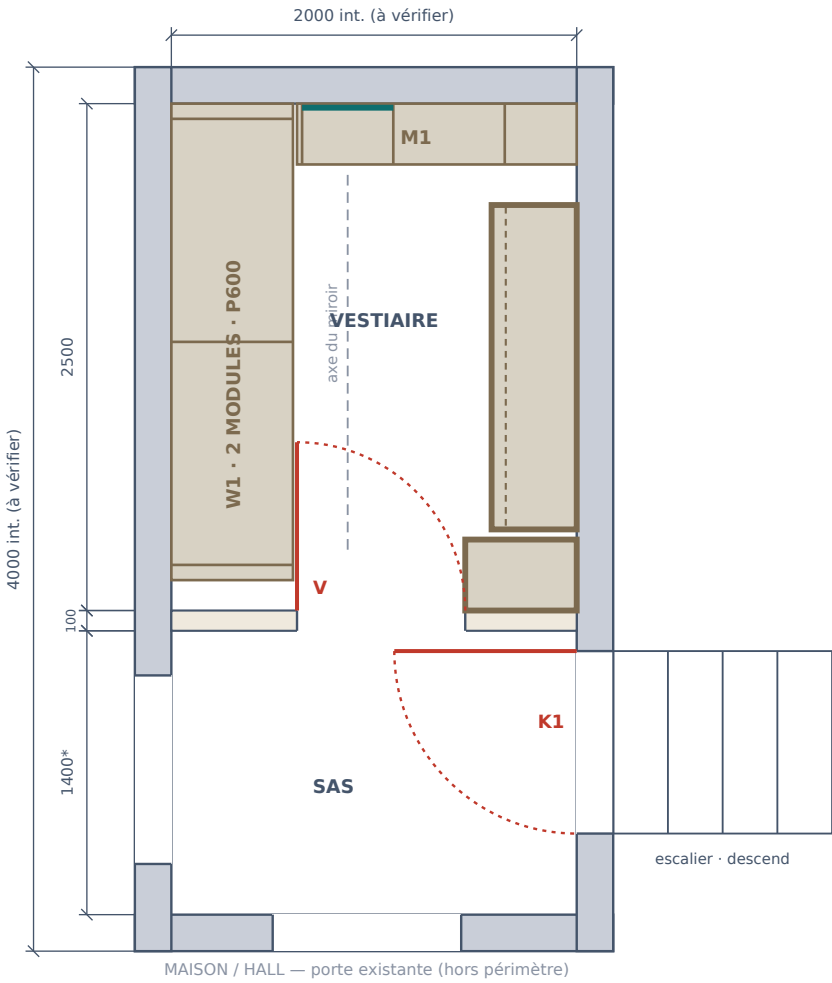

PLAN D'AGENCEMENT (RÉV. B) · ≈ 1:37 @ A3
passage net entre les portes de W1 et le banc B1 ≈ 980 mm · *profondeur du sas : HYPOTHÈSE

ÉLÉVATION W1 — MUR PENDERIE (VUE VERS L'OUEST)

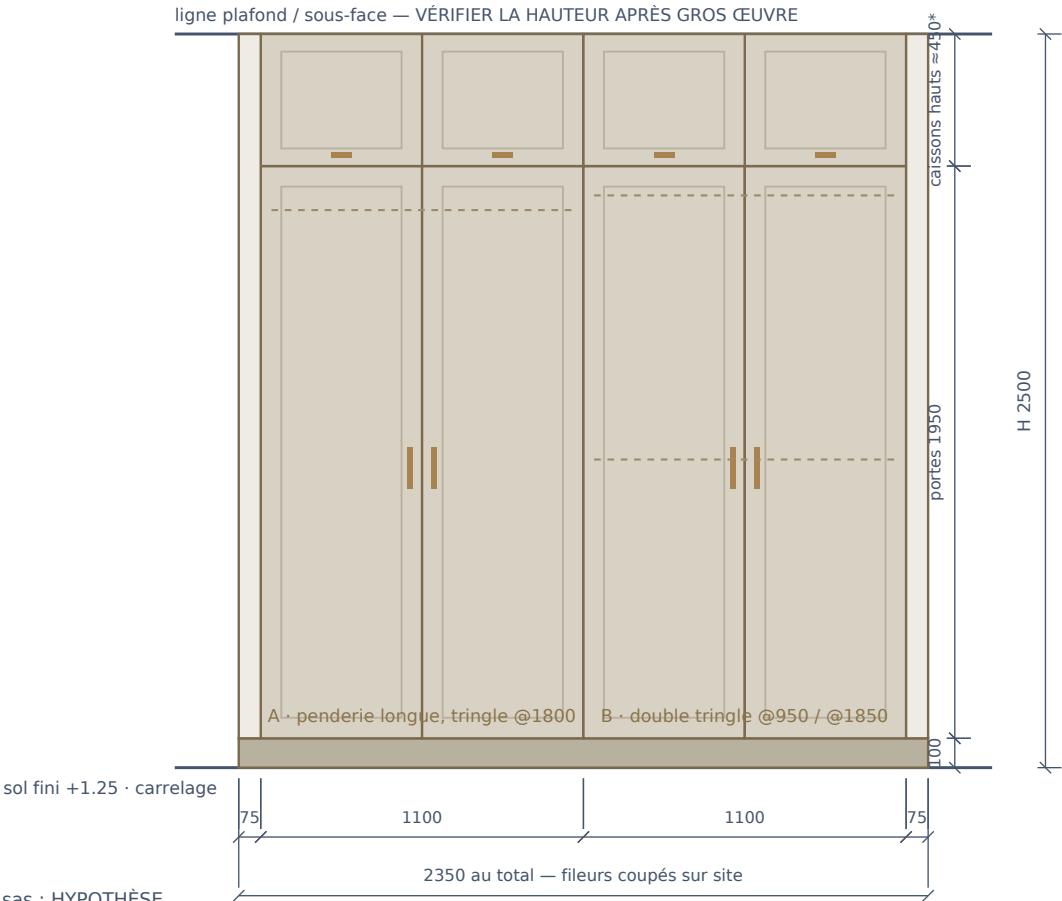

ÉLÉVATION W1 · ≈ 1:26 @ A3 — 2 modules 1100 à double porte · porte 1950 + caisson haut · profondeur 600

NOTES W1 (RÉV. B)

- Rév. B : mur ouest 2500 → 2 modules × 1100, longueur 2350 + fileurs de 75 aux deux extrémités.
- Caissons en MDF hydrofuge 18 mm ; portes en MDF 22 mm style shaker, laque PU greige (≈ RAL 7044).
- *Les caissons hauts sont la zone de tolérance : si la sous-face finie est plus basse, raccourcir les caissons hauts — jamais les portes.
- Profondeur 600 hors tout (≈ 560 utile) — cintres standard.
- Le vantail de V vient en butée (~80°) sur le flanc sud — laque anti-rayures + butoir feutré ; le flanc nord sert d'appui au meuble M1 (p.11).
- Pieds réglables sous la plinthe ; fixer les rails arrière au mur par chevilles adaptées — jamais dans le seul BA13.
- À vérifier sur site avant commande : longueurs de murs, aplomb (±15 mm rattrapés par les fileurs), positions des prises / alimentation LED.


RÈGLE DE COMMANDE — COTES DÉFINITIVES SEULEMENT APRÈS LE GROS ŒUVRE.

Ces dessins figent l'intention de conception. La liste de débit n'est établie qu'une fois la pièce maçonnée, doublée et re-mesurée — relevé sur site obligatoire avant toute fabrication.

Plan de Fabrication 2 — Mur Banc B1, Meuble Miroir M1, Quincaillerie


B1 : banc + 2 tiroirs + 6 patères + 3 niches · M1 : miroir encastré + colonne + étagères · coupes verticales · quincaillerie (Rév. B)

ÉLÉVATION B1 — MUR EST (VUE VERS L'EST ; NORD À GAUCHE)

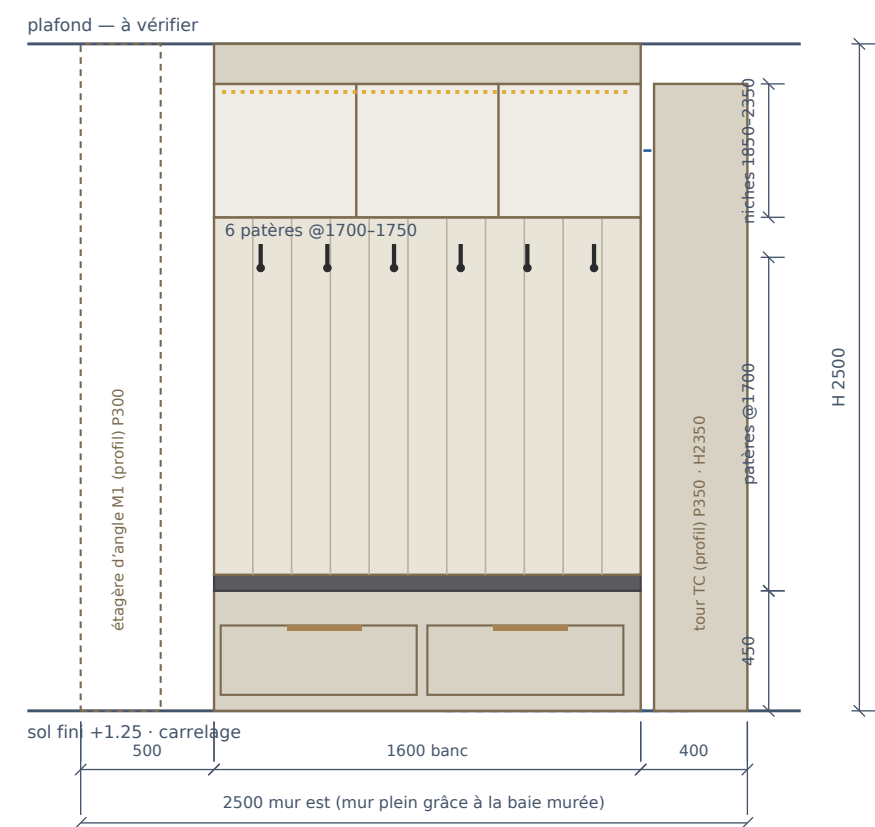


ÉLÉVATION B1 · ≈ 1:28 @ A3 — banc 1600 · 2 tiroirs · 6 patères · 3 niches
tireté bleu = ancienne baie de porte murée (arrière-plan) · bande vitrée SUPPRIMÉE (Faz 4.2)

MEUBLE MIROIR M1 — MUR NORD

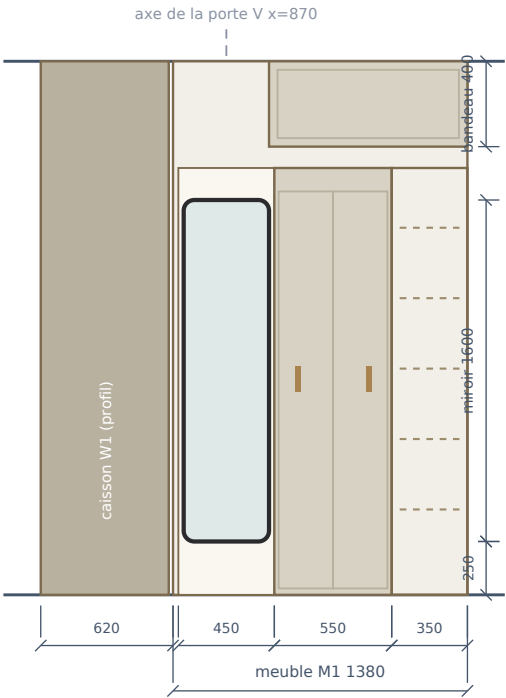

ÉLÉVATION M1 · ≈ 1:35 @ A3
miroir encastré dans l'axe de V — visible dès l'entrée

COUPES VERTICALES

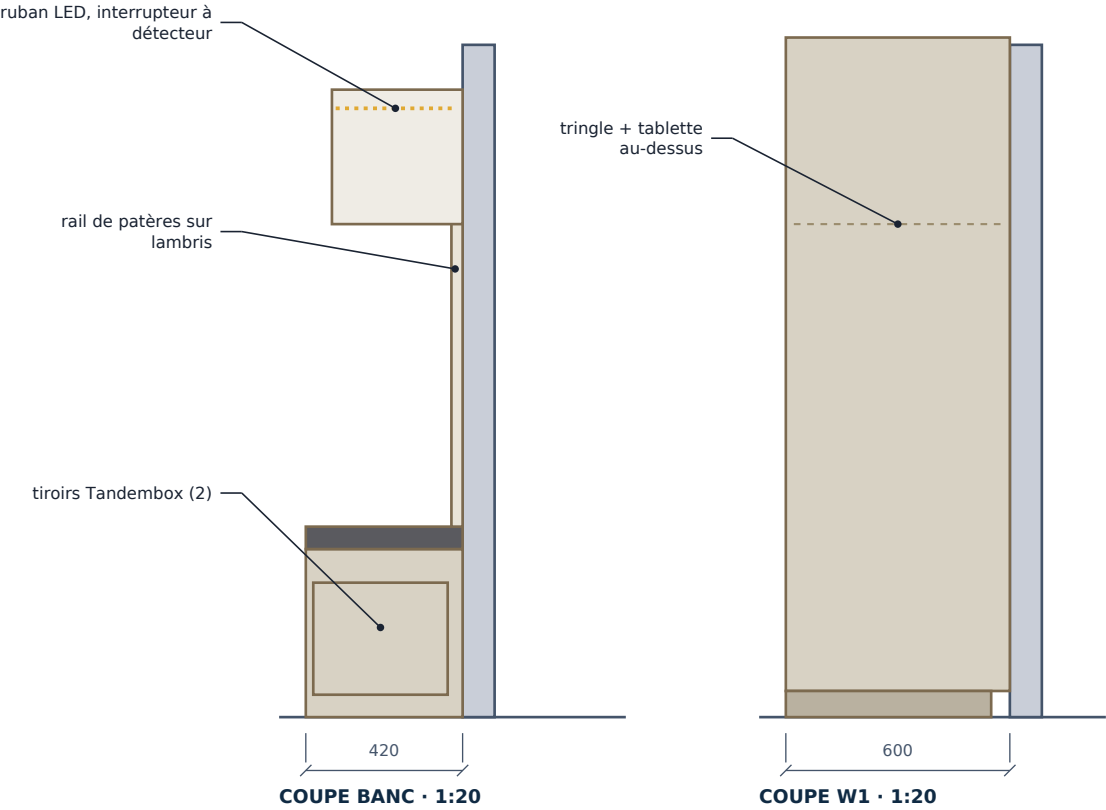

QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX (QUANTITÉS RÉV. B)

Composant	Spécification
Caissons	MDF hydrofuge 18 mm, chants plaqués ; fonds 8 mm rainurés
Portes et façades	MDF 22 mm style shaker, laque PU greige ≈ RAL 7044, mate
Charnières	Blum Clip-top 110° à fermeture amortie — 3 par porte haute, 2 par caisson haut · W1 seul, total 20 (colonnes CH + M1 COULISSANTES — Phase 4.1)
Tiroirs	Blum Tandembox, sortie totale, fermeture amortie, 30 kg — banc B1 : 2 jeux
Éclairage	Ruban LED 24 V 3000 K, 2.0 m (bandeau de niches B1) + driver + interrupteur à détecteur
Plinthe et pieds	Plinthe 100 mm, pieds réglables (14 pcs) ; clipsée, démontable
Fileurs	Fileurs / chanfreins 50-75 mm aux murs et au plafond, coupés sur site
Poignées et patères	Poignées laiton ou noir mat, 10 pcs · patères doubles noir mat, 6 pcs
Miroir	450 × 1600, cadre métal noir, encastré dans la niche M1 — 1 pce

RÈGLES DE FABRICATION — À LIRE AVANT COMMANDE

- Cotes définitives seulement après le gros œuvre — re-mesurer, puis établir la liste de débit (relevé sur site obligatoire avant toute fabrication).
- Les murs ne seront pas d'aplomb : les fileurs rattrapent ±15 mm ; ne jamais commander le mobilier au nominal maçonnerie.
- Le vantail de V vient en butée sur le flanc sud de W1 : laque anti-rayures + butoir feutré sur cette face ; garder libre l'axe d'entrée (porte → miroir).
- Vitrifier tous les chants MDF coupés (laque PU ou bande de chant) — c'est une pièce à chaussures mouillées.
- LED : tirer l'alimentation 24 V avant le doublage (p.08, étape 10) ; driver accessible dans le bandeau haut de B1.
- Si filière TR (p.13) : numérotter les panneaux par module (W1-A/B, B1, M1, TC) et les emballer avec le schéma de montage.

GROS ŒUVRE (≈ 8 M² · SAS + VESTIAIRE) — ORDRE DE GRANDEUR

Poste	Par artisan	Autoconstruction (matériaux)
Terrassement et semelles filantes	€900-1,400	€400-550
Maçonnerie + enduit extérieur (y c. baie de porte murée)	€2,200-3,400	€1,100-1,500
Rehausse du plancher — Option A (poutrelles-hourdis)	€1,000-1,600	€450-700
Remplissage fenêtre / grille	€400-700	€150-250
Cloison sas-vestiaire (ossature + double BA13 + laine)	€400-700	€150-250
Raccord toiture + isolation et plafond	€700-1,100	€300-450
Électricité (NF C 15-100, déplacement caméra inclus)	€600-900	€250-400
Porte K1 — aluminium vitré (fourni-posé / fourniture seule)	€900-1,600	€700-1,200
Porte V — porte intérieure bois	€400-700	€250-450
Bande vitrée — SUPPRIMÉE (décision du maître d’ouvrage, Faz 4.2)	€0	€0
Carrelage + peinture	€600-1,100	€250-400
TOTAL	≈ €8,400-13,700	≈ €4,200-6,500 portes incluses

Hors portes (K1 + V), matériaux en autoconstruction ≈ €3,250-4,850 — cohérent avec les €3.3-4.9k de la p.02. Métré Rév. B (data/quantities.json) : ≈ 330 parpaings, 28 sacs de mortier, cloison BA13 13 m². La dalle existante est supposée saine ; quelle que soit la filière, ajoutez 10-15 % d’aléas.

MOBILIER — TROIS FILIÈRES, MÊME AMÉNAGEMENT (W1 + B1 + M1 + TOUR)

Filière	Coût livré	Ce que vous obtenez / vigilance
Agenceur FR sur mesure, posé	€9,000-14,000	MDF laqué ≈ €1,300-1,900/ml d’armoire toute hauteur ; garantie complète ; zéro logistique
Semi-mesure FR (IKEA PAX/BESTÅ + façades sur mesure)	€3,500-6,000	Voie médiane ; rapide ; facile en autoconstruction ; aspect proche de la référence, pas identique
Sur mesure TR en kit (CNC tourillons+excentriques), expédié	€5,000-7,500	Départ usine €2,800-4,800 + fret €900-1,500 + TVA import 20 % + dédouanement €150-300 (+ monteur local en option €500-900)

RECOMMANDATION

La filière TR est ≈ 40-45 % moins chère que l’agenceur FR pour l’aspect de référence — à choisir uniquement avec un atelier fiable et des cotes relevées après le gros œuvre. Sinon, la semi-mesure FR est la voie médiane pragmatique.

SCÉNARIOS GLOBAUX — GROS ŒUVRE + PORTES + MOBILIER (HORS TAXE D’AMÉNAGEMENT €360-540, P.09)

≈ €7.7-12.5k

Autoconstruction + semi-mesure FR

Total le plus bas — aspect approchant

≈ €9.2-14k

Autoconstruction + sur mesure TR

L’aspect de référence au coût minimal — le plus de travail personnel

≈ €13.4-21.2k

Artisan + sur mesure TR

L’aspect de référence avec le moins d’effort du maître d’ouvrage

≈ €17.4-27.7k

Artisan + agenceur FR

Clé en main, garantie complète — prix premium

DISCIPLINE BUDGÉTAIRE — TROIS RÈGLES

1 · Ne commandez aucun mobilier avant la fin du gros œuvre — l’erreur de cote est le risque n°1 de la filière TR. 2 · Même en autoconstruction, faites établir deux devis d’artisan : ils chiffront le risque que vous assumez. 3 · Figez K1 et le carrelage avant le dépôt de la DP — toute modification de façade après accord = nouvelle DP.

L’ITINÉRAIRE, PORTE À PORTE

UNION DOUANIÈRE UE-TR : 0 % DE DROITS SUR LE MOBILIER SOUS A.TR

BUDGÉTEZ LA TVA D’IMPORTATION DE 20 % — PAS OPTIONNELLE



MÉCANIQUE DOUANIÈRE — CE QUI SE PASSE VRAIMENT

- Union douanière UE-Turquie : les produits industriels, mobilier compris, entrent sans droits avec le certificat A.TR. Pas d’A.TR = risque tarifaire — à inscrire au contrat.
- La TVA française de 20 % est due à l’importation sur la valeur marchandise + fret ; le transitaire l’avance et la refacture avec les frais de dédouanement (≈ €150-300).
- Documents : facture commerciale · liste de colisage · lettre de voiture CMR · A.TR. Conserver des copies ; le justificatif de TVA prouve la valeur pour la revente et l’assurance.
- Acheter en DAP (Delivered At Place) + dédouanement inclus — un seul prix, un seul responsable, pas de surprise à la frontière.
- Un particulier qui importe pour son usage propre échappe en général aux obligations des opérateurs commerciaux (p. ex. RDUE) — demander une confirmation écrite au transitaire.

CAHIER DES CHARGES EMBALLAGE — À METTRE AU CONTRAT

- Panneaux CNC démontés, assemblage tourillons + excentriques — pas de cadres collés ; chaque panneau numéroté (W1-A1, B1-D2, M1-K1, TC-...), en correspondance avec le schéma de montage PDF.
- Chants : protections rigides sur toutes les façades laquées ; panneaux face à face avec intercalaires mousse ; housse pare-humidité ; palette ou caisse export.
- Poids unitaire d’un panneau dans la limite sûre à deux (≈ 40 kg) ; quincaillerie ensachée par module + 5 % de rechange ; charnières et coulisses dans leur boîte Blum d’origine.
- Photographier chaque palette avant filmage et après chargement — seule preuve recevable en cas d’avarie de transport.
- Assurer à la valeur de remplacement TVA + fret incluses, pas au prix départ usine.

À L’ARRIVÉE — TROIS VOIES DE MONTAGE

MONTAGE SOI-MÊME

€0 en plus

Tourillons + excentriques = difficulté IKEA en grand format. Deux personnes, 2-3 jours, niveau laser, patience sur les fileurs. Idéal si vous avez fait le gros œuvre vous-même.

ÉQUIPE TR SUR PLACE

≈ €800-1,500

Vols + hébergement pour deux monteurs, 2 jours. Le plus rapide, ils connaissent le produit — mais responsabilité, assurance et liste de réserves à fixer par écrit à l’avance.

MONTEUR LOCAL (RECOMMANDÉ)

≈ €500-900

Menuisier-poseur local, 2 jours dès le dédouanement. Coût équilibré, interlocuteur francophone ; il réalise aussi fileurs et joints silicone. À réserver à l’avance.

LA RECOMMANDATION EN CINQ LIGNES

- 1

Fermer et rehausser — le bon projet.
Petit périmètre, grand gain quotidien : une entrée chaude, sûre et aménagée (sas + vestiaire) à la place du coin poubelles. Budget honnête : autoconstruction + mobilier TR ≈ €9.2–14k, clé en main ≈ €17.4–27.7k (p.12).
- 2

Plancher : Option A (poutrelles-hourdis sur murets).
Pas de tassement, ventilé et sec, adapté à l’autoconstruction. Option B seulement avec plaque vibrante de location et discipline. Niveau fini cible +1.25 dans les deux volumes.
- 3

Portes : K1 ouvre sur le sas, V sur le vestiaire.
La question de sécurité est réglée p.05 — faites exactement ainsi : K1 paumelles nord + ferme-porte ; V paumelles ouest, vantail en butée ~80° sur le flanc de W1 ; avec main courante et éclairage à détecteur.
- 4

Autorisation : la DP d’abord, toujours.
Déposer la Déclaration Préalable, attendre l’instruction (+ le mois ABF le cas échéant) et le délai de recours ; l’ouvrage structurel vient après. La p.09 sert de check-list.
- 5

Mobilier : sur mesure TR si l’atelier est fiable — cotes après gros œuvre.
Sinon, semi-mesure FR. Jamais de commande sans la pièce finie — relevé sur site obligatoire avant toute fabrication. La recette logistique est p.13.

CALENDRIER MAÎTRE (DP EN SEPTEMBRE)



Pièce en service au début du printemps — ≈ 5–6 mois de bout en bout ; dont ≈ 3 mois d’attente administrative, pas de chantier.

REGISTRE DES RISQUES

Risque	Probab.	Impact	Parade
Erreur de cotes (mobilier commandé sur plan)	Moyenne	Fort	Règle d’or : liste de débit seulement après gros œuvre et relevé laser (p.10–11)
Refus de DP / prescriptions ABF	Faible–moy.	Moyen	Pré-vérification en mairie ; enduit assorti + K1 sobre conçus pour passer
L’hypothèse sas 1400 ne tient pas	Moyenne	Moyen	Premier point du relevé ; la cloison est légère, déplacer la ligne coûte peu — cotes mobilier ensuite
Tassement (plancher Option B seulement)	Moyenne	Moyen	Préférer A ; si B : couches de 20 cm, plaque vibrante de location, dalle armée
Avarie de transport (filière TR)	Moyenne	Moyen	Cahier des charges emballage au contrat, photos avant filmage, assurance à la valeur livrée, avaries sur la CMR
Dérive budgétaire	Moyenne	Moyen	10–15 % d’aléas ; deux devis d’artisan ; figer les choix de façade (K1, teinte d’enduit) avant la DP

Fin du dossier · Rév. B · Juillet 2026 — vérifier toutes les cotes sur site ; relevé sur site obligatoire avant toute fabrication ; document inutilisable pour l’exécution avant l’accord de la DP.

ANNEXE — PROMPT DE RENDU 3D (COPIER-COLLER)

À coller dans n’importe quel modèle d’image pour visualiser le vestiaire fini (prompt laissé en anglais) :

"Photorealistic interior render, compact mudroom 2 m wide × 2.5 m deep entered through a wooden door on the short side; floor-to-ceiling greige shaker wardrobes (two double-door modules) along the entire left wall; on the right wall an upholstered charcoal bench (H 45 cm) over two drawers, panelled wall behind with six black coat hooks at 1.7 m holding beige and navy coats, open niches above with warm 3000 K LED strip lighting and wicker baskets; directly opposite the door a tall black-framed mirror recessed into a greige joinery unit with a cabinet tower and open corner shelves; a slim shoe tower beside the door; a small high strip window on the right wall glowing with daylight; large beige porcelain floor tiles with a woven jute runner, soft warm ambient light, 24 mm lens, eye level, architectural photography style"

Astuce : générez un visuel par option — poignées laiton ou noir mat — et faites voter la famille avant de commander la quincaillerie.

LES TROIS PROCHAINES ÉTAPES

- Mesurer la travée : largeur, longueur, hauteur sous toiture, profondeur du palier (liste p.03).
- Un seul e-mail au service urbanisme d’Orange : zone PLU + situation ABF de la parcelle.
- Constituer et déposer le dossier de DP (liste p.09) — le délai ne court qu’à partir du dépôt.
