

Ce guide vous permet de mener le chantier vous-même, sans le confier à un architecte. Suivez l'ordre et cochez chaque case. Organisation Rév. B : escalier → K1 (nouvelle porte d'entrée vitrée) → palier → porte V à droite → vestiaire ; l'ancienne porte est (côté escalier) est murée. Pour le détail technique, voir le dossier principal (planches A3) ; les numéros de page y renvoient.

1 Mesurez d'abord — 6 mesures (mètre ruban + téléphone suffisent)

- ☐ **Largeur et longueur de la travée** : de mur à mur, aux deux extrémités (les murs peuvent être faux). Objectif ≈ 2.0 × 4.0 m (palier + cloison + vestiaire).
- ☐ **Hauteur sous plafond** : du sol de la travée à la sous-face de la charpente. À partir de 3.20 m, on est à l'aise (le plancher monte de 0.90 m et il doit rester ≥ 2.30 m).
- ☐ **Profondeur du palier (nord-sud)** : de la porte de la maison à la tête d'escalier. Le 1.40 m du plan est une HYPOTHÈSE — la porte K1 et la cloison légère se calent sur cette mesure.
- ☐ **Baies à fermer** : ancienne porte est (côté escalier) + fenêtre/grille — position, largeur, hauteur, allège, photo.
- ☐ **Eaux pluviales** : où se déverse la gouttière ? Si elle coule au pied du futur mur, notez-le (elle sera déviée).
- ☐ **Réseaux dans la travée** : caméra, câbles, luminaire — photographiez tout (à déplacer).

2 Un seul courriel à la mairie — 10 minutes, gratuit

Envoyez le courriel ci-dessous au service urbanisme de la mairie d'Orange (Service Urbanisme, Mairie d'Orange). La réponse fixe les règles qui s'appliquent à votre parcelle. Conservez-la — c'est la première pièce du dossier.

MODÈLE DE COURRIEL (À COPIER)

« Bonjour, je suis propriétaire de la parcelle située [adresse]. Je projette de fermer un porche couvert existant (≈ 8 m²) pour créer une entrée, avec une nouvelle porte vitrée en haut de l'escalier. Pourriez-vous me confirmer : 1) la zone PLU de la parcelle, 2) si elle se situe dans le périmètre des abords des Monuments Historiques (avis ABF), 3) les règles de teinte d'enduit et de menuiserie applicables ? Merci. »

- ☐ **Envoyé** : date du courriel :
- ☐ **Réponse reçue** : zone PLU : · dans le périmètre des Monuments Historiques ? OUI / NON · règle de teinte d'enduit :

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Orange possède de larges périmètres protégés autour de son théâtre antique. Si la parcelle en fait partie, l'instruction dure 1 mois de plus et la teinte d'enduit ainsi que l'aspect de la porte K1 vous seront imposés — cela ne coûte rien, seulement de la patience.

3 Autorisation → attente → travaux : le bon ordre (une page)

Règle d'or : le papier d'abord, la truelle ensuite. Ne changez pas l'ordre ci-dessous ; cochez chaque phase une fois terminée.

☐ SEPTEMBRE

Relevé + dossier

Les 6 mesures de la page 1 + photos. Montage du dossier (Déclaration Préalable, formulaire Cerfa 13703) : plan de situation, plan de masse, coupe, façade avant/après, photomontage. K1 (nouvelle porte vitrée en tête d'escalier) modifie la façade — elle figure OBLIGATOIREMENT sur les planches de la DP ; si le dossier est déjà déposé, déposez un modificatif.

☐ OCTOBRE

Dépôt + panneau

Au guichet numérique de la mairie ou sur place, 2 à 4 exemplaires. Le jour même, fixez le panneau d'affichage jaune au portail et photographiez-le — le délai de recours court à partir de cet affichage.

☐ OCT-NOV

Attente (instruction)

1 mois en régime standard, 2 mois en secteur protégé. Sans réponse, c'est accordé (silence vaut acceptation). Pendant ce temps, comparez les prix des matériaux et demandez des devis de mobilier — mais ne commandez RIEN.

☐ NOV-DÉC

Attente (délai de recours)

Après l'accord, les voisins ont 2 mois pour contester. Le plus sûr est d'attendre aussi ce délai. Entre-temps : deux devis d'artisans ; choix de K1 (porte alu vitrée), de V (porte intérieure bois) et du carrelage.

☐ DÉC-JANV

Gros œuvre (3-4 semaines)

Semelle → murs + murage de l'ancienne porte est → rehausse du plancher → jonction toiture → bouchement de la fenêtre + châssis vitré → pose de la porte K1 → gaines électriques. Séquence en 14 étapes dans le dossier principal (p.08).

☐ JANVIER

JOUR DU RELEVÉ

La pièce est finie : relevé final au mètre laser. La liste de débit du mobilier est figée d'après ce relevé et la commande part SEULEMENT MAINTENANT.

☐ FÉVRIER

Second œuvre + mobilier

Isolation, plaques de plâtre, cloison légère palier-vestiaire (ossature métallique + double BA13) + porte V, enduits, carrelage, peinture ; la fabrication du mobilier avance en parallèle. À la livraison : montage + raccordement LED.

☐ MARS

Clôture

DAACT (déclaration d'achèvement) à la mairie. Prévenez l'assureur : « 8 m² créés ». La taxe d'aménagement (≈ €360-540) arrive l'année suivante — pas une surprise.

L'ERREUR LA PLUS CHÈRE

Commander le mobilier trop tôt, sur les cotes du plan. Un mur bouge de 2 cm et l'armoire ne rentre plus. Date de commande = lendemain du JOUR DU RELEVÉ.

4 Liste d'achats — avec les noms utilisés en magasin

Le mot à donner en caisse est entre parenthèses — montrez la liste, cela suffit. Les quantités sont le mètre Rév. B (tools/quantities.py ; 10 % de chute inclus sur blocs et mortier). Relancez le calcul après le JOUR DU RELEVÉ.

SEMELLE ET MURS

- ☐ Blocs béton 20 cm (parpaing de 20) — ≈ 325 u (≈ 29.2 m² de mur ; bouchement de l'ancienne porte est inclus)
- ☐ Mortier (mortier bâtard) — ≈ 28 sacs de 25 kg
- ☐ Béton prêt à l'emploi ou ciment+sable+gravier (béton C25/30) — ≈ 1.48 m³ (semelle 0.85 + chaînage 0.27 + clavetage 0.36)
- ☐ Acier 10 mm (fer à béton HA10) — ≈ 29 kg ; treillis ST25 ≈ 9.2 m²
- ☐ Rouleau d'arase étanche (bande d'arase)
- ☐ Liaison aux murs existants (équerres + scellement chimique)

REHAUSSE DU PLANCHER

- ☐ Poutrelles précontraintes (poutrelle) — ≈ 8 u, longueur 2.0 m, coupées en magasin
- ☐ Hourdis (entrevous) — ≈ 8.0 m², selon l'entraxe des poutrelles
- ☐ La dalle de clavetage est comprise dans le poste béton ci-dessus
- ☐ Grilles d'aération — 2 u

CLOISON ET PORTES (RÉV. B)

- ☐ Plaques de plâtre cloison (BA13) — ≈ 13.9 m² (2 faces $\times$ 2 couches)
- ☐ Ossature cloison (rail R48 + montant M48) — ≈ 16.5 m
- ☐ Laine minérale 45 mm, acoustique — ≈ 5.0 m²
- ☐ Porte K1 900 $\times$ 2100 — porte d'entrée alu vitrée à rupture de pont thermique, $U_w \leq 1.6$, serrure RC2, ferme-porte — 1 u
- ☐ Porte V 730 $\times$ 2100 — bloc-porte bois, $U_d \leq 1.4$ — 1 u

ISOLATION ET DOUBLAGE

- ☐ Isolant murs 100 mm ($R \geq 3.0$, ex. laine de verre GR32) — ≈ 21.3 m²
- ☐ Isolant sol PU 80-100 mm (panneau polyuréthane) — ≈ 8.0 m²
- ☐ Pare-vapeur + adhésif
- ☐ Doublage plaques 13 mm (BA13) — ≈ 29.3 m² + ossature (rails/montants)
- ☐ Isolant plafond 60-100 mm — ≈ 8.0 m² + plaques

FINITIONS

- ☐ Enduit monocouche (ex. Weberpral M) — ≈ 22.2 m² (≈ 23 sacs) ; teinte : identique à la façade, apportez un échantillon
- ☐ Profilé de départ d'enduit
- ☐ Châssis fixe vitré 1000 $\times$ 450 (châssis fixe alu) — bandeau haut du mur est, allège +2000 (cote = HYPOTHÈSE)
- ☐ Carrelage antidérapant R10 — ≈ 8.8 m² + colle + joint
- ☐ Sous-couche + peinture mate lessivable


5 Outillage — n'achetez pas, louez

Chaque grande surface de bricolage a un comptoir de location à la journée (location de matériel). Louez ceci :

- ☐ Niveau laser — pour la semelle, le plancher et le jour du mobilier
- ☐ Plaque vibrante — seulement si le remblai Option B est retenu
- ☐ Scie de chantier ou disqueuse Ø230
- ☐ Malaxeur + brouette pour les coulages
- ☐ Perforateur SDS — perçages de scellement
- ☐ Embout de vissage plaques + pince-plaque — pour la cloison (à acheter, peu cher)

6 Nouvelle circulation — une entrée à deux portes (Rév. B)

En haut de l'escalier, K1 (nouvelle porte vitrée) ouvre VERS le palier ; à gauche la porte de la maison (inchangée), à droite la porte V ouvre VERS le vestiaire — en entrant, on voit le miroir juste en face. Le schéma est en cotes nominales.

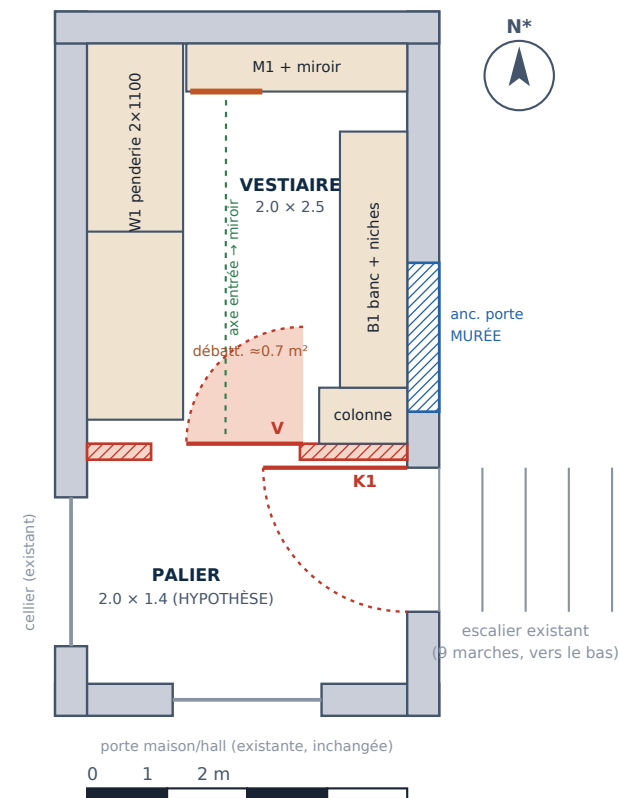

Plan schématique — cotes en mm, nominales. Relevé sur site obligatoire avant toute fabrication.

Pourquoi ces sens d'ouverture ?

- K1 : une porte ouvrant VERS l'escalier pousse l'utilisateur dans le vide et le vantail heurte qui monte — risque de chute. Elle ouvre donc VERS le palier ; paumelles côté nord, le vantail ouvert se rabat contre le mur nord ; le ferme-porte évite les claquements au vent.
- V : le palier étant peu profond (1.40 m), elle ouvre VERS le vestiaire ; paumelles côté EST — le vantail s'ouvre à 90° complets et se range côté est, laissant libres l'axe entrée → miroir et l'armoire (Phase 4.1).
- Même les deux portes ouvertes en même temps, les vantaux restent dans des volumes différents — aucun conflit.

ZONE MORTE — CHOIX ASSUMÉ

Le débattement du vantail V (quart de cercle hachuré, ≈ 0.7 m²) recouvre la bande d'usage devant le module sud de W1 : porte V ouverte, la façade de ce module ne s'ouvre pas, et le vantail s'appuie sur l'angle sud de W1 avant d'atteindre 90° (le schéma montre 90°). Le vantail ne logeant pas dans le palier étroit (1.40 m), ce recouvrement est accepté sciemment ; au quotidien, porte fermée, aucun problème. L'axe de la porte est vérifié sur site au JOUR DU RELEVÉ.

7 Qu'est-ce qui rentre ? — tableau de capacité (WP2)

Quoi	Capacité	Où
Manteaux longs	8 u	W1 module A — penderie toute hauteur, barre ≈ 1800
Vestes / penderie courte	12 u	W1 module B — double barre ≈ 950 / ≈ 1850
Patères (sacs, écharpes, clés)	6 u	Panneau dossier du banc B1, bande 1700-1750
Chaussures du quotidien	6 paires	Tiroirs du banc B1 (2 tiroirs)
Chaussures — colonne	10 paires	Colonne 550×350×2350 — face vestiaire de la cloison, extrémité est
Chaussures — saison	12 paires	Caissons hauts / pont (au-dessus de +2000)
Étagères ouvertes	3.2 m	Étagère d'angle M1 5 niveaux × 0.35 m + niche au-dessus du banc 3 × 0.50 m
Rangement fermé	4.5 m³	W1 + colonne/pont M1 + banc + colonne à chaussures cumulés

Source : data/quantities.json → capacity_check (tools/quantities.py Rév. B). Comptez votre garde-robe d'hiver — au-delà, rotation saisonnière.

8 Les 10 règles d'or

- 1 Ne touchez à aucun mur avant l'accord + les 2 mois de délai de recours.
- 2 K1 n'ouvre jamais VERS l'escalier — elle ouvre VERS le palier ; ferme-porte obligatoire.
- 3 Gardez au moins 90 cm de dégagement plat devant la porte fermée.
- 4 Rehaussez le plancher en système ventilé (Option A) et n'oubliez pas les 2 grilles.
- 5 Une arase étanche sous chaque mur neuf — c'est le remède contre les moisissures.
- 6 Ne lieonnez pas le mur neuf à la charpente au mortier ; laine comprimée + mastic dans le joint.
- 7 Carrelage du palier et du vestiaire au MÊME niveau (+1.25) — pas de seuil à la porte V ; le seul seuil est à K1 (20 mm max).
- 8 Passez l'électricité avant la fermeture des murs et de la cloison : 2 prises, éclairage à détecteur, une ligne 24 V pour le mobilier.
- 9 Ne commandez pas le mobilier avant la fin de la pièce ; jour du relevé + 1.
- 10 Photographiez chaque étape — archives pour la mairie, l'assureur et le menuisier.

9 Qui appeler, et quand

Qui	Quand	Pour quoi
Service urbanisme de la mairie	Tout au début + au dépôt	Zone PLU, statut ABF, dépôt du dossier (K1 incluse)
Conseil ABF (via la mairie)	Seulement en secteur protégé	Avis préalable teinte d'enduit / aspect K1 — évite un refus
Deux maçons locaux	Pendant l'instruction	Devis comparatifs — une référence de prix même en autoconstruction
Fournisseur de menuiseries (menuiserie alu)	Après l'accord	Porte K1 alu vitrée + porte V intérieure — délai 4-6 semaines
Électricien	À l'étape 10 du gros œuvre	Prises + éclairage + ligne 24 V ; conformité NF C 15-100
Menuisier / agenceur	Après le JOUR DU RELEVÉ	Révision de la liste de débit + commande
Transitaire (si fabrication en Turquie)	Avec la commande	Livraison DAP, certificat A.TR, assurance ; penser à la TVA
Votre assureur	À la fin des travaux	Déclarer « 8 m ² de surface créés »

UNE FOIS TERMINÉ

DAACT à la mairie + information de l'assureur + factures dans un seul classeur. Puis suspendez le manteau, rangez les bottes dans le tiroir, fermez la porte — le projet, c'est tout cela.
