

Sundurma → Vestiyer Dönüşümü

Gözü kapat · ≈ 0.9 m yükselt · K1 kapılı sahanlık + donatılmış vestiyer (Rev B)

YÖNETİCİ ÖZETİ

Orange (84100) · Vaucluse · Fransa

Temmuz 2026 · Rev B

NE VE NEDEN

Giriş merdiveninin yanındaki üstü kapalı, yanı açık göz (bugün: çöp konteynerleri, döşeme ≈ +0.30 m) yalıtımlı kâgir duvarla kapatılır, döşemesi ≈ 0.9 m yükseltilir (hedef kot +1.25) ve hafif bir bölmeyle ikiye ayrılır: merdiven başındaki yeni camlı dış kapı K1 önce 2.0 × 1.4 m SAHANLIĞA açılır (solda mevcut ev kapısı), sağdaki V kapısından 2.0 × 2.5 m VESTİYERE girilir — giren, aynayı tam karşısında görür. Donanım: 2 modül gardirop (W1), bank B1 (2 çekmece + 6 kanca + 3 niş), M1 ayna ünitesi ve ayakkabı kulesi. Eski doğu kapı boşluğu örülür. Tek bir Déclaration Préalable (ön izin bildirimi) işlerin tamamını kapsar.

DÖRT KARAR, CEVAPLARIYLA

MERDİVEN BAŞINDAKİ KAPI K1 (VE VESTİYER KAPISI V)

Merdiven kalır. K1 SAHANLIĞA İÇE açılır — asla merdiven üzerine dışa değil; menteşe kuzey kasada, kanat bölmeye yaslanır; kendinden kapanan menteşe. V ise dar sahanlığa değil VESTİYERE içe açılır (menteşe batı) — iki kanat farklı hacimlerde, çarpışma yok.

DÖŞEME NASIL YÜKSELİR

Ara oturtma duvarları + havalandırılmalı boşluklu asmolen döşeme (Seçenek A) — Fransa'nın standart yöntemi: oturma yok, kuru, kendin-yap dostu. Sıkıştırılmış dolgu + plak ancak 20 cm tabakalı disiplinli sıkıştırmayla kabul edilebilir. Sahanlık ve vestiyer AYNI kotta (+1.25) biter — V'de eşik yok.

İZİNLER

Déclaration Préalable (Cerfa 13703) zorunlu (yeni alan + cephe değişikliği + muhtemel koruma çevresi). 1-2 ay inceleme; 2 aylık itiraz süresini bekleyin. Orange büyük bir miras kenti — ABF (Fransa Anıtlar Mimarı) ilgisi bekleyin; tasarım (uyumlu sıva, sade K1, küçük cam bant) geçecek şekilde yapıldı.

MOBİLYA — FRANSA MI TÜRKİYE Mİ

Türkiye'den özel demonte üretim ≈ €5.0-7.5k teslim; Fransız butik €9-14k (≈ %40-45 ucuz). AB-TR gümrük birliği (A.TR = %0 gümrük; %20 ithalat KDV). Yalnız güvenilir atölyeyle, ölçü kaba inşaattan SONRA. Yedek plan: FR yarı-özel ≈ €3.5-6k.

ANA RAKAMLAR (MERTEBE)

≈ 8 m²

yeni alan: sahanlık ≈ 2.8 + vestiyer ≈ 5.0 m²

≈ +0.9 m

döşeme +0.30 → +1.25 hedef (sahanlık = vestiyer)

€8.4-13.7k

kaba inşaat ustayla (kendin-yap malzeme €4.2-6.5k kapılar dahil)

€5.0-7.5k

TR mobilya teslim (FR butik €9-14k)


1-2 ay

DP incelemesi (ABF ise 2 ay)


€360-540

taxe d'aménagement (imar vergisi), tek sefer

DIŞARIDAN GÖRÜNEN TEK DEĞİŞİKLİK

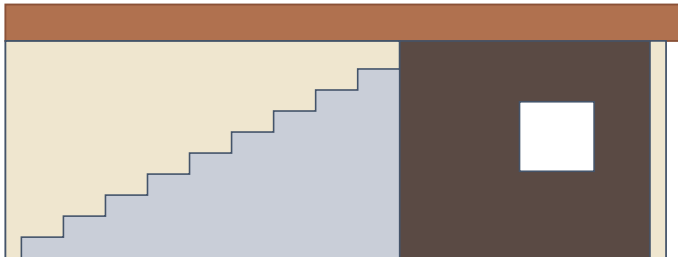

ÖNCE — açık göz (çöp konteynerleri)

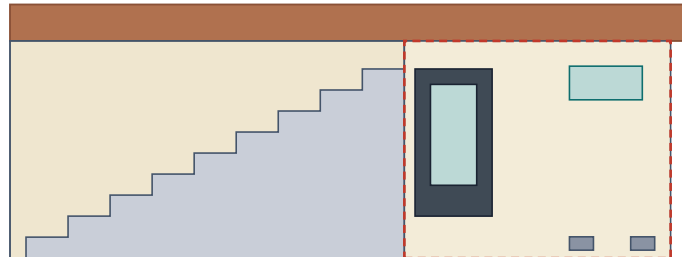

SONRA — sıvalı duvar + camlı K1 kapısı + cam bant

Sundurma → Vestiyer Dönüşümü

Para, izinler ve kendin-yapı deritten uzak tutan beş kural

YÖNETİCİ ÖZETİ

Orange (84100) · Vaucluse · Fransa

Temmuz 2026 · Rev B

MALİYET TABLOSU (REV B — TEKLİFLERLE NETLEŞİR)

Kaba İnşaat (≈ 8 m²)	Usta	Kendin-yap malz.
Temeller · duvarlar · sıva · pencere dolgusu	€3,500-5,500	€1,650-2,300
Döşeme (Seçenek A) · bölme · çatı birleşimi · tavan	€2,100-3,400	€900-1,400
Elektrik · kapılar K1 + V · cam bant · karo	€2,800-4,800	€1,650-2,800
KABA İNŞAAT TOPLAMI	≈ €8.4-13.7k	≈ €4.2-6.5k kapılar dahil

Mobilya rotası (W1 + B1 + M1 + kule)	Teslim	Not
FR butik marangoz, montajlı	€9-14k	tam garanti, sıfır lojistik
FR yarı-özel (PAX + kapak)	€3.5-6k	pragmatik orta yol, referansa yakın görünüm
TR özel demonte, sevkiyatlı	€5.0-7.5k	%0 gümrük (A.TR) + %20 KDV; ölçü kaba sonrası

Toplu: kendin-yap + TR mobilya ≈ €9.2-14k · usta + FR butik ≈ €17.4-27.7k. %10-15 beklenmedik payı ekleyin.

İZİN YOLU — DÉCLARATION PRÉALABLE

- Orange Belediyesi İmar Servisi'ne sorun: PLU bölgesi + ABF çevresi durumu.
- DP dosyasını verin (Cerfa 13703): planlar + kesit + önce/sonra cepheler + fotomontaj.
- İnceleme 1 ay (ABF bölgesinde 2; sessizlik = onay). Panoyu asın; 2 aylık itiraz süresini bekleyin.
- Onaylı dosyaya göre inşa edin; bitince DAACT (iş bitim beyanı). Taxe d'aménagement ≈ €360-540 sonra gelir.

Eyl · DP dosyası	Eki-Kas · inceleme	İtiraz süresi	kaba 3-4 hf	iç imalat 2-3 hf
------------------	--------------------	---------------	-------------	------------------

≈ 5-6 ay uçtan uca — yarısı evrak bekleme. Mobilya paralel üretilir, en son kurulur.

KENDİN-YAPAN İÇİN EN ÖNEMLİ 5 YAP / YAPMA

YAP

- YAPIN: PLU/ABF cevabını DP dosyasından önce yazılı alın.
- YAPIN: Seçenek A (havalandırmalı asmolen) + su yalıtım bandı — hep kuru döşeme.
- YAPIN: sahanlık ve vestiyer karosunu AYNI kota (+1.25) getirin — V'de sıfır eşik.
- YAPIN: elektriği (priz, sensörlü ışık, 24 V LED) kaplamadan önce çekin.
- YAPIN: kaba bitince her şeyi yeniden ölçün, mobilyayı ancak o zaman sipariş edin.

YAPMA

- YAPMAYIN: DP onayı + itiraz süresi dolmadan taşıyıcı işe başlamak.
- YAPMAYIN: K1'i merdiven üzerine dışa açmak — asla; V'yi de dar sahanlığa açmayın.
- YAPMAYIN: yeni duvarı çatı ahşabına rijit harçlamak (sıkışabilir derz).
- YAPMAYIN: Türk mobilyasını plan ölçüsünden sipariş etmek — yalnız saha ölçüsü.
- YAPMAYIN: menfezleri atlamak: havalandırmaz boşluk = nemli döşeme.

TERS GİDERSE — ÜÇ GERÇEK RİSK

- Ölçü hatası TR mobilya rotasını bitirir — demir kural: kaba inşaat sonrası lazerle ölçün, sonra kesim listesi ve sipariş.
- ABF sıva tonu veya kapı rengi dayatabilir — Orange'da rutindir; direnmek yerine ayarlayıp yeniden sunun.
- TR rotasında taşıma hasarı — ambalaj şartnamesi sözleşmede, sarım öncesi fotoğraflar, teslim değerine sigorta, hasar teslimde CMR'ye yazılır.

SIRADA: ① gözü ve çatı altını ölçün ② belediyeye tek e-posta (bölge + ABF) ③ DP dosyasını verin.

Tüm ayrıntı, çizim ve adım adım yöntem: A3 Tasarım ve Uygulama Dosyası (14 sayfa).
