

Sundurma → Vestiyer Dönüşümü

Tasarım, Mühendislik, İzin ve Satın Alma Dosyası

Özel konut · Orange (84100), Vaucluse, Fransa

KAPSAM


Üstü kapalı sundurma gözünün ($\approx 2.0 \times 4.0$ m) kapatılması, döşemenin $+0.30 \rightarrow +1.25$ hedef kotuna (≈ 0.9 m) yükseltilmesi; içeride K1 rüzgârlık kapılı SAHANLIK + hafif bölme + donatılmış VESTİYER

TESLİMATLAR

Öneri planı · kesitler · görünüş · K1/V kapı kararları · iş sırası · Fransız izinleri · imalat çizimleri · FR-TR maliyet ve lojistik

DURUM

Rev B — sirkülasyon revizyonu: merdiven → K1 → sahanlık → V → vestiyer; eski doğu kapısı iptal (örülür). Sipariş veya imalattan önce tüm ölçüleri yerinde doğrulayın.



Mevcut sundurma ve merdiven · hedef vestiyer konsepti · dönüştürülecek alan

Temmuz 2026 · Rev B · Mal sahibinin kendin-yap koordinasyonu için hazırlanmıştır (mimar olmayanlara uygun)

GİZLİ — AİLE PROJE BELGESİ

TEK PARAGRAFTA PROJE (REV B)

Giriş merdiveninin yanındaki üstü kapalı, yanı açık göz (bugün çöp konteynerleri duruyor, döşeme $\approx +0.30$ m) yeni yalıtımlı bir kâgir duvarla kapatılır ve döşemesi ≈ 0.9 m yükseltilir (hedef kot +1.25). İç hacim hafif bir bölmeyle ikiye ayrılır: merdiven başındaki yeni camlı dış kapı K1 önce 2.0×1.4 m SAHANLIĞA açılır (solda mevcut ev kapısı, kapsam dışı); sağdaki V kapısından 2.0×2.5 m VESTİYERE girilir — giren, aynayı (M1) tam karşısında görür. Donanım: batı duvarda 2 modül gardirop (W1), doğu duvarda bank B1 (2 çekmece + 6 kanca + 3 niş), bölme önünde ayakkabı kulesi. Eski doğu (merdiven tarafı) kapı boşluğu İPTAL — örülür.

BU DOSYANIN ÇÖZDÜĞÜ DÖRT KARAR**1 · MERDİVEN BAŞINDAKİ KAPI K1**

Merdiven yerinde kalır. Yeni camlı thermal-break alüminyum kapı K1 merdiven başına takılır ve SAHANLIĞA İÇE açılır — asla merdiven üzerine değil; menteşe kuzey kasada, kendinden kapanan. Vestiyer kapısı V ise VESTİYERE içe açılır. Ayrıntı: sayfa 05.

2 · DÖŞEME ≈ 0.9 m NASIL YÜKSELİR

Önerilen: ara oturtma duvarları üzerine asmolen döşeme (prekast kiriş + dolgu blok, Fr. "poutrelles-hourdis") ve altında havalandırmalı boşluk — Fransa'nın standart yöntemi. Alternatif: sıkıştırılmış dolgu + yalıtımlı plak (daha basit; kötü sıkıştırmada oturma riski). Ayrıntı: sayfa 06.

3 · ORANGE'DA İZİNLER

Déclaration Préalable (ön izin bildirimi, Cerfa 13703) zorunlu: yeni cephe duvarı + kapalı alan kazanımı + pencere kapatma. Orange'da korumalı miras bölgeleri var — parsel ABF (Fransa Anıtlar Mimarı) çevresindeyse 1 ay ekleyin, sıva/renek kurallarına uyun. Ayrıntı: sayfa 09.

4 · MOBİLYA: FRANSA MI TÜRKİYE Mİ

Fransız butik imalat: montajlı $\approx$ €9–14k. Türkiye'den özel üretim demonte (flat-pack), A.TR ile sevkiyat (%0 gümrük, %20 Fransız ithalat KDV'si) ve kendi montajı: $\approx$ €5.0–7.5k teslim — tipik %40–45 daha ucuz, riskleri yönetilebilir. Ayrıntı: sayfa 12–13.

ANA RAKAMLAR (MERTEBE — KEŞİF VE TEKLİFLERLE NETLEŞİR) **$\approx 8 \text{ m}^2$**

yeni kapalı alan: sahanlık ≈ 2.8 + vestiyer $\approx 5.0 \text{ m}^2$ (doğrulanacak)

 $\approx +0.9 \text{ m}$

döşeme yükseltme: $+0.30 \rightarrow +1.25$ hedef bitmiş kot

€8.4–13.7k

kaba inşaat ustayla · kendin-yap malzeme €3.3–4.9k (kapılar hariç)

€5.0–7.5k

Türkiye rotası mobilya teslim (FR butik €9–14k)

1–2 ay

Déclaration Préalable süreci (ABF bölgesinde 2 ay)

 $\approx$ €360–540

tek sefer taxe d'aménagement (imar vergisi; $8 \text{ m}^2 \times €892/\text{m}^2 \times$ yerel oran)

ÇALIŞMA VARSAYIMLARI — SİPARİŞTEN ÖNCE YERİNDE DOĞRULAYIN

İç ölçü 2.0×4.0 m ile $+0.30 / +1.25$ kotları 2006 ruhsat planından ve mal sahibinin brifinden alınmıştır. Sahanlık derinliği 1400 mm açıkça VARSAYIMDIR (plandan okunamadı). CAM BANT İPTAL EDİLDİ (mal sahibi kararı, Tem 2026) — doğu duvar dolu örülür. Göz geometrisi, çatı altı yüksekliği (hedef ≥ 2.30 m net), kapatılacak pencerenin yeri ve merdiven sahanlığı ÖLÇÜ GÜNÜ yeniden ölçülür. Bu dosyadaki çizimler tasarım amaçlıdır, imalat ölçüsü değildir — imalat öncesi yerinde ölçü zorunludur.

BUGÜN NE VAR

Giriş merdiveni araç yolundan sundurmaya ≈ 1.20 m çıkar. Yanında, aynı çatının altında, alçak kotta ($\approx +0.30$ m) yanı açık kapalı bir göz var — dönüştürülecek alan burası; bugün çöp konteynerleri duruyor. Arka duvarda kapatılacak küçük parmaklıklı bir pencere/menfez var. Göz araç yoluna doğru bir yüzden açık; yeni yalıtımlı duvar bu açıklığa örülecek ve ana cephe değişikliği bu olacak.



1 · Giriş merdiveni + açık göz (yeni duvar bu yüzü kapatır)




2 · Gözün içi: alçak döşeme $\approx +0.30$, kapatılacak menfez




3 · Hedef: donatılmış vestiyer (mal sahibinin referansı)

Kesik kırmızı: dönüşüm alanı (yaklaşık)

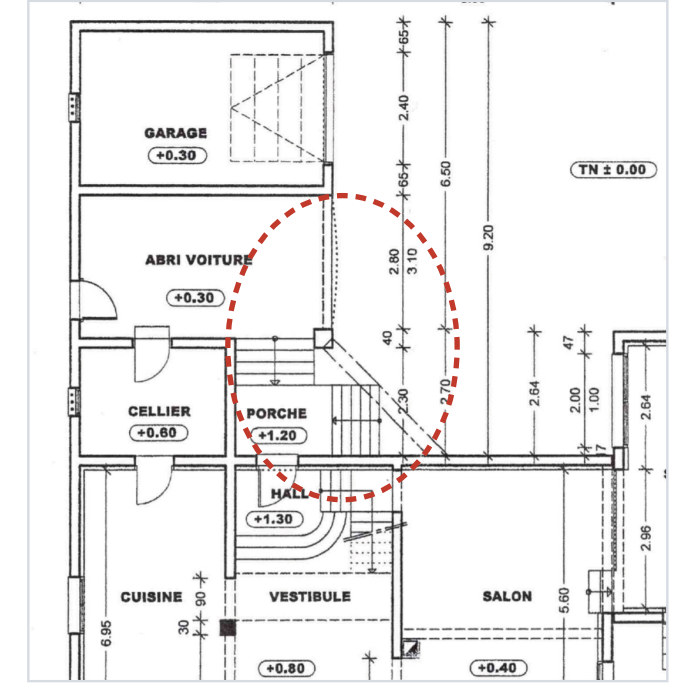

4 · RDC (zemin kat) ruhsat planı paftası (2006) — sundurma bölgesi

KOT PROBLEMİ — BİR KÖŞEDE ALTI FARKLI DÖŞEME KOTU

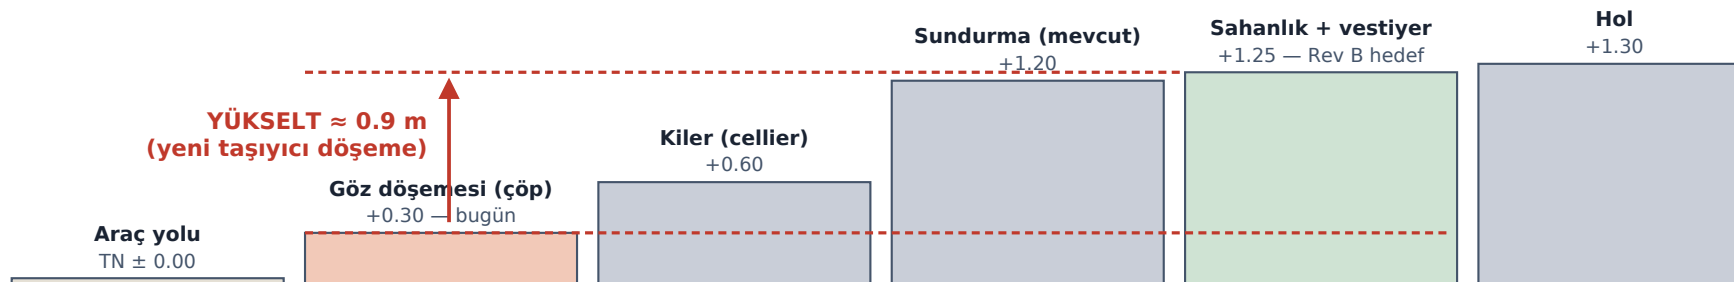

Tasarım kesinleşmeden yapılacak ölçümler: ① gözün net en x boy ölçüsü, ② +1.25 üzerindeki çatı/ahşap alt kotu (≥ 2.30 m net gerekli — fotoğraflardan ≈ 2.4 – 2.6 m görünüyor, doğrulayın), ③ merdiven başı sahanlık derinliği (Rev B varsayımı 1400 mm), ④ kapatılacak pencere ve menfezin yeri ve ölçüsü, ⑤ çatı yağmur suyunun nereye aktığı, ⑥ gözdeki tesisat (CCTV kamera ve kablolar taşınacak).

Öneri Planı — +1.25 Kotunda Sahanlık + Vestiyer

Rev B: merdiven → K1 → sahanlık → V → vestiyer · kırmızı = yeni · gri = mevcut · kesik kahve = mobilya

03 · ÇİZİMLER


SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B

LEJANT

- YENİ — yalıtımlı kâgir duvar (20 cm blok + iç kaplama)
- MEVCUT — korunan duvarlar
- HAFİF BÖLME — metal karkas + çift kat alçıpan (100 mm)
- Döşeme +0.30 → +1.25 yükseltilir (yeni strüktür)
- Sabit mobilya (imalat çizimleri, s.10-11)
- Sabit ayna

PLAN NOTLARI (REV B)

- N1 — K1 merdiven başındaki yeni camlı dış kapıdır: SAHANLIĞA İÇE açılır, menteşe kuzey kasada; açık kanat bölme duvarına yaslanır. Gerekçe: s.05.
- N2 — V vestiyer kapısıdır: VESTİYERE İÇE açılır, menteşe DOĞU kasada; kanat 90° açılır ve doğu yanda park eder. Giren, aynayı (M1) karşısında görür.
- N3 — Yeni doğu ve kuzey duvarları yeni şerit temellere oturur (s.06). Önceki taslaktaki doğu kapısı İPTAL — duvar dolu örülür; doğu duvar içte B1 bankına ayrılır.
- N4 — Sahanlık-vestiyer bölmesi hafiftir (temel yükü yok): DC50 karkas + çift kat BA13 + 45 mm mineral yün; V kasası çift dikmeye vidalanır.
- N5 — Kiler duvarındaki pencere ve menfez örülür. Duvar imalatından önce CCTV ve kabloları taşıyın; 2 ikili priz + LED beslemesi bırakın (s.11).
- N6 — Karo R10 kaymaz; sahanlık ve vestiyer AYNİ kotta (+1.25) — V geçişinde eşik yok, tek eşik K1'de (≤ 20 mm).
- *Sahanlık derinliği 1400 mm VARSAYIMDIR — ölçü günü kesinleşir.

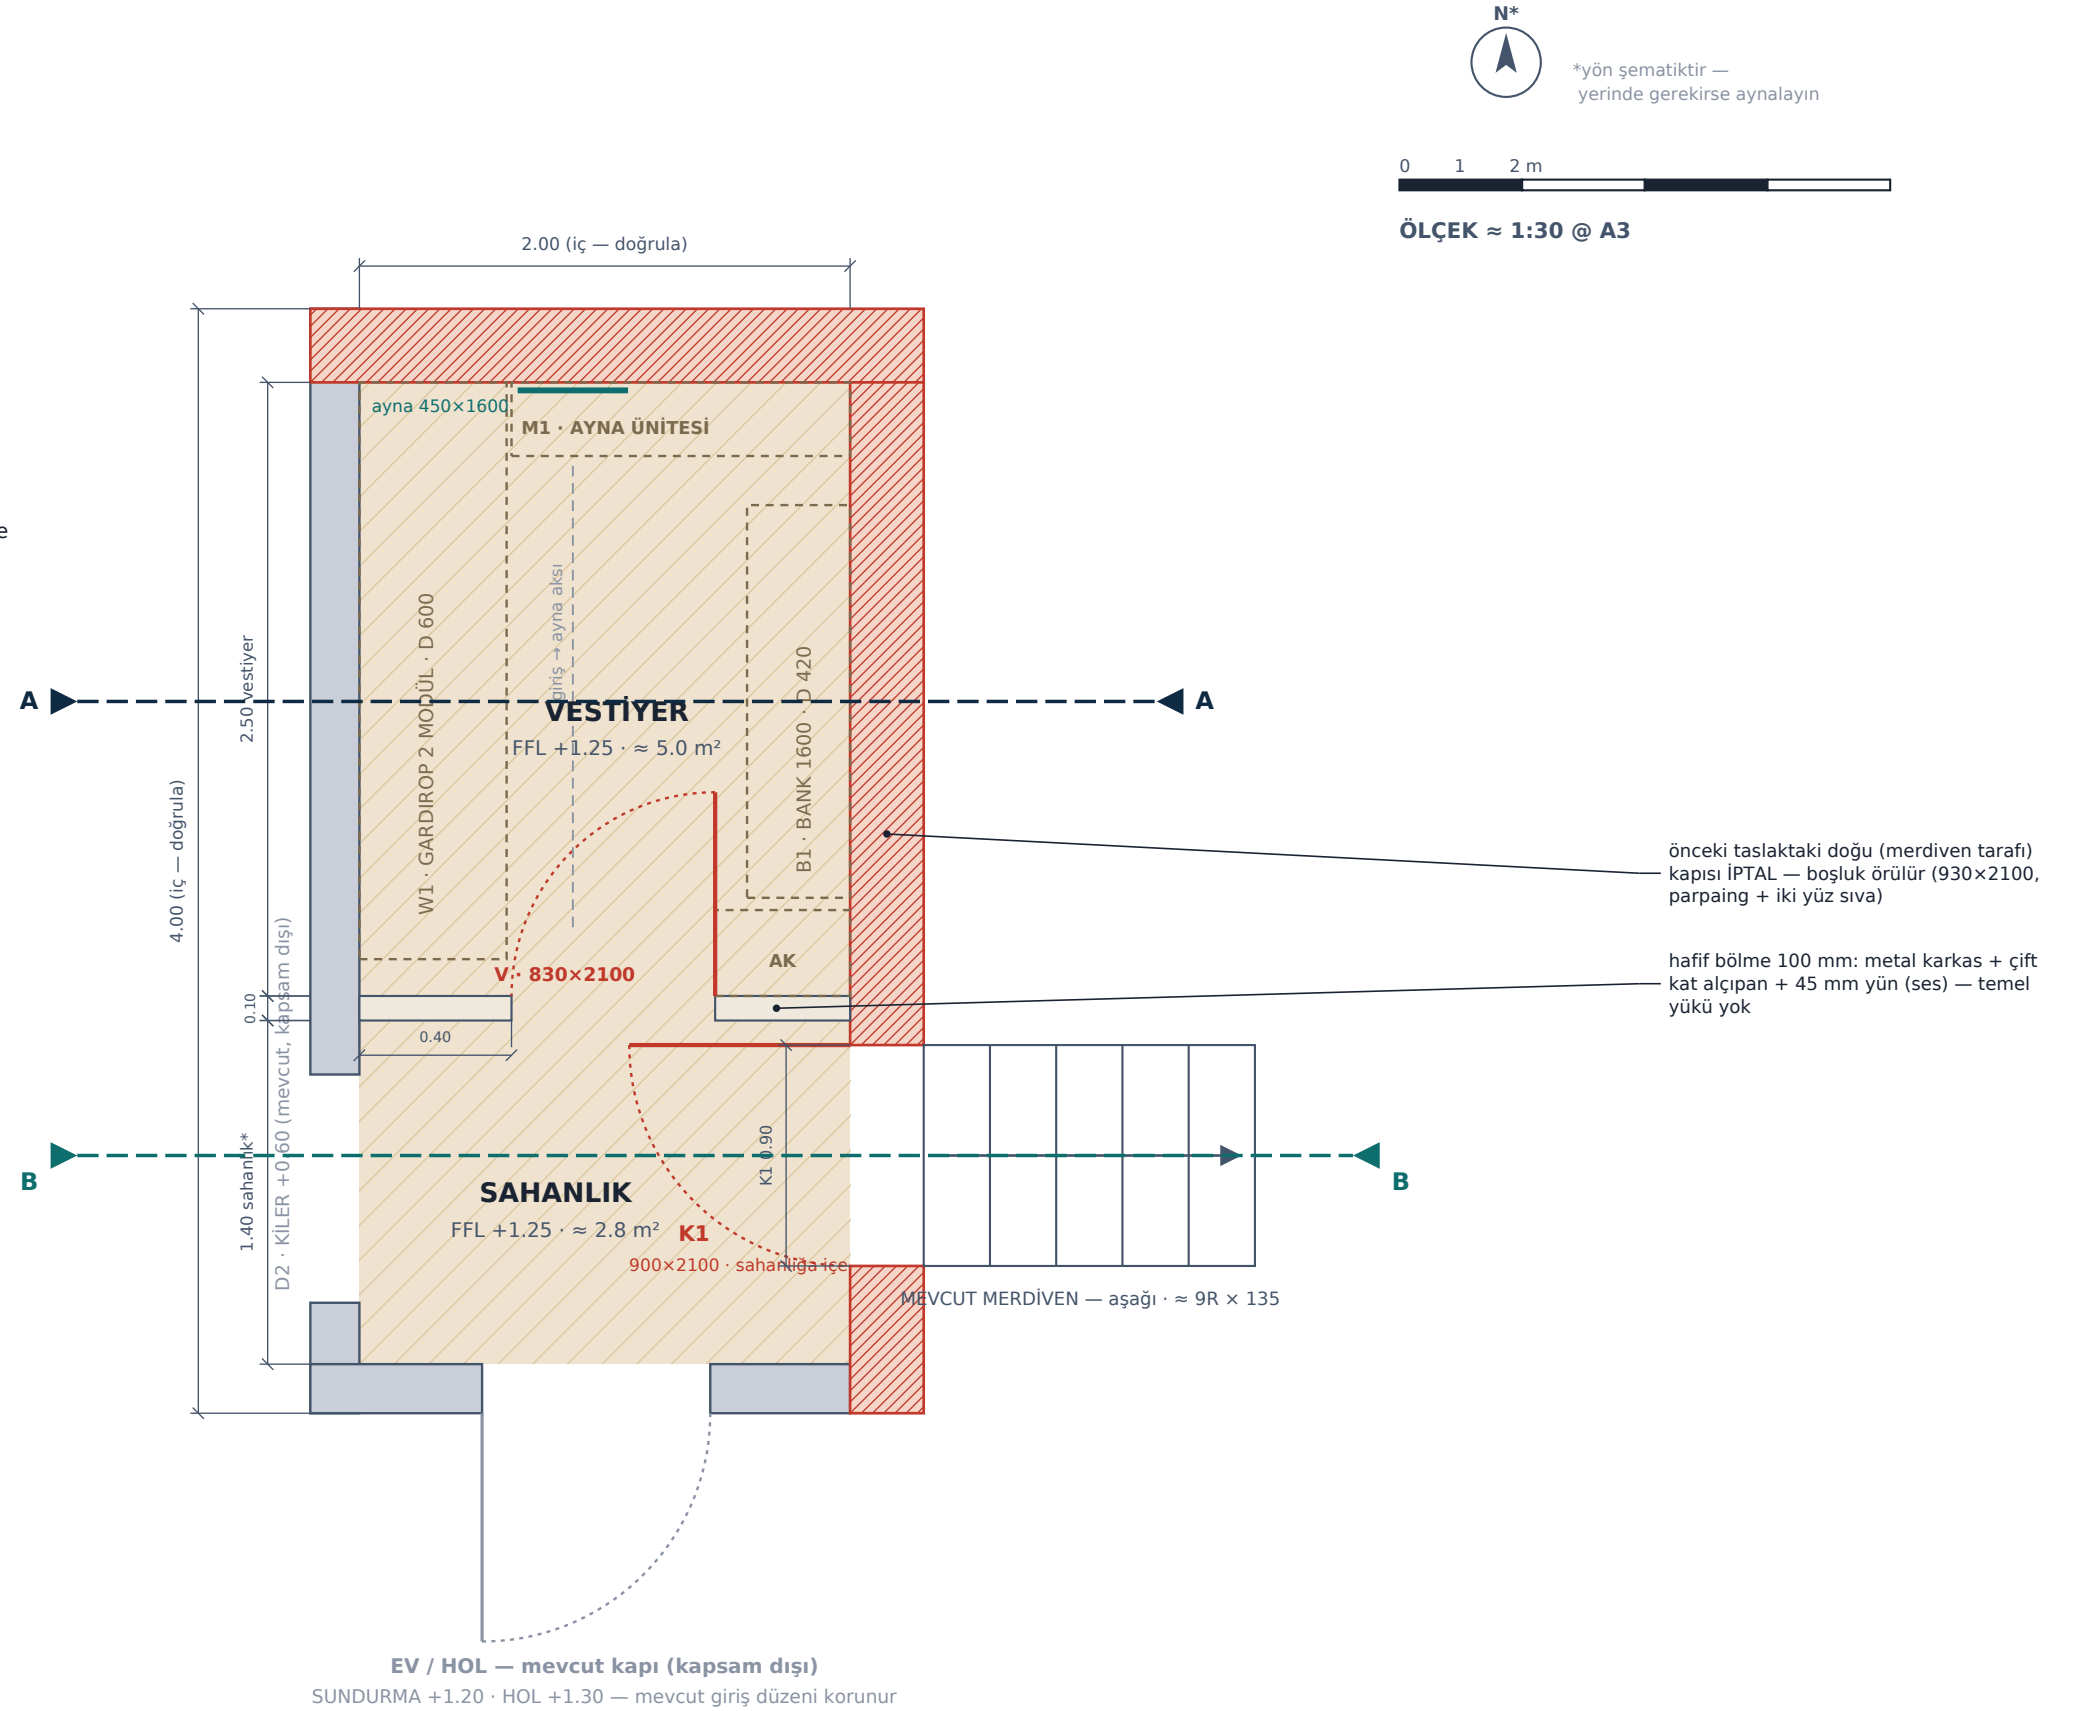


B-B Kesiti ve Kapı Kararları — K1 · V

Merdiven, K1 rüzgârlık kapısı ve sahanlıktan geçen kesit — iki kapının yön gerekçeleriyle

03 · ÇİZİMLER

SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B

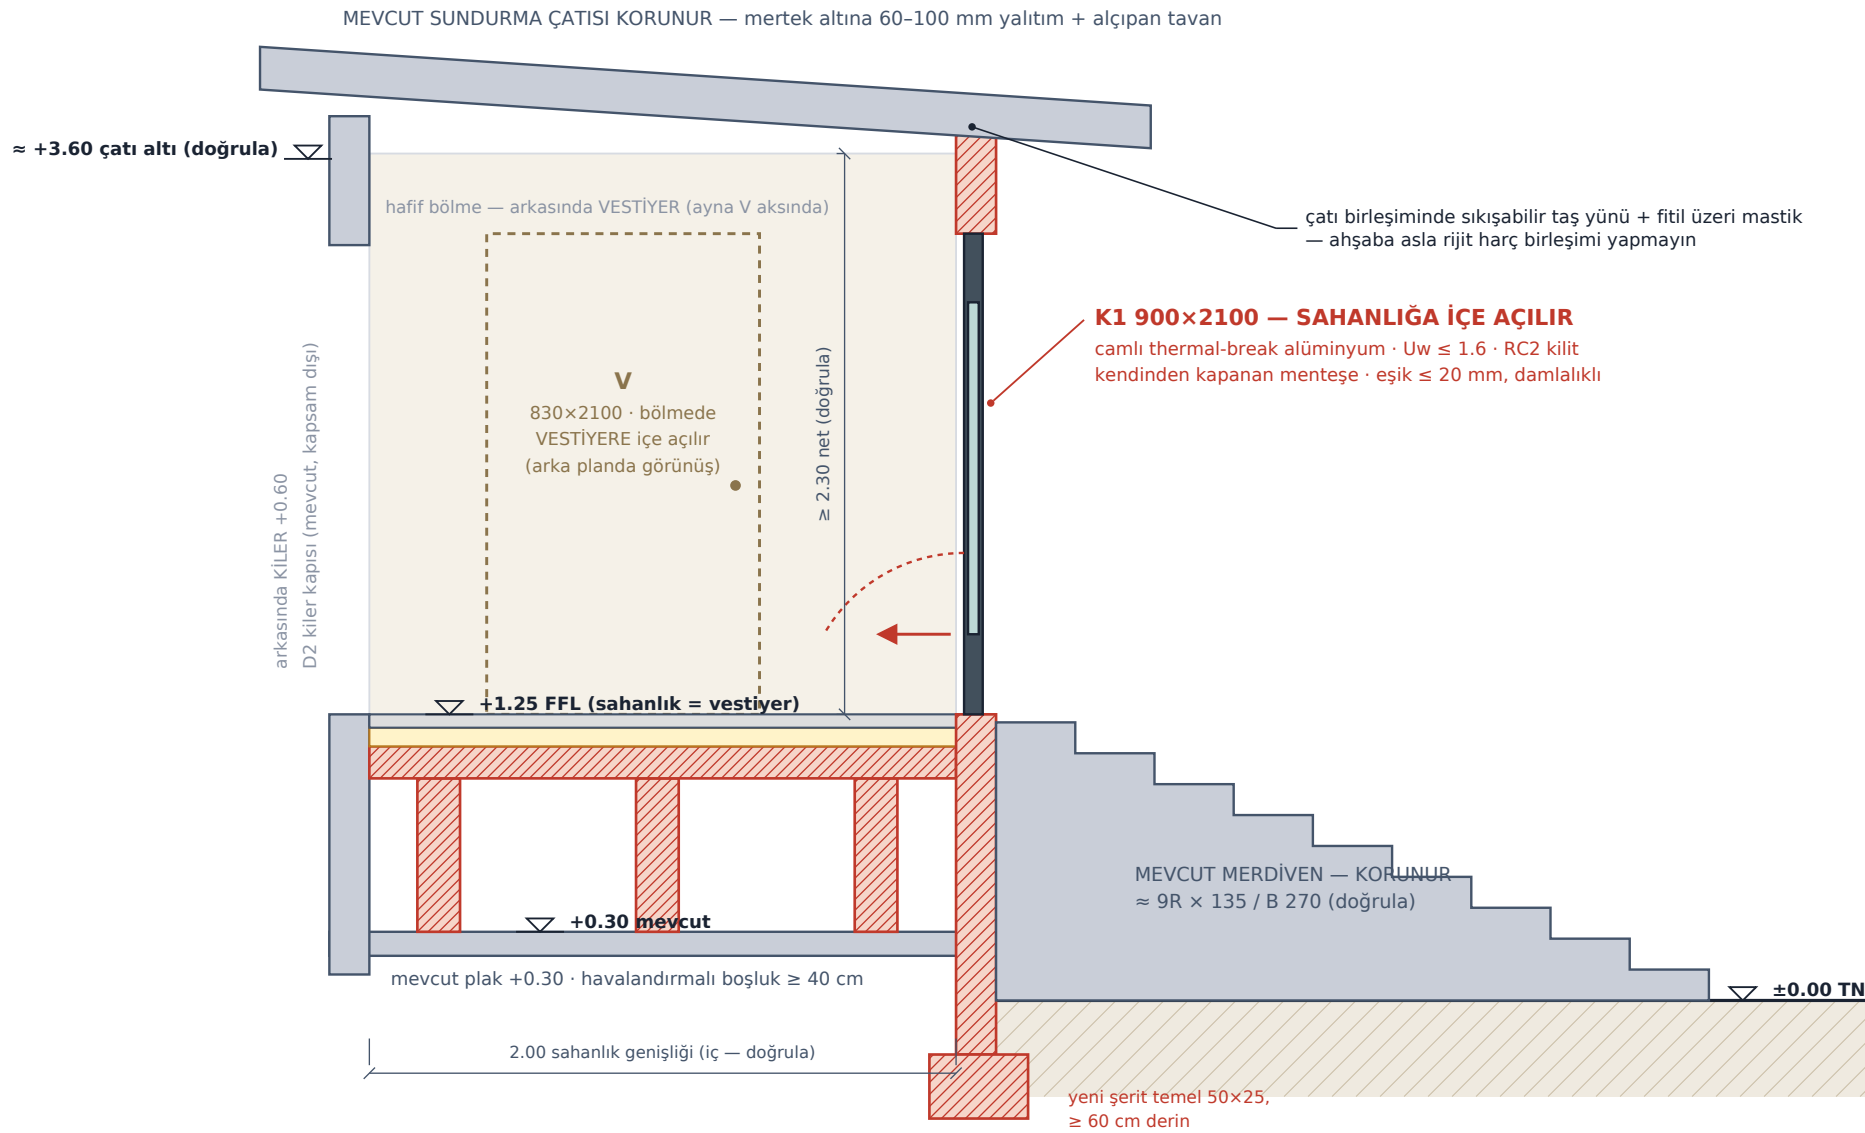

B-B KESİTİ · ÖLÇEK ≈ 1:26 @ A3 · sahanlık boyunca kuzeye bakış — K1 kesitte, V bölmede görünüşte

KAPI KARARLARI: KESİN CEVAP

- 1 Merdiveni olduğu yerde bırakın.**
İleri/geri taşımak sağlam bir betonarme kolu yıkıp yeniden dökmek demektir; işlevsel kazanç sıfır. Gerekçesiz.
- 2 K1 SAHANLIĞA İÇE açılır — asla merdiven üzerine dışa değil.**
Dışa açılan kanat, kapıyı açan kişiyi merdiven boşluğuna iter ve aşağıdan çıkana çarpar — klasik düşme senaryosu. İçe açılım herkesi düz zeminde tutar; kendinden kapanan menteşe rüzgârda çarpmayı keser.
- 3 K1 menteşesi KUZEY kasada.**
Açık kanat sahanlığın kuzey duvarına (bölmeye) yaslanır; güneydeki ev kapısına ve geçişe engel olmaz. V batıya kaydırıldığı için kanatlar çakışmaz.
- 4 V VESTİYERE İÇE açılır — menteşe BATI kasada.**
Sahanlık dar (1400*): V sahanlığa açılmaz. Kanat W1 yan paneline yaslanır ve giriş aksını (kapı → ayna) boş bırakır. İki kapı aynı anda açılrsa da kanatlar farklı hacimlerde kalır — çarpışma senaryosu yoktur.
- 5 Ucuz güvenlik eklerini yapın.**
Kapıya kadar sürekli küpeşte, sahanlıkta sensörlü aydınlatma, kontrast kaymaz basamak burunları; K1’de kendinden kapanan menteşe zaten şartnamede.

KAPI ŞARTNAMESİ — K1 · V


- K1 — 900 × 2100 mm camlı, ısı yalıtımlı (thermal-break) alüminyum tek kanat; $U_w \leq 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$; RC2 kilit; kendinden kapanan menteşe; eşik $\leq 20 \text{ mm}$, damlalıklı; sahanlık kapıdan %1-1.5 dışa eğimli.
- V — 830 × 2100 mm (Faz 4.2 rev.) ahşap iç kapı, bölmede, batı kasadan 620 mm; menteşe DOĞU kasada, vestiyere 88-90° içe açılır; $U_d \leq 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$; eşiksiz geçiş (iki taraf +1.25). (Faz 4.1: 930 kanat hiçbir menteşede açılmıyordu.)
- Eski kodlar: D3 → K1 (resmî ad); önceki doğu kapısı D1 → İPTAL, boşluk örülür.
- K1 cephe görünümünü değiştirir — DP dosyasına eklenir (s.09); renk ve stil mevcut doğramayla uyumlu.
- İmalat öncesi yerinde ölçü zorunludur — kapılar dahil hiçbir imalat plan ölçüsüyle sipariş edilmez. *Sahanlık 1400 VARSAYIM.

A-A Kesiti, Duvar ve Döşeme Katmanları

Vestiyerden enine kesit: her katman nedir — ve döşemeyi ≈ 0.9 m yükseltmenin iki yolu

03 · ÇİZİMLER

SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B

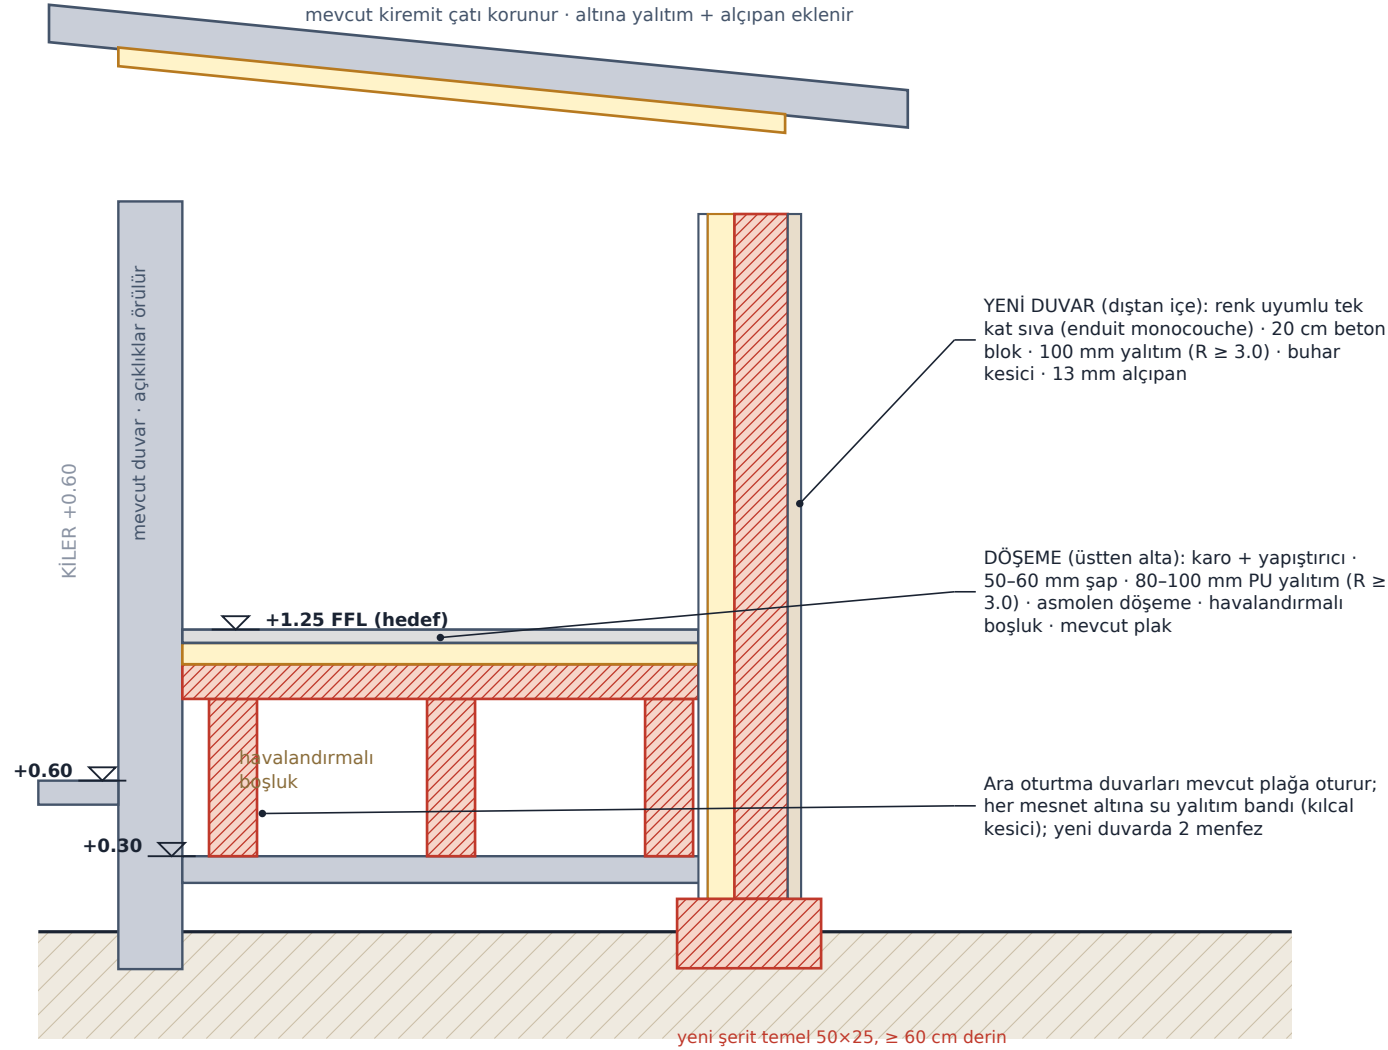

A-A KESİTİ · $\approx 1:25$ @ A3 · kuzeye bakış

DÖŞEME YÜKSELTME: İKİ UYGULANABİLİR SİSTEM

SEÇENEK A — Ara oturtma duvarlı asmolen

ÖNERİLEN · Fransa'nın standart yöntemi (poutrelles-hourdis)

Nasıl

Mevcut plak üzerine 3 alçak blok duvar örün, prekast kirişleri + dolgu blokları serin, ince tesviye betonu dökün, sonra yalıtım + şap + karo. Altta havalandırmalı boşluk (≥ 40 cm) kalır.

Neden kazanır

Oturma riski yok, mevcut plağa hafif yük, döşeme kuru kalır (havalandırmalı), iki kişiyle tamamen kendin-yap; malzeme her Fransız yapı marketinde ($\approx €55-75/m^2$).

Dikkat

Kirişleri açıklığa göre kestirin (≈ 2.0 m — en küçük standart kesit yeterli); yeni duvarda 2 havalandırma menfezi bırakın; her mesnet altına su yalıtım bandı.

KARAR: mevcut plak sağlam olduğu sürece Seçenek A. 8 m² için malzeme $\approx €450-700$.

SEÇENEK B — Sıkıştırılmış dolgu + plak

KABUL EDİLEBİLİR · yalnız disiplinli sıkıştırmayla

Nasıl

Boşluğu kırmataşla (0/31.5) 20 cm tabakalar hâlinde plaka kompaktörle sıkıştırarak doldurun, kumla tesviye edin, PE folyo + 100 mm PU yalıtım serin, 10-12 cm hasırlı plak dökün, karo kaplayın.

Neden düşünülür

Kavramsal olarak daha basit, prekast sipariş yok, malzeme biraz daha ucuz ($\approx €45-60/m^2$), masif his.

Dikkat

≈ 5.5 m³ dolguyu el arabasıyla taşıyıp sıkıştırmak gerekir; kötü sıkıştırma = 1-2 yılda çatlayan, oturan döşeme; zemine ≈ 11 ton ek yük — plağın taşıdığını doğrulayın ya da plağı kırıp tabandan doldurun.

KARAR: kiralık kompaktörle titiz bir kendin-yapçı için uygulanabilir; A daha güvenli.

Her iki seçenekte de: döşeme folyosunu duvar su yalıtım bandına bindirin, döşeme çevre kenarını yalıtın (ısı köprüsü) ve karoyu sahanlık ile vestiyerde AYNI +1.25 hedef kotunda bitirin — V geçişinde eşik yok, tek eşik K1'de (≤ 20 mm). Sahanlık-vestiyer bölmesi ısıtılan-ısıtılan arasındır: ısı yalıtımı gerekmez, ses için 45 mm mineral yün önerilir. Hedef yalıtım: duvar $R \geq 3.0$, döşeme $R \geq 3.0$, tavan $R \geq 4.5$ m²K/W — Fransız "élément par élément" renovasyon minimumlarının üzerinde (güncel yönetmelik değerlerini doğrulayın).

Cephe Görünüşü — Önce / Sonra

Dışarıdan görünen tek değişiklik: açık göz, yeni kapılı sıvalı duvara dönüşür

03 · ÇİZİMLER

SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B

DIŞ MALZEMELER VE SU / HAVA DETAYLARI

YENİ DUVAR

20 cm boşluklu beton blok (parpaing), M10 harç; her 2 sırada bir mevcut duvara paslanmaz bağlantı ankrajı (epoksi dübelli); üstte 2×10 mm donatılı hatıl.

SIVA

Tek kat dış cephe sıvası "enduit monocouche" (ör. Weberpral M veya ParexLanko), mevcut krem cepheyle renk eşleştirmeli — markete numune parça götürün; doku "gratté fin" (ince taraklı). ABF bölgesinde ton dayatılabilir (s.09).

NEM KONTROLÜ

Temel üstünde, dış zeminin +0.15 üzerinde bitümlü su yalıtım bandı (arase étanche — kılcal kesici); sıva zeminden 10 cm yukarıda profille biter; duvar dibine çakıl şerit; oluğun suyu yeni duvardan uzağa attığını kontrol edin.

ÇATI BİRLEŞİMİ

Yeni duvarın üstü mevcut çatı altıyla buluşur: sıkışabilir taş yünüyle doldurun, iki yüzü fitil üzeri mastikle kapatın — ahşaba rijit harç birleşimi YAPMAYIN (hareket).

PENCERENİN KAPATILMASI


Kasa ve parmaklığı sökün, dişli blok örgüyle doldurun, iç yüzeyi yalıtın, dış yüzü uyumlu sıvayın. İyi yapılırsa dışarıdan görünmez — yine de DP'de cephe değişikliği olarak beyan edilir.

GÜN IŞIĞI (CAM BANT İPTAL)

Önceki revizyonlardaki cam bant İPTAL EDİLDİ (mal sahibi kararı, Tem 2026) — doğu duvar dolu örülür: daha iyi yalıtım, mahremiyet ve mobilya için kesintisiz sabitleme duvarı. Gün ışığı K1 kapısının camlı kanadından girer.



MEVCUT · giriş cephesi · ≈ 1:60

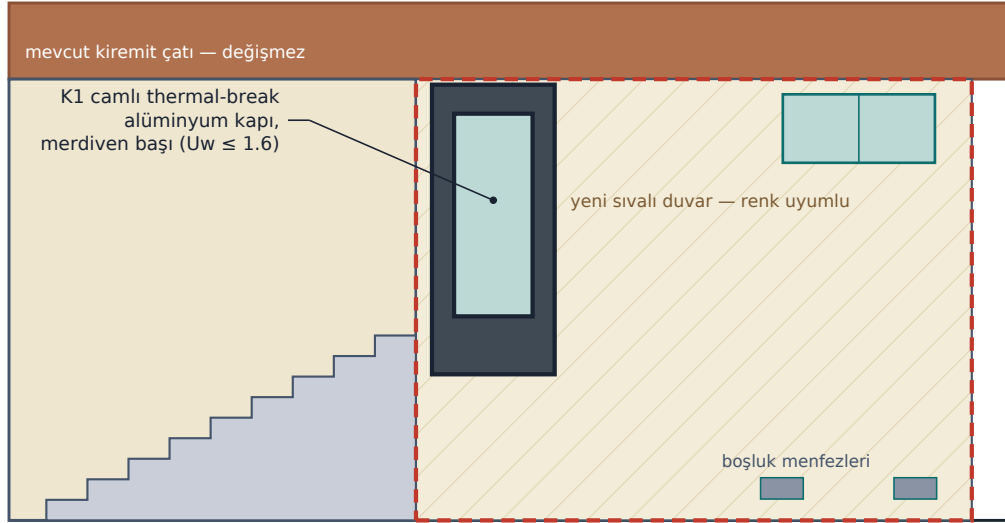

ÖNERİ · giriş cephesi · ≈ 1:60

BEYAN EDİLEN CEPHE DEĞİŞİKLİKLERİ — DP4 ÇİZİMİNİN TEMELİ

- Açık göz, renk uyumlu sıvalı kâgir duvarla kapatılır
- Yeni rüzgârlık kapısı K1 (camlı alüminyum) merdiven başında
- Parmaklıklı pencere sökülür, açıklık örülüp sıvanır
- Döşeme altı boşluk için 2 alçak kot havalandırma menfezi

İş Sırası — Kendin-Yap İçin Uygulama Planı

Sıkı sırayla on dört adım

04 · UYGULAMA

SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B

1 Ölçü ve aplikasyon

Gözü, kotları (+0.30 / hedef +1.25), çatı altı yüksekliğini, sahanlık derinliğini (varsayım 1400) yeniden ölçün; duvar ve bölme akslarını işaretleyin; DP için fotoğraflayın.

2 Önce izin

Déclaration Préalable'ı (ön izin bildirimi) verin ve onayı BEKLEYİN (s.09). Şantiye panosunu asın. Onaydan önce taşıyıcı iş yok.

3 Boşalt ve koru

Konteynerleri, römorku, çim biçme makinesini taşıyın; CCTV kamera ve kablolarını alın; merdiveni levhayla koruyun; kuru malzeme alanı kurun.

4 Temeller

Yeni duvar hattında 40 cm genişlik, $\geq$ 60 cm derinlik (don sınırı) hendek kazın; 4×10 mm donatıyla C25/30 şerit temel 50×25 dökün; 5–7 gün kür bekleyin.

5 Su basman + yalıtım bandı

Blok örgüyü plak mesnet kotuna kadar çıkın; tüm yeni duvarlarda dış zeminin +0.15 üzerinde ve ara oturtma duvarlarında bitümlü su yalıtım bandı serin.

6 Ara oturtma duvarları

Mevcut +0.30 plak üzerine $\leq$ 1.0 m aralıkla 3 alçak blok duvar (Seçenek A); üstler giriş alt kotuna terazide; menfezlere 2 hava yolu bırakın.

7 Döşeme

Prekast giriş + asmolen dolgu blok serin, hasır + 4–5 cm tesviye betonu dökün; ya da Seçenek B dolgu-plak uygulayın (s.06). Yüklemeden önce kür.

8 Çevre duvarları

Yeni dış duvarları çatı altına kadar örün; hatılı dökün; K1 kasa ankrajlarını imalata alın (CAM BANT İPTAL — boşluk bırakılmaz). Eski taslaktaki doğu kapı boşluğu AÇILMAZ — duvar dolu örülür.

9 Pencereyi kapat

Kasa ve parmaklığı sökün; dişli blok örgüyle doldurun; içten yalıtın; dış yüzü sıvaya hazır bırakın.

10 Çatı birleşimi ve elektrik

Duvar/çatı derzini doldurup mastikleyin; elektrik: 2 ikili priz, sensörlü tavan armatürü, mobilya için 24 V LED beslemesi, kamerayı taşıyın (NF C 15-100: kaçak akım korumalı devreler).

11 Yalıt, kapla, bölmeyi kur

Duvar: 100 mm yalıtım + buhar kesici + 13 mm alçıpan. Tavan: mertek arası/altı 60–100 mm + levha. Döşeme: 80–100 mm PU + şap. Sahanlık-vestiyer bölmesi: DC50 karkas + çift kat BA13 + 45 mm yün.

12 Dış sıva

Yeni duvar + pencere dolgusuna renk uyumlu tek kat sıva (monocouche), ince taraklı doku; zeminden 10 cm yukarıda başlangıç profili.

13 Kapılar, kaplama, boya

K1'i takın (sahanlığa içe açılır, kendinden kapanan menteşe); V iç kapısını bölmeye takın (vestiyere içe, menteşe batı); karo iki hacimde AYNI +1.25 kotunda, R10 kaymaz; astar + boya.

14 Mobilya ve teslim

W1 (2 modül), B1 bank + M1 ayna ünitesi + ayakkabı kulesini kurun (s.10–11); LED'leri bağlayın; silikon derzleri çekin; belediyeye DAACT (iş bitim beyanı) verin.

ŞANTIYE GÜVENLİĞİ — KENDİN-YAP İÇİN PAZARLIKSIZ

Hendek kazarken mevcut merdiven ve sundurma temellerinin altını asla boşaltmayın — $\geq$ 40 cm uzak durun ya da kısa anolarla askıya alın. Çatı ahşabından askı/destek almayın. Asmolen giriş taşımada en az iki kişi. Blok keserken toz maskesi + gözlük; harç için eldiven (çimento yanığı). Doğaçlama yerine kiralayın: plaka kompaktör, taş kesme makinesi, lazer terazi. İş sırasında mevcut duvarlarda çatlak görürseniz — durun ve bir usta/mühendise danışın.

BU PROJE NEDEN DÉCLARATION PRÉALABLE (ÖN İZİN BİLDİRİMİ) GEREKTİRİR

Üç bağımsız gerekçe var; herhangi biri tek başına yeterli: (1) kapalı gözün kapatılması yeni "surface de plancher" (inşaat alanı) yaratır — 5–20 m² için (PLU kentsel bölgesinde 40 m²'ye kadar) DP gerekir, tam ruhsat (permis de construire) gerekmez; (2) her cephe değişikliği — yeni duvar, yeni kapı ve kapatılan pencere sayılır; (3) koruma "abords" çevresindeki işler boyuttan bağımsız izne tabidir. Tek bir DP dosyası hepsini kapsar. Ev toplamı 150 m²'yi aşsa da DP geçerlidir (150 m² mimar kuralı permis projeleri içindir).

SÜREÇ, BAŞTAN SONA

1 Bölgeyi öğrenin (ücretsiz; 1 ziyaret / e-posta)

Orange Belediyesi İmar Servisi'ne (Service Urbanisme) sorun: parselin PLU bölgesi ve "abords des Monuments Historiques" / koruma çevresi içinde olup olmadığı (Orange'ın Roma tiyatrosu ve takı geniş koruma yarıçapları doğurur). Bu, siva renk kurallarını ve ABF (Fransa Anıtlar Mimarı) inceleme süresini belirler.

2 DP dosyasını hazırlayın (Cerfa n°13703)

DP1 konum planı · DP2 vaziyet planı (plan de masse) · DP3 kesit · DP4 önce/sonra cepheler · DP5 çatı planı (dokunulursa) · DP6/DP7/DP8 fotomontaj + yakın-uzak fotoğraflar. Bu dosyanın çizimleri (s.04–07) doğrudan DP3/DP4/DP6'ya uyarlanacak biçimde hazırlandı.

3 Verin ve panoyu asın

Belediyenin dijital gişesinden ya da kâğıt 2–4 kopya verin. Süre: standart 1 ay, ABF çevresinde 2 ay (ABF sessiz kalırsa = onay). Sarı şantiye panosunu asın; üçüncü kişilerin ilk aşımından itibaren 2 ay itiraz hakkı var — inşaata başlamadan bu süreyi beklemek en güvenlisi.

4 İnşa edin, sonra bitirmeyi beyan edin

İş onaylı dosyaya uymalı. Bitince DAACT (iş bitim ve uygunluk beyanı) verin. Mülkün vergiye esas alanı da güncellenir (DP verisi bunu otomatik besler).

DP'YE BAĞLI PARA VE KURALLAR

Taxe d'aménagement (imar vergisi, tek sefer)

2026 baz değeri Île-de-France dışı €892/m² × ≈ 8 m² × (belediye %1–5 + departman ≤ %2.5) ≈ €360–540; onaydan ≈ 12 ay sonra tahakkuk.

Emlak vergisi

Ek 8 m² yaşam alanı taxe foncière'i biraz artırır — otomatik, mütevazı.

Isı kuralları (RT existant, eleman bazında)

Yenilenen/eklenen elemanlar minimum R değerlerini karşılamalı; tasarım duvar & döşeme R ≥ 3.0, tavan R ≥ 4.5, kapı Ud ≤ 1.4 hedefliyor — minimumların üzerinde. Yalıtım faturalarını kanıt olarak saklayın.

Sigorta

Konut sigortacısına bildirin: alan artışı + inşaat. Kendin-yap için dommage-ouvrage zorunlu değil; yine de işi beyan edin.

Sınırlar ve komşular

Komşuya 1.90 m'den yakın yeni doğrudan bakış açıklığı yok; camlı K1 kendi araç yolunuza bakar — uygun. Yeni duvarın kendi parselinizde kaldığını doğrulayın.

⚠ ORANGE = BÜYÜK MİRAS KENTİ

Antik Tiyatro (UNESCO) ve Zafer Takı geniş koruma çevreleri doğurur. Parsel içindeyse DP'yi ABF inceler (~1 ay ekler); siva tonu, kapı rengi ve detay dayatılabilir. Rutindir — buradaki tasarım ilk seferde geçmek için zaten uyumlu siva ve sade kapı kullanıyor.

GERÇEKÇİ TAKVİM (EYLÜLDE VERİN → BAHARDA KULLANIN)

DP dosyası hazırlığı	İnceleme 1-2 ay	İtiraz süresi 2 ay (çakışır)	Kaba inşaat 3-4 hf	İç imalat + mobilya 2-3 hf	≈ 5–6 ay uçtan uca; mobilya üretimi paralel yürür
----------------------	-----------------	------------------------------	--------------------	----------------------------	--

DP DOSYASI — PARÇA PARÇA (CERFA N°13703)

- DP1 — konum planı (kadaströ / IGN paftası)
- DP2 — vaziyet planı (plan de masse), yeni duvar ölçülendirilmiş
- DP3 — mevcut ve yeni kotları gösteren kesit (s.05–06 uyarlanır)
- DP4 — önce / sonra cepheler (s.07 uyarlanır)
- DP6–DP8 — fotomontaj + yakın ve uzak fotoğraflar (dosya fotoğrafları)
- İnceleme süresi sonunda sessizlik = zımni onay — teslim belgesini saklayın


İmalat Çizimi 1 — Yerleşim Planı ve Gardirop Duvarı W1

Rev B mobilya yerleşimi (sahanlık + vestiyer) ve W1 görünüşü: iki çift kapaklı gardirop modülü

06 · MOBİLYA

SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B


YERLEŞİM PLANI — MOBİLYA DÜZENİ (REV B)

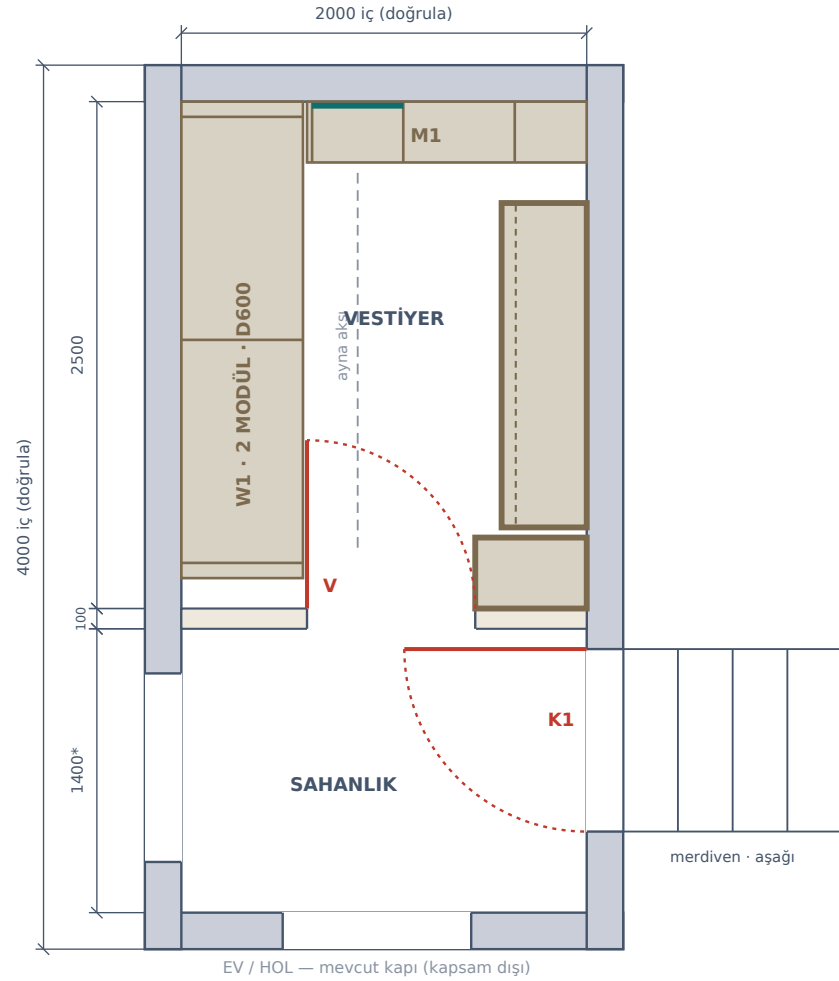

YERLEŞİM PLANI (REV B) · ≈ 1:37 @ A3

W1 ile B1 kapakları arası net koridor ≈ 980 mm · *sahanlık derinliği VARSAYIM

W1 GÖRÜNÜŞÜ — GARDİROP DUVARI (BATIYA BAKIŞ)

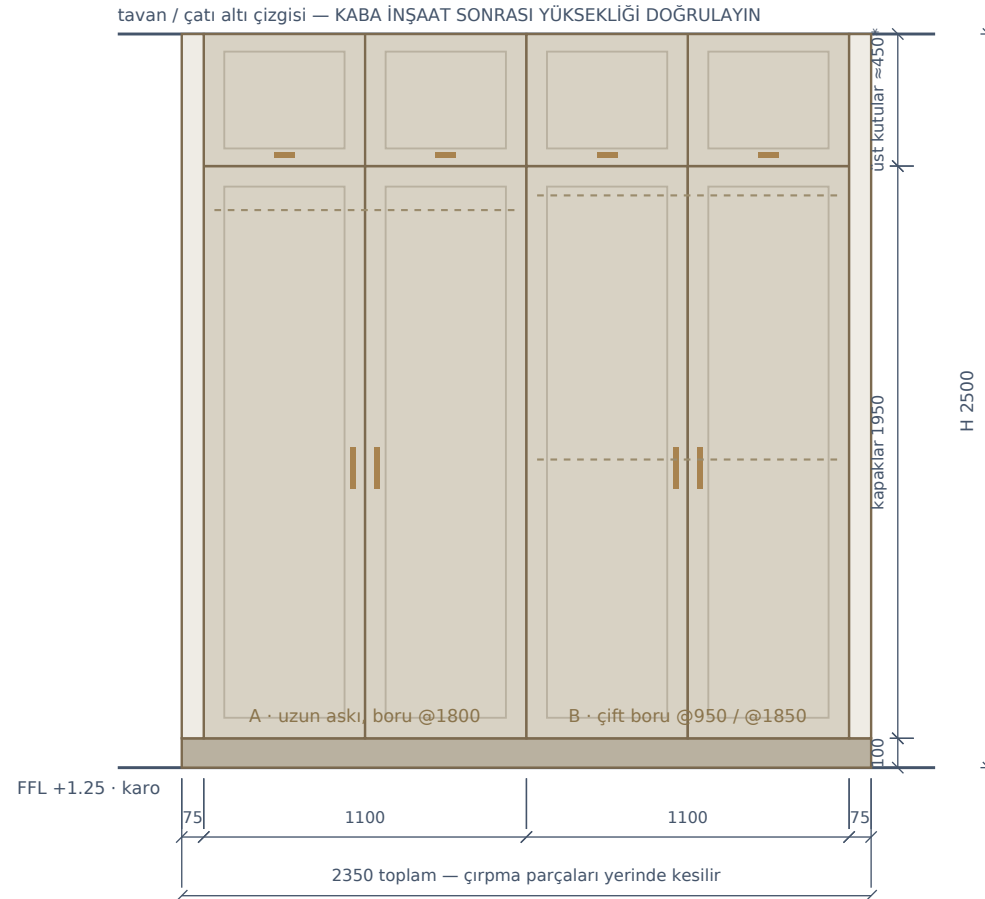

W1 GÖRÜNÜŞÜ · ≈ 1:26 @ A3 — 2 çift kapaklı modül 1100 · kapak 1950 + üst kutu · derinlik 600

W1 NOTLARI (REV B)

- Rev B: batı duvar 2500 → 2 modül × 1100, toplam koşu 2350 + iki uçta 75 çırpma.
- Gövde 18 mm neme dayanıklı MDF; kapaklar 22 mm MDF shaker, PU lake greige (≈ RAL 7044).
- *Üst kutular tolerans bölgesidir: bitmiş çatı altı düşük gelirse üst kutuları kısaltın — kapakları asla.
- Derinlik 600 dış (≈ 560 iç) — standart askılık sığar.
- Güney yan panele V kapı kanadı yaslanır — çizilmeye dayanıklı lake + keçeli stoper; kuzey yan panel M1 ünitesine dayanaktır (s.11).
- Baza altında ayarlı ayaklar; arka bağlantı raylarını dübelli ankrajla duvara sabitleyin — yalnız alçıpana değil.
- Yerinde doğrulayın: duvar boyları, şakül (±15 mm çırpmayla alınır), priz / LED besleme yerleri — sipariş öncesi.

SİPARİŞ KURALI — KESİN ÖLÇÜLER YALNIZ KABA İNŞAAT BİTİNCE.

Bu çizimler tasarım niyetini sabitler. İmalat kesim listesi ancak oda örülüp kaplandıktan ve yeniden ölçüldükten sonra çıkarılır — imalat öncesi yerinde ölçü zorunludur.


İmalat Çizimi 2 — Bank Duvarı B1, Ayna Ünitesi M1 ve Hirdavat

B1: bank + 2 çekmece + 6 kanca + 3 niş · M1: gömme ayna + kule + raf · düşey kesitler · hirdavat (Rev B)


06 · MOBİLYA

SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B


B1 GÖRÜNÜŞÜ — DOĞU DUVARI (DOĞUYA BAKIŞ; SOLDA KUZEY)

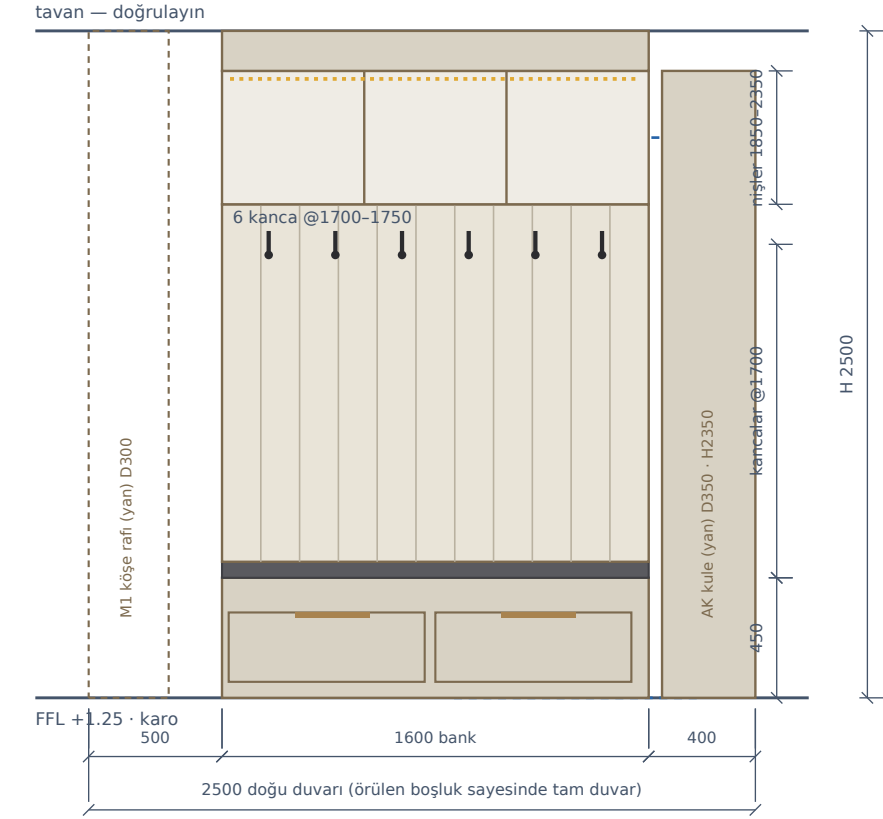

M1 Ayna Ünitesi — KUZEY DUVAR

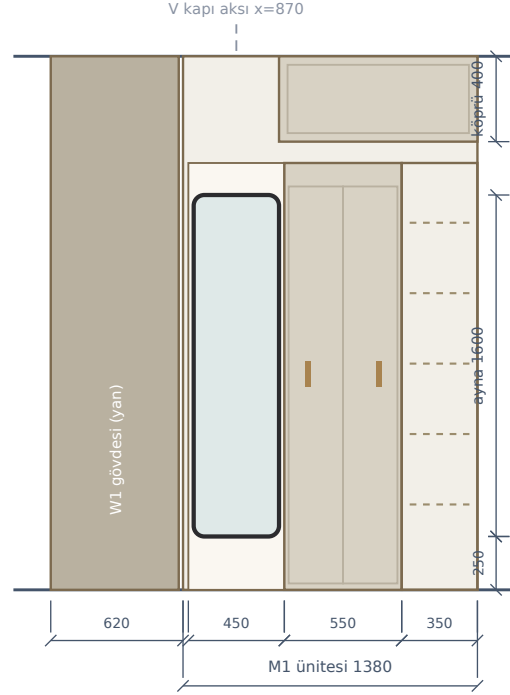

DÜŞEY KESİTLER

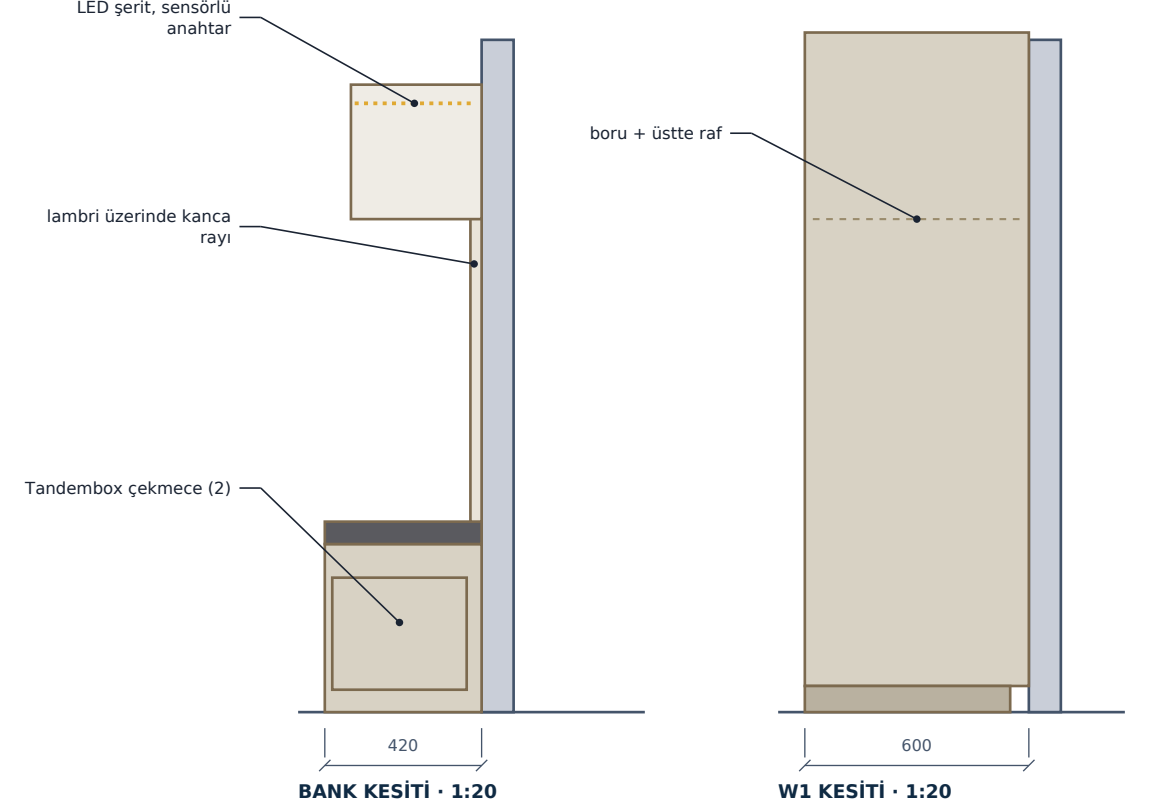

M1 GÖRÜNÜŞÜ · ≈ 1:35 @ A3

gömme ayna V aksında — giren tam karşısında görür

HIRDAVAT VE MALZEME (REV B ADETLERİ)

Bileşen	Şartname
Gövde	18 mm neme dayanıklı MDF, kenar bantlı; arkalıklar 8 mm kınışlı
Kapak ve önler	22 mm MDF shaker, PU lake greige ≈ RAL 7044, mat
Menteşe	Blum Clip-top 110° yavaş kapanır — boy kapakta 3, üst kutuda 2 · yalnız W1, toplam 20 (AK + M1 kulesi SÜRME — Faz 4.1)
Çekmece	Blum Tandembox, tam açılım, yavaş kapanır, 30 kg — B1 bank 2 takım
Aydınlatma	24 V 3000 K LED şerit 2.0 m (B1 niş bandı) + driver + sensörlü anahtar
Baza ve ayak	100 mm baza, ayarlı ayak (14 adet); klipsli, sökülebilir
Çırpma	Duvar ve tavanda 50-75 mm çırpma / pah parçası, yerinde kesim
Kulp ve kanca	Pirinç veya mat siyah kulp 10 adet · mat siyah çift kanca 6 adet
Ayna	450 × 1600, siyah metal çerçeve, M1 nişine gömme — 1 adet

İMALAT KURALLARI — SİPARİŞTEN ÖNCE OKUYUN

- Kesim ölçüler yalnız kaba inşaat bitince — yeniden ölçün, sonra kesim listesini çıkarın (imalat öncesi yerinde ölçü zorunludur).
- Duvarlar şakülünde olmayacak: çırpma ±15 mm alır; mobilyayı asla kâgir nominal ölçüye sıfır sipariş etmeyin.
- V kanadı W1 güney yan paneline yaslanır: o yüzeye çizilmeye dayanıklı lake + keçeli stoper; giriş aksını (kapı → ayna) boş tutun.
- Kesilen tüm MDF kenarlarını yalıtın (PU lake veya kenar bandı) — burası ıslak ayakkabı odası.
- LED: 24 V beslemeyi duvar kaplanmadan çekin (s.08, adım 10); driver B1 üst dolgusunda erişilebilir.
- TR rotasıysa (s.13): panelleri modül bazında numaralandırıp (W1-A/B, B1, M1, AK) montaj şemasıyla paketleyin.

Maliyet Planı — Kaba İnşaat ve Mobilya

Rev B mertebe bütçesi (kalemler data/quantities.json metrajıyla uyumlu) — taahhütten önce tekliflerle netleştirin

KABA İNŞAAT (≈ 8 M² · SAHANLIK + VESTİYER) — MERTEBE

Kalem	Ustaya yaptırma	Kendin-yap (malzeme)
Hafriyat ve şerit temeller	€900–1,400	€400–550
Kâgir duvarlar + dış sıva (eski kapı boşluğunun örülmesi dahil)	€2,200–3,400	€1,100–1,500
Döşeme yükseltme — Seçenek A (asmolen)	€1,000–1,600	€450–700
Pencere / menfez dolgusu	€400–700	€150–250
Sahanlık-vestiyer bölmesi (DC50 + çift kat BA13 + yün)	€400–700	€150–250
Çatı birleşimi + tavan yalıtımı ve levha	€700–1,100	€300–450
Elektrik (NF C 15-100, kamera taşıma dahil)	€600–900	€250–400
Kapı K1 — camlı alüminyum (malz. + montaj / yalnız malz.)	€900–1,600	€700–1,200
Kapı V — ahşap iç kapı	€400–700	€250–450
Cam bant — İPTAL (mal sahibi kararı, Faz 4.2)	€0	€0
Karo + boya	€600–1,100	€250–400
TOPLAM	≈ €8,400–13,700	≈ €4,200–6,500 kapılar dahil

Kapılar (K1 + V) hariç kendin-yap malzemesi ≈ €3,250–4,850 — s.02’deki €3.3–4.9k başlığıyla uyumlu. Metraj Rev B (data/quantities.json): ≈ 330 blok parpaing, 28 torba harç, bölme BA13 13 m². Mevcut plağın sağlam olduğu varsayılır; hangi rotayı seçerseniz seçin %10–15 beklenmedik giderler payı ekleyin.

MOBİLYA — AYNI REV B DONANIMI (W1 + B1 + M1 + KULE) İÇİN ÜÇ ROTA

Rota	Teslim maliyeti	Ne alırsınız / dikkat
FR butik marangoz, montajlı	€9,000–14,000	Lake MDF ≈ €1,300–1,900/mtül boy dolap; tam garanti; sıfır lojistik
FR yarı-özel (IKEA PAX/BESTÅ + özel kapak)	€3,500–6,000	Orta yol; hızlı; kendin-yap dostu; görünüm referansa yakın, birebir değil
TR özel demonte (CNC kavela+kam), sevkiyatlı	€5,000–7,500	Fabrika çıkışı €2,800–4,800 + navlun €900–1,500 + %20 ithalat KDV + gümrükleme €150–300 (+ opsiyonel yerel montajcı €500–900)

ÖNERİ

TR rotası referans görünüm için FR butikten ≈ %40–45 ucuz — yalnız güvenilir atölyeyle ve kaba inşaat sonrası alınan kesin ölçüyle seçin. Aksi hâlde FR yarı-özel pragmatik orta yoldur.

TOPLU SENARYOLAR — KABA İNŞAAT + KAPILAR + MOBİLYA (TAXE D’AMÉNAGEMENT €360-540 HARIÇ, S.09)

≈ €7.7-12.5k

Kendin-yap + FR yarı-özel

En ucuz toplam — görünüm yaklaşık

≈ €9.2-14k

Kendin-yap + TR özel

Referans görünüm en düşük maliyetle — en çok mal sahibi emeği

≈ €13.4-21.2k

Usta + TR özel

Referans görünüm için en az mal sahibi emeği

≈ €17.4-27.7k

Usta + FR butik

Anahtar teslim, tam garanti — premium fiyat

BÜTÇE DİSİPLİNİ — ÜÇ KURAL

1 · Kaba inşaat yokken mobilya siparişi vermeyin — ölçü hatası TR rotasının 1 numaralı maliyet riskidir. 2 · Kendiniz yapacak olsanız bile iki usta teklifi alın: üstlendiğiniz riski fiyatlarlar. 3 · K1 ve karo seçimini DP dosyasından önce kesinleştirin — onaydan sonra cephe değişikliği yeni DP demektir.

GÜZERGÂH, KAPIDAN KAPIYA

AB-TR GÜMRÜK BİRLİĞİ: A.TR İLE MOBİLYADA %0 GÜMRÜK

%20 FRANSIZ İTHALAT KDV'SİNİ BÜTÇELEYİN — OPSİYONEL DEĞİL



GÜMRÜK MEKANİĞİ — GERÇEKTE NE OLUR

- AB-Türkiye Gümrük Birliği: mobilya dahil sanayi ürünleri A.TR dolaşım belgesiyle gümrüksüz girer. A.TR yok = tarife riski — sözleşme şartı yapın.
- %20 Fransız ithalat KDV'si ithalatta mal + navlun değeri üzerinden doğar; forwarder öder ve gümrükleme ücretiyle (≈ €150-300) birlikte yansıtır.
- Belgeler: ticari fatura · çeki listesi · CMR taşıma senedi · A.TR. Kopyaları saklayın; KDV makbuzu yeniden satış değeri ve sigorta için kanıttır.
- DAP (Delivered At Place) + gümrükleme dahil satın alın — tek fiyat, tek sorumlu taraf, sınırda sürpriz yok.
- Kendi kullanımı için ithalat yapan özel kişi: ticari operatör yükümlülüklerinin (ör. EUDR) genelde dışındadır — forwarder'dan yazılı teyit alın.

AMBALAJ ŞARTNAMESİ — SÖZLEŞMEYE KOYUN

- Demonte CNC panel, kavela + kam bağlantı — yapıştırılmalı çerçeve yok; her panel numaralı (W1-A1, B1-D2, M1-K1, AK-...), montaj şeması PDF ile eşleşir.
- Kenarlar: tüm lake önlerde masif kenar koruyucu; paneller yüz yüze, köpük ara katmanlı; nem bariyeri sargı; ihracat paleti veya sandığı.
- Tek panel ağırlığı iki kişilik güvenli sınırdadır (≈ 40 kg); hırdavat modül bazında poşetli + %5 yedek; menteşe ve raylar orijinal Blum kutusunda.
- Her paleti sarmadan önce ve yüklemekten sonra fotoğraflayın — taşıma hasarı talebinin tek kabul gören kanıtı.
- Sigortayı fabrika çıkış fiyatına değil, KDV + navlun dahil yerine koyma değerine yaptırın.

VARIŞTA — ÜÇ MONTAJ YOLU

KENDİN KUR

€0 ek

Kavela + kam = büyük ölçekte IKEA zorluğu. İki kişi, 2-3 gün, lazer terazi, çırpmada sabır. Kaba inşaatı kendiniz yaptıysanız en iyisi.

TR EKİBİ GELİR

≈ €800-1,500

İki montajcı için uçuş + konaklama, 2 gün. En hızlısı ve ürünü tanıyorlar — ama sorumluluk, sigorta ve eksik listesi önceden yazılı anlaşılmalı.

YEREL MONTAJCI (ÖNERİLEN)

≈ €500-900

Mal gümrükten çıkınca 2 günlük yerel marangoz-montajcı. Dengeli maliyet, Fransızca muhataplık; çırpma ve silikonu da yapar. Önceden ayırtın.

Öneri, Takvim ve Risk Kaydı

Ne yapılacak, hangi sırayla, ne ters gidebilir — ve 3D görsel üretim komutu


09 · KAPANIŞ

SUNDURMA → VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ · ORANGE (84100), VAUCLUSE, FRANSA
TASARIM VE UYGULAMA DOSYASI · TEMMUZ 2026 · REV B

BEŞ SATIRDA ÖNERİ

- Kapat ve yükselt — doğru proje.**
Küçük kapsam, büyük günlük kazanım: çöp gözü yerine sıcak, güvenli, donatılmış giriş (sahanlık + vestiyer). Dürüst bütçe: kendin-yap + TR mobilya ≈ €9.2–14k, anahtar teslim ≈ €17.4–27.7k (s.12).
- Döşeme: Seçenek A (ara oturtma duvarlı asmolen).**
Oturma riski yok, havalandırmalı ve kuru, kendin-yap dostu. Seçenek B ancak kiralık plaka kompaktör ve disiplinle. Hedef bitmiş kot iki hacimde +1.25.
- Kapılar: K1 sahanlığa içe, V vestiyere içe.**
Güvenlik sorusu s.05'te kapandı — aynen öyle yapın: K1 menteşe kuzey + kendinden kapanan; V menteşe batı, kanat W1 yan paneline yaslanır; küpeşte ve sensörlü ışıkla birlikte.
- İzin: önce DP, her zaman.**
Déclaration Préalable'ı verin, incelemeyi (+ gerekiyorsa ABF ayı) ve itiraz süresini bekleyin; taşıyıcı iş ondan sonra. s.09 kontrol listesidir.
- Mobilya: atölye güvenilirse TR özel — ölçü kaba inşaatтан sonra.**
Değilse FR yarı-özel. Oda yokken asla sipariş yok — imalat öncesi yerinde ölçü zorunludur. Lojistik reçetesi s.13'te.

ANA TAKVİM (DP EYLÜLDE)



Oda erken baharda kullanımda — uçtan uca ≈ 5-6 ay; bunun ≈ 3 ayı inşaat değil, evrak bekleme.

RİSK KAYDI

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Ölçü hatası (plandan mobilya siparişi)	Orta	Yüksek	Demir kural: kesim listesi ancak kaba inşaat bitip lazerle ölçülünce (s.10-11)
DP reddi / ABF şart koşar	Düşük-Orta	Orta	Belediyede ön kontrol; uyumlu siva + sade K1 geçmek için tasarlandı
Sahanlık 1400 varsayımı tutmaz	Orta	Orta	Ölçü günü ilk iş; bölme hafif olduğu için hat kaydırmak ucuz — mobilya ölçüleri ondan sonra
Oturma (yalnız Seçenek B döşemede)	Orta	Orta	A'yı tercih edin; B ise: 20 cm tabakalar, kiralık kompaktör, hasırlı plak
Taşıma hasarı (TR rotası)	Orta	Orta	Ambalaj şartnamesi sözleşmede, sarım öncesi fotoğraf, teslim değerine sigorta, hasar CMR'ye yazılır
Bütçe sapması	Orta	Orta	%10-15 pay; iki usta teklifi; cephe seçimlerini (K1, siva tonu) DP'den önce kilitleyin

Dosya sonu · Rev B · Temmuz 2026 — tüm ölçüleri yerinde doğrulayın; DP onaylanmadan bu belge imalat için kullanılamaz.

EK — 3D GÖRSEL ÜRETİM KOMUTU (KOPYALA-YAPIŞTIR)

Bitmiş vestiyeri görmek için herhangi bir görüntü modeline yapıştırın (komut İngilizce bırakılmıştır):

"Photorealistic interior render, compact mudroom 2 m wide × 2.5 m deep entered through a wooden door on the short side; floor-to-ceiling greige shaker wardrobes (two double-door modules) along the entire left wall; on the right wall an upholstered charcoal bench (H 45 cm) over two drawers, panelled wall behind with six black coat hooks at 1.7 m holding beige and navy coats, open niches above with warm 3000 K LED strip lighting and wicker baskets; directly opposite the door a tall black-framed mirror recessed into a greige joinery unit with a cabinet tower and open corner shelves; a slim shoe tower beside the door; a small high strip window on the right wall glowing with daylight; large beige porcelain floor tiles with a woven jute runner, soft warm ambient light, 24 mm lens, eye level, architectural photography style"

İpucu: iki seçenek için birer görsel üretin — piriç mi, mat siyah kulp mu — ve hırdavat siparişinden önce evdekilere oylatın.

SIRADAKİ ÜÇ ADIM

- Gözü ölçün: en, boy, çatı altı yüksekliği, sahanlık derinliği (liste s.03).
- Orange Belediyesi İmar Servisi'ne tek e-posta: PLU bölgesi + parselin ABF durumu.
- DP dosyasını hazırlayıp verin (liste s.09) — süre ancak dosya verilince başlar.
