

Transformation Porche → Vestiaire

Fermer la travée · rehausser d'≈ 0.9 m · sas avec porte K1 + vestiaire aménagé (Rév. B)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Orange (84100) · Vaucluse · France
Juillet 2026 · Rév. B

QUOI ET POURQUOI

La travée couverte, ouverte sur un côté, voisine de l'escalier d'entrée (aujourd'hui : les poubelles, plancher ≈ +0.30 m) est fermée par un mur maçonné isolé, son plancher rehaussé d'≈ 0.9 m (niveau cible +1.25) et le volume divisé par une cloison légère : la nouvelle porte extérieure vitrée K1, en haut de l'escalier, ouvre d'abord sur un SAS de 2.0 × 1.4 m (à gauche la porte existante de la maison) ; la porte V, à droite, mène au VESTIAIRE de 2.0 × 2.5 m — en entrant, on voit le miroir juste en face. Aménagement : penderie 2 modules (W1), banc B1 (2 tiroirs + 6 patères + 3 niches), meuble miroir M1 et tour à chaussures. L'ancienne baie de porte, côté escalier, est murée. Une seule Déclaration Préalable couvre l'ensemble des travaux.

QUATRE DÉCISIONS, AVEC LEURS RÉPONSES

PORTE K1 EN HAUT DE L'ESCALIER (ET PORTE V DU VESTIAIRE)

L'escalier reste. K1 OUVRE SUR LE SAS — jamais vers l'extérieur au-dessus des marches ; paumelles nord, vantail rabattu contre la cloison ; ferme-porte. V ouvre sur le VESTIAIRE (paumelles ouest, butée ~80° sur W1), pas sur le sas étroit — deux vantaux dans deux volumes, aucune collision.

COMMENT REHAUSSER LE PLANCHER

Poutrelles-hourdis sur murets avec vide ventilé (Option A) — la méthode standard française : pas de tassement, sec, faisable en autoconstruction. Remblai compacté + dalle acceptable seulement avec compactage discipliné par couches de 20 cm. Sas et vestiaire finis au MÊME niveau (+1.25) — pas de seuil à V.

AUTORISATIONS

Déclaration Préalable (Cerfa 13703) obligatoire (surface créée + façade modifiée + probable périmètre patrimonial). Instruction 1-2 mois ; attendre les 2 mois de recours des tiers. Orange est une ville à fort patrimoine — attendez-vous à l'avis de l'ABF ; le projet (enduit assorti, K1 sobre) est conçu pour passer.

MOBILIER — FRANCE OU TURQUIE

Fabrication sur mesure en kit depuis la Turquie ≈ €5.0-7.5k livré ; agenceur français €9-14k (≈ 40-45 % moins cher). Union douanière UE-TR (A.TR = 0 % de droits ; TVA import 20 %). Uniquement avec un atelier fiable, cotes APRÈS le gros œuvre. Plan B : semi-mesure FR ≈ €3.5-6k.

CHIFFRES CLÉS (ORDRE DE GRANDEUR)

≈ 8 m²

surface créée : sas ≈ 2.8 + vestiaire ≈ 5.0 m²

≈ +0.9 m

plancher +0.30 → +1.25 cible (sas = vestiaire)

€8.4-13.7k

gros œuvre par artisan (matériaux autoconstr. €4.2-6.5k portes incluses)

€5.0-7.5k

meubler TR livré (agenceur FR €9-14k)


1-2 mois

instruction DP (2 mois si ABF)


€360-540

taxe d'aménagement, une seule fois

LA SEULE MODIFICATION VISIBLE DE L'EXTÉRIEUR

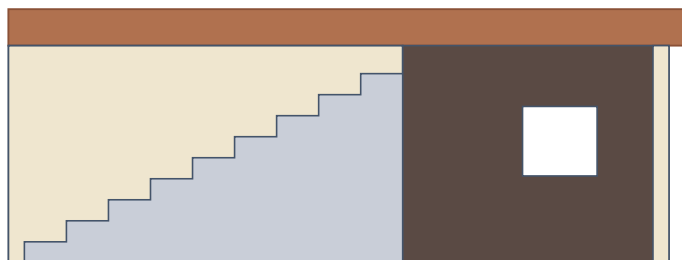

AVANT — travée ouverte (poubelles)

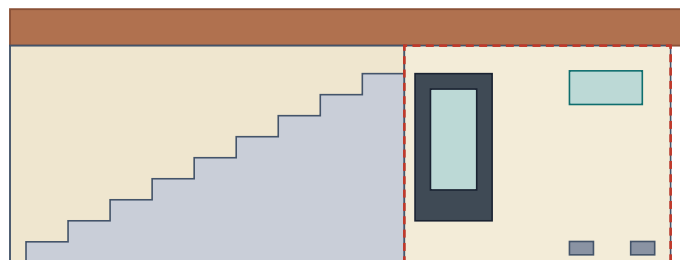

APRÈS — mur enduit + porte vitrée K1 (bande vitrée supprimée)

Transformation Porche → Vestiaire

L'argent, les autorisations et cinq règles qui évitent les ennuis en autoconstruction

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Orange (84100) · Vaucluse · France

Juillet 2026 · Rév. B

TABLEAU DES COÛTS (RÉV. B — À AFFINER PAR DEVIS)

Gros œuvre (≈ 8 m²)	Artisan	Matériaux autoconstr.
Fondations · murs · enduit · fenêtre murée	€3,500-5,500	€1,650-2,300
Plancher (Option A) · cloison · raccord toit · plafond	€2,100-3,400	€900-1,400
Électricité · portes K1 + V · carrelage	€2,800-4,800	€1,650-2,800
TOTAL GROS ŒUVRE	≈ €8.4-13.7k	≈ €4.2-6.5k portes incluses

Filière mobilier (W1 + B1 + M1 + tour)	Livré	Note
Agenceur FR sur mesure, posé	€9-14k	garantie complète, zéro logistique
Semi-mesure FR (PAX + façades)	€3.5-6k	voie médiane pragmatique, aspect proche
Sur mesure TR en kit, expédié	€5.0-7.5k	0 % droits (A.TR) + TVA 20 % ; cotes après gros œuvre

Global : autoconstruction + mobilier TR ≈ €9.2-14k · artisan + agenceur FR ≈ €17.4-27.7k. Ajoutez 10-15 % d'aléas.

PARCOURS D'AUTORISATION — DÉCLARATION PRÉALABLE

- 1 Demander au service urbanisme de la mairie d'Orange : zone PLU + situation aux abords ABF.
- 2 Déposer le dossier de DP (Cerfa 13703) : plans + coupe + façades avant/après + insertion paysagère.
- 3 Instruction 1 mois (2 en secteur ABF ; silence = accord). Afficher le panneau ; attendre les 2 mois de recours des tiers.
- 4 Construire conformément au dossier accordé ; DAACT à l'achèvement. Taxe d'aménagement ≈ €360-540 ensuite.

Sept · dossier DP

Oct-Nov · instruction

délai de recours

gros œuvre 3-4 sem

second œuvre 2-3 sem

≈ 5-6 mois de bout en bout — la moitié en attente administrative. Le mobilier se fabrique en parallèle, posé en dernier.

LES 5 À FAIRE / À ÉVITER DE L'AUTOCONSTRUCTEUR

À FAIRE

- À FAIRE : obtenir par écrit la réponse PLU/ABF avant le dossier de DP.
- À FAIRE : Option A (poutrelles-hourdis ventilé) + arase étanche — plancher toujours sec.
- À FAIRE : carreler sas et vestiaire au MÊME niveau (+1.25) — zéro seuil à V.
- À FAIRE : passer l'électricité (prises, détecteur, LED 24 V) avant le doublage.
- À FAIRE : tout re-mesurer après le gros œuvre, ne commander le mobilier qu'après.

À ÉVITER

- À ÉVITER : démarrer l'ouvrage structurel avant l'accord de DP + délai de recours.
- À ÉVITER : ouvrir K1 vers l'extérieur au-dessus de l'escalier — jamais ; ni V sur le sas étroit.
- À ÉVITER : lier le mur neuf à la charpente au mortier rigide (joint compressible).
- À ÉVITER : commander le mobilier turc sur cotes de plan — relevé sur site uniquement.
- À ÉVITER : omettre les grilles : vide non ventilé = plancher humide.

SI ÇA TOURNE MAL — TROIS RISQUES RÉELS

- L'erreur de cotes tue la filière mobilier TR — règle d'or : relevé laser après le gros œuvre, puis liste de débit et commande.
- L'ABF peut imposer la teinte d'enduit ou la couleur de porte — routine à Orange ; ajustez et redéposez plutôt que de résister.
- Avarie de transport en filière TR — cahier des charges emballage au contrat, photos avant filmage, assurance à la valeur livrée, avaries notées sur la CMR à la livraison.

ENSUITE : ① mesurer la travée et la sous-face ② un e-mail à la mairie (zone + ABF) ③ déposer le dossier de DP.

Tous les détails, dessins et pas-à-pas : Dossier de Conception et d'Exécution A3 (14 pages).
