

Bu rehber, işi bir mimara vermeden kendi kendinize yürütebilmeniz için hazırlandı. Sırayla gidin, her kutuyu işaretleyin. Rev B düzeni: merdiven → K1 (yeni camlı dış kapı) → sahanlık → sağda V kapısı → vestiyer; eski doğu (merdiven tarafı) kapısı örülür. Teknik ayrıntı gerekirse ana dosyaya bakın (A3 paket); sayfa numaraları oraya işaret eder.

1 Önce ölç — 6 ölçü (şeritmetre + telefon kamerası yeter)

- ☐ **Gözün eni ve boyu:** duvardan duvara, iki uçtan da ölçün (duvarlar şaşabilir). Hedef $\approx 2.0 \times 4.0$ m (sahanlık + bölme + vestiyer).
- ☐ **Tavan yüksekliği:** gözün zemininden çatı ahşabının altına. 3.20 m ve üstüyse rahatız (döşeme 0.90 m kalkacak, ≥ 2.30 m oda kalmalı).
- ☐ **Sahanlık derinliği (kuzey-güney):** ev kapısı ile merdiven başı arası. Planda 1.40 m VARSAYIMDIR — K1 kapısı ve hafif bölme bu ölçüyle kesinleşir.
- ☐ **Kapatılacak boşluklar:** eski doğu (merdiven tarafı) kapı boşluğu + pencere/menfez — yeri, eni, boyu, alt kotu, fotoğraf.
- ☐ **Yağmur suyu:** oluk nereye akıyor? Yeni duvarın dibine akıyorsa not edin (yön değiştirilecek).
- ☐ **Gözdeki tesisat:** kamera, kablo, lamba — hepsinin fotoğrafı (taşınacaklar).

2 Belediyeye tek e-posta — 10 dakika, ücretsiz

Orange Belediyesi İmar Servisi'ne (Service Urbanisme, Mairie d'Orange) aşağıdaki e-postayı gönderin. Cevap, hangi kurallara tabi olduğunuzu kesinleştirir. Cevabı saklayın — dosyanın ilk belgesi budur.

E-POSTA ŞABLONU (FRANSIZCA — KOPYALAYIN)

« Bonjour, je suis propriétaire de la parcelle située [adres]. Je projette de fermer un porche couvert existant ($\approx 8 \text{ m}^2$) pour créer une entrée, avec une nouvelle porte vitrée en haut de l'escalier. Pourriez-vous me confirmer : 1) la zone PLU de la parcelle, 2) si elle se situe dans le périmètre des abords des Monuments Historiques (avis ABF), 3) les règles de teinte d'enduit et de menuiserie applicables ? Merci. »

- ☐ **Gönderildi:** e-posta tarihi:
- ☐ **Cevap geldi:** PLU bölgesi: · ABF çevresi içinde mi? EVET / HAYIR · sıva rengi kuralı:

NEDEN ÖNEMLİ?

Orange, Roma tiyatrosu yüzünden geniş koruma bölgeleri olan bir kent. Parseliniz içindeyse izin süreci 1 ay uzar; sıva rengi ve K1 kapısının görünümü size söylenir — bilmek para değil, sadece sabır ister.

3 İzin → bekleme → inşaat: doğru sıra (tek sayfa)

Altın kural: önce kâğıt, sonra mala. Aşağıdaki sırayı bozmayın; her aşamanın kutusunu bitince işaretleyin.

EYLÜL

Ölçü + dosya

Sayfa 1'deki 6 ölçü + fotoğraflar. İzin dosyası (Déclaration Préalable — ön izin bildirimi, form Cerfa 13703) hazırlanır: konum planı, vaziyet planı, kesit, önce/sonra cephe çizimi, fotomontaj. K1 (merdiven başı yeni camlı dış kapı) cephe görünümünü değiştirir — DP paftalarına MUTLAKA eklenir; dosya daha önce verildiyse değişiklik bildirimi yapılır.

EKİM

Dosyayı ver, panoyu as

Belediyenin internet gişesinden veya elden 2-4 kopya. Aynı gün sarı şantiye panosunu (panneau d'affichage) kapıya asın ve fotoğraflayın — itiraz süresi bu aşamla işler.

EKİM-KASIM

Bekle (inceleme)

Standart 1 ay, koruma bölgesinde 2 ay. Ses çıkmazsa onay demektir (sessizlik = kabul). Bu sürede malzeme fiyatı toplayın, mobilya teklifi isteyin — ama sipariş VERMEYİN.

KASIM-ARALIK

Bekle (itiraz süresi)

Onaydan sonra komşuların 2 ay itiraz hakkı var. En güvenlisi bu süreyi de beklemek. Bu arada: iki usta teklifi alın; K1 (alüminyum camlı dış kapı), V (ahşap iç kapı) ve karoyu seçin.

ARALIK-OCAK

Kaba inşaat (3-4 hafta)

Temel → duvarlar + eski doğu kapı boşluğunun örülmesi → döşeme yükseltme → çatı birleşimi → pencere kapatma + cam bant → K1 dış kapısının takılması → elektrik boruları. Sıra ana dosyada 14 adım hâlinde (s.08).

OCAK

ÖLÇÜ GÜNÜ

Oda bitti: lazer metre ile son ölçü. Mobilya kesim listesi bu ölçüyle kesinleşir ve sipariş ANCAK ŞİMDİ verilir.

ŞUBAT

İç bitirme + mobilya

Yalıtım, alçıpan, sahanlık-vestiyer hafif bölmesi (metal karkas + çift kat alçıpan) + V kapısı, sıva, karo, boya; mobilya üretimi paralel yürür. Mobilya gelince montaj + LED bağlantısı.

MART

Kapanış

Belediyeye iş bitti beyanı (DAACT). Sigortacıya “8 m² eklendi” bildirimi. İmar vergisi (taxe d'aménagement, ≈ €360-540) ertesi yıl gelir — sürpriz değil.

EN PAHALI HATA

Mobilyayı plan ölçüsüyle erken sipariş etmek. Duvar 2 cm şaşar, dolap girmez. Sipariş günü = ÖLÇÜ GÜNÜ'nden sonraki gün.

4 Malzeme alışveriş listesi — Fransız yapı marketi adlarıyla

Kasadaki kelimeyi parantez içinde verdik — listeyi gösterin, yeter. Miktarlar Rev B hesabıdır (tools/quantities.py; blok ve harçta %10 fire dahil). ÖLÇÜ GÜNÜ sonrası hesabı yeniden çalıştırın.

TEMEL VE DUVAR

- ☐ Beton bloğu 20 cm (parpaing de 20) — ≈ 325 adet (≈ 29.2 m² duvar; eski doğu kapı dolgusu dahil)
- ☐ Harç (mortier bâlard) — ≈ 28 çuval 25 kg
- ☐ Hazır beton veya çimento+kum+çakıl (béton C25/30) — ≈ 1.48 m³ (temel 0.85 + hatıl 0.27 + tesviye 0.36)
- ☐ Demir donatı 10 mm (fer à béton HA10) — ≈ 29 kg; hasır (treillis ST25) ≈ 9.2 m²
- ☐ Su yalıtım bandı rulosu (arase étanche / bande d'arase)
- ☐ Duvar bağlantı ankrajı (équerre de liaison + scellement chimique)

DÖŞEME YÜKSELTME

- ☐ Prefekt kiriş (poutrelle) — ≈ 8 adet, 2.0 m boy, market keser
- ☐ Dolgu blok (hourdis / entrevous) — ≈ 8.0 m², kiriş aralığına göre
- ☐ Tesviye betonu üstteki beton kalemine dahildir
- ☐ Havalandırma menfezi (grille d'aération) — 2 adet

BÖLME VE KAPILAR (REV B)

- ☐ Bölme alçıpanı (plaque de plâtre BA13) — ≈ 12.2 m² (2 yüz $\times$ 2 kat)
- ☐ Bölme profili (rail R48 + montant M48) — ≈ 16.5 m
- ☐ Mineral yün 45 mm, ses için (laine minérale) — ≈ 5.0 m²
- ☐ K1 dış kapısı 900 $\times$ 2100 — camlı, thermal-break alüminyum (porte d'entrée alu vitrée à rupture de pont thermique), Uw ≤ 1.6 , RC2 kilit, kendinden kapanan menteşe — 1 adet
- ☐ V iç kapısı 930 $\times$ 2100 — ahşap kapı bloğu (bloc-porte bois), Ud ≤ 1.4 — 1 adet

YALITIM VE KAPLAMA

- ☐ Duvar yalıtımı 100 mm (isolant R ≥ 3.0 , ör. laine de verre GR32) — ≈ 20.9 m²
- ☐ Döşeme yalıtımı PU 80-100 mm (panneau polyuréthane) — ≈ 8.0 m²
- ☐ Buhar kesici (pare-vapeur) + bant
- ☐ Alçıpan 13 mm duvar kaplaması (BA13) — ≈ 28.9 m² + profiller (rails/montants)
- ☐ Tavan için 60-100 mm yalıtım — ≈ 8.0 m² + alçıpan

BİTİRME

- ☐ Dış sıva (enduit monocouche, ör. Weberpral M) — ≈ 22.2 m² (≈ 23 çuval); renk: cepheyle aynı, numune götürün
- ☐ Sıva başlangıç profili (profilé de départ)
- ☐ Sabit cam bant 1000 $\times$ 450 (châssis fixe alu) — doğu duvar üst şeridi, alt kot +2000 (ölçü VARSAYIM)
- ☐ Karo R10 kaymaz (carrelage R10) — ≈ 8.8 m² + yapıştırıcı + derz
- ☐ Astar + iç boya (sous-couche + peinture mate)


5 Alet listesi — satın alma, kirala

Fransa'da her yapı marketinin günlük kiralama bankosu vardır (location de matériel). Şunları kiralayın:

- ☐ Lazer terazi (niveau laser) — temel, döşeme ve mobilya gününde
- ☐ Plaka kompaktör (plaque vibrante) — yalnız Seçenek B dolgu seçilirse
- ☐ Taş/blok kesme (scie de chantier veya disqueuse Ø230)
- ☐ Karıştırıcı (malaxeur) + beton molası için el arabası
- ☐ Kırıcı-delici (perforateur SDS) — ankraj delikleri
- ☐ Alçıpan vidalama ucu + koli kıskacı — bölme için (satın al, ucuz)

6 Yeni dolaşım — iki kapılı giriş (Rev B)

Merdivenden çıkınca K1 (yeni camlı dış kapı) sahanlığa İÇE açılır; solda ev kapısı (değişmez), sağda V kapısı vestiyere İÇE açılır — giren, aynayı tam karşısında görür. Şema nominal ölçülerle.

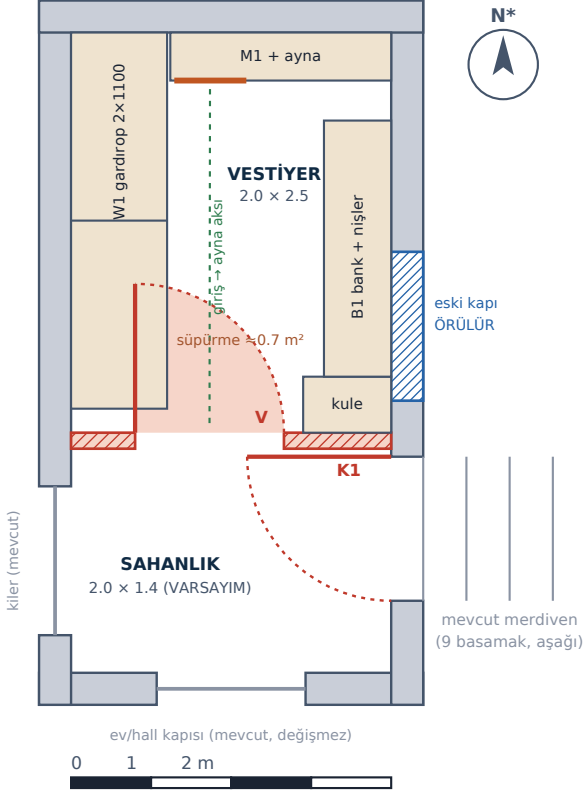

Kapı yönleri neden böyle?

- K1: merdiven üzerine DİŞA açılan kapı, açanı boşluğa iter ve kanat aşağıdan çıkana çarpar — düşme riski. Bu yüzden sahanlığa İÇE açılır; menteşe kuzeyde, açık kanat kuzey duvara yaslanır; kendinden kapanan menteşe rüzgârda çarpmayı keser.
- V: sahanlık dar (1.40 m) olduğu için vestiyere İÇE açılır; menteşe batıda, kanat W1 yan paneline yaslanır ve giriş → ayna aksını boş bırakır.
- İki kapı aynı anda açılsa bile kanatlar farklı hacimlerde kalır — çarpışma senaryosu yok.

ÖLÜ ALAN — BİLİNCİLİ TERCİH

V kanadının süpürme alanı (şemada taralı çeyrek daire, ≈ 0.7 m²) W1'in güney modülünün önündeki kullanım şeridiyle çakışır: V açıkken o modülün kapağı açılmaz ve kanat tam 90°'ye varmadan W1'in güney köşesine yaslanır (şema 90° gösterir). Kanat dar sahanlığa (1.40 m) sığmadığı için bu çakışma bilinçli kabul edildi; günlük kullanımda kapı kapalıyken sorun yoktur. ÖLÇÜ GÜNÜ'nde kapı aksı yerinde doğrulanır.

7 Ne sığar? — kapasite tablosu (WP2)

Ne	Kapasite	Nerede
Uzun palto / manto	8 adet	W1 modül A — boy askı, ray ≈ 1800
Ceket / kısa askı	12 adet	W1 modül B — çift ray ≈ 950 / ≈ 1850
Kanca (çanta, atkı, anahtar)	6 adet	B1 bank sırt paneli, 1700–1750 bandı
Günlük ayakkabı	6 çift	B1 bank çekmeceleri (2 çekmece)
Ayakkabı — kule	10 çift	Kule 550×350×2350 — bölmenin vestiyer yüzü, doğu ucu
Ayakkabı — sezonluk	12 çift	Üst kutular / köprü (+2000 üstü)
Açık raf	3.2 m	M1 köşe rafı 5 sıra × 0.35 m + bank üstü niş 3 × 0.50 m
Kapalı depolama	4.6 m³	W1 + M1 kule/köprü + bank + ayakkabı kulesi toplamı

Kaynak: data/quantities.json → capacity_check (tools/quantities.py Rev B). Kışlık gardirobunuzu sayıp tabloyla karşılaştırın — aşıyorsa sezonluk rotasyon planlayın.

8 10 Altın Kural

- 1 İzin onayı + 2 aylık itiraz süresi dolmadan duvara dokunma.
- 2 K1 asla merdivenin üzerine DIŞA açılmaz — sahanlığa İÇE açılır; kendinden kapanan menteşe şart.
- 3 Kapalı kapının önünde en az 90 cm düz alan bırak.
- 4 Döşemeyi havalandırmalı sistemle yükselt (Seçenek A) ve 2 menfezi unutma.
- 5 Her yeni duvarın altında su yalıtım bandı olsun — küfün ilacı budur.
- 6 Yeni duvarı çatı ahşabına harçla yapıştırma; araya sıkışan yün + mastik.
- 7 Sahanlık ve vestiyer karosu AYNI kotta (+1.25) — V kapısında eşik yok; tek eşik K1’de (maks 20 mm).
- 8 Elektrikli duvar ve bölme kapanmadan çek: 2 priz, sensörlü ışık, mobilya için 24 V hat.
- 9 Mobilyayı oda bitmeden sipariş etme; ölçü günü + 1.
- 10 Her aşamayı fotoğrafla — belediye, sigorta ve mobilyacı için arşivin olur.

9 Kimi ne zaman ara

Kim	Ne zaman	Ne için
Belediye İmar Servisi (Service Urbanisme)	En başta + dosya verirken	PLU bölgesi, ABF durumu, izin dosyası teslimi (K1 dahil)
ABF danışmanlığı (belediye yönlendirir)	Yalnız koruma bölgesindeyseniz	Sıva tonu / K1 kapı görünümü ön görüşü — reddi önler
İki yerel usta (maçon)	İzin beklerken	Karşılaştırmalı teklif — kendin yapsan bile fiyat referansı
Kapı satıcısı (menuiserie alu)	İzin onayından sonra	K1 camlı alüminyum kapı + V iç kapı — teslim 4-6 hafta
Elektrikçi (électricien)	Kaba inşaat 10. adımda	Priz + ışık + 24 V hat; standart (NF C 15-100) uygunluğu
Mobilyacı / marangoz	ÖLÇÜ GÜNÜ’nden sonra	Kesim listesi revizyonu + sipariş
Nakliyecisi / forwarder (TR rotasıysa)	Sipariş ile birlikte	DAP teslim, A.TR belgesi, sigorta; KDV hatırlatması
Sigorta şirketiniz	İş bitince	“8 m² yaşam alanı eklendi” bildirimi

BİTTİĞİNDE

DAACT (iş bitim beyanı) belediyeye + sigortaya haber + faturaları bir dosyada sakla. Sonra paltoyu as, botu çekmeceye at, kapıyı kilitle — proje bu kadar.
