

# Sundurma → Vestiyer Dönüşümü

Gözü kapat · ≈ 0.9 m yükselt · K1 kapılı sahanlık + donatılmış vestiyer (Rev B)

YÖNETİCİ ÖZETİ

Orange (84100) · Vaucluse · Fransa

Temmuz 2026 · Rev B

## NE VE NEDEN

Giriş merdiveninin yanındaki üstü kapalı, yanı açık göz (bugün: çöp konteynerleri, döşeme ≈ +0.30 m) yalıtımlı kâgir duvarla kapatılır, döşemesi ≈ 0.9 m yükseltilir (hedef kot +1.25) ve hafif bir bölmeyle ikiye ayrılır: merdiven başındaki yeni camlı dış kapı K1 önce 2.0 × 1.4 m SAHANLIĞA açılır (solda mevcut ev kapısı), sağdaki V kapısından 2.0 × 2.5 m VESTİYERE girilir — giren, aynayı tam karşısında görür. Donanım: 2 modül gardirop (W1), bank B1 (2 çekmece + 6 kanca + 3 niş), M1 ayna ünitesi ve ayakkabı kulesi. Eski doğu kapı boşluğu örülür. Tek bir Déclaration Préalable (ön izin bildirimi) işlerin tamamını kapsar.

## DÖRT KARAR, CEVAPLARIYLA

### MERDİVEN BAŞINDAKİ KAPI K1 (VE VESTİYER KAPISI V)

Merdiven kalır. K1 SAHANLIĞA İÇE açılır — asla merdiven üzerine dışa değil; menteşe kuzey kasada, kanat bölmeye yaslanır; kendinden kapanan menteşe. V ise dar sahanlığa değil VESTİYERE içe açılır (menteşe batı) — iki kanat farklı hacimlerde, çarpışma yok.

### DÖŞEME NASIL YÜKSELİR

Ara oturtma duvarları + havalandırılmalı boşluklu asmolen döşeme (Seçenek A) — Fransa'nın standart yöntemi: oturma yok, kuru, kendin-yap dostu. Sıkıştırılmış dolgu + plak ancak 20 cm tabakalı disiplinli sıkıştırmayla kabul edilebilir. Sahanlık ve vestiyer AYNI kotta (+1.25) biter — V'de eşik yok.

### İZİNLER

Déclaration Préalable (Cerfa 13703) zorunlu (yeni alan + cephe değişikliği + muhtemel koruma çevresi). 1-2 ay inceleme; 2 aylık itiraz süresini bekleyin. Orange büyük bir miras kenti — ABF (Fransa Anıtlar Mimarı) ilgisi bekleyin; tasarım (uyumlu sıva, sade K1) geçecek şekilde yapıldı.

### MOBİLYA — FRANSA MI TÜRKİYE Mİ

Türkiye'den özel demonte üretim ≈ €5.0-7.5k teslim; Fransız butik €9-14k (≈ %40-45 ucuz). AB-TR gümrük birliği (A.TR = %0 gümrük; %20 ithalat KDV). Yalnız güvenilir atölyeyle, ölçü kaba inşaattan SONRA. Yedek plan: FR yarı-özel ≈ €3.5-6k.

## ANA RAKAMLAR (MERTEBE)

≈ 8 m<sup>2</sup>

yeni alan: sahanlık ≈ 2.8 + vestiyer ≈ 5.0 m<sup>2</sup>

≈ +0.9 m

döşeme +0.30 → +1.25 hedef (sahanlık = vestiyer)

€8.4-13.7k

kaba inşaat ustayla (kendin-yap malzeme €4.2-6.5k kapılar dahil)

€5.0-7.5k

TR mobilya teslim (FR butik €9-14k)


1-2 ay

DP incelemesi (ABF ise 2 ay)


€360-540

taxe d'aménagement (imar vergisi), tek sefer

## DIŞARIDAN GÖRÜNEN TEK DEĞİŞİKLİK

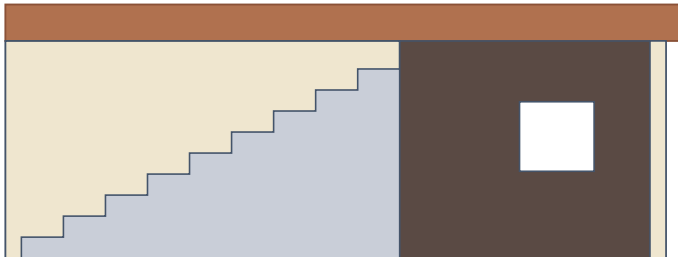

ÖNCE — açık göz (çöp konteynerleri)

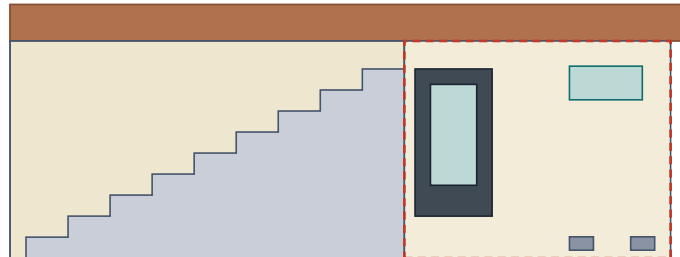

SONRA — sıvalı duvar + camlı K1 kapısı (cam bant iptal)

# Sundurma → Vestiyer Dönüşümü

Para, izinler ve kendin-yapı deritten uzak tutan beş kural

YÖNETİCİ ÖZETİ

Orange (84100) · Vaucluse · Fransa

Temmuz 2026 · Rev B

## MALİYET TABLOSU (REV B — TEKLİFLERLE NETLEŞİR)

| Kaba İnşaat (≈ 8 m²)                                | Usta         | Kendin-yap malz.          |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Temeller · duvarlar · sıva · pencere dolgusu        | €3,500-5,500 | €1,650-2,300              |
| Döşeme (Seçenek A) · bölme · çatı birleşimi · tavan | €2,100-3,400 | €900-1,400                |
| Elektrik · kapılar K1 + V · karo                    | €2,800-4,800 | €1,650-2,800              |
| KABA İNŞAAT TOPLAMI                                 | ≈ €8.4-13.7k | ≈ €4.2-6.5k kapılar dahil |

| Mobilya rotası (W1 + B1 + M1 + kule) | Teslim    | Not                                           |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| FR butik marangoz, montajlı          | €9-14k    | tam garanti, sıfır lojistik                   |
| FR yarı-özel (PAX + kapak)           | €3.5-6k   | pragmatik orta yol, referansa yakın görünüm   |
| TR özel demonte, sevkiyatlı          | €5.0-7.5k | %0 gümrük (A.TR) + %20 KDV; ölçü kaba sonrası |

Toplu: kendin-yap + TR mobilya ≈ €9.2-14k · usta + FR butik ≈ €17.4-27.7k. %10-15 beklenmedik payı ekleyin.

## İZİN YOLU — DÉCLARATION PRÉALABLE

- Orange Belediyesi İmar Servisi'ne sorun: PLU bölgesi + ABF çevresi durumu.
- DP dosyasını verin (Cerfa 13703): planlar + kesit + önce/sonra cepheler + fotomontaj.
- İnceleme 1 ay (ABF bölgesinde 2; sessizlik = onay). Panoyu asın; 2 aylık itiraz süresini bekleyin.
- Onaylı dosyaya göre inşa edin; bitince DAACT (iş bitim beyanı). Taxe d'aménagement ≈ €360-540 sonra gelir.

|                  |                    |               |             |                  |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|
| Eyl · DP dosyası | Eki-Kas · inceleme | İtiraz süresi | kaba 3-4 hf | iç imalat 2-3 hf |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|

≈ 5-6 ay uçtan uca — yarısı evrak bekleme. Mobilya paralel üretilir, en son kurulur.

## KENDİN-YAPAN İÇİN EN ÖNEMLİ 5 YAP / YAPMA

- YAP**
  - YAPIN: PLU/ABF cevabını DP dosyasından önce yazılı alın.
  - YAPIN: Seçenek A (havalandırmalı asmolen) + su yalıtım bandı — hep kuru döşeme.
  - YAPIN: sahanlık ve vestiyer karosunu AYNI kota (+1.25) getirin — V'de sıfır eşik.
  - YAPIN: elektriği (priz, sensörlü ışık, 24 V LED) kaplamadan önce çekin.
  - YAPIN: kaba bitince her şeyi yeniden ölçün, mobilyayı ancak o zaman sipariş edin.
- YAPMA**
  - YAPMAYIN: DP onayı + itiraz süresi dolmadan taşıyıcı işe başlamak.
  - YAPMAYIN: K1'i merdiven üzerine dışa açmak — asla; V'yi de dar sahanlığa açmayın.
  - YAPMAYIN: yeni duvarı çatı ahşabına rijit harçlamak (sıkışabilir derz).
  - YAPMAYIN: Türk mobilyasını plan ölçüsünden sipariş etmek — yalnız saha ölçüsü.
  - YAPMAYIN: menfezleri atlamak: havalandırmaz boşluk = nemli döşeme.

### TERS GİDERSE — ÜÇ GERÇEK RİSK

- Ölçü hatası TR mobilya rotasını bitirir — demir kural: kaba inşaat sonrası lazerle ölçün, sonra kesim listesi ve sipariş.
- ABF sıva tonu veya kapı rengi dayatabilir — Orange'da rutindir; direnmek yerine ayarlayıp yeniden sunun.
- TR rotasında taşıma hasarı — ambalaj şartnamesi sözleşmede, sarım öncesi fotoğraflar, teslim değerine sigorta, hasar teslimde CMR'ye yazılır.

**SIRADA:** ① gözü ve çatı altını ölçün ② belediyeye tek e-posta (bölge + ABF) ③ DP dosyasını verin.

Tüm ayrıntı, çizim ve adım adım yöntem: A3 Tasarım ve Uygulama Dosyası (14 sayfa).
